Contratto istituzionale di sviluppo
per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia
realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)

TRA

Ministero della Salute

E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO AD ACTA PER IL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI

DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA

-

REGIONE CALABRIA

Sommario

ART. 1 (Definizioni. Premesse e allegati) 9
ART. 2 (Oggetto) 11
ART. 3 (Impegni delle Parti) 11
ART. 4 (Amministrazione titolare) 12
ART. 5 (Soggetto Attuatore) 14
ART. 6 (Tavolo Istituzionale) 18
ART. 7 (Responsabile Unico del Contratto) 19
ART. 8 (Nucleo Tecnico) 19
ART. 9 (Supporto tecnico operativo) 20
ART. 10 (Erogazione delle risorse e certificazione delle spese) 21
ART. 11 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS) 21
ART. 12 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa) 21
ART. 13 (Durata e modifica del CIS) 21
ART. 14 (Comunicazioni e Notifiche) 22
ART. 15 (Controversie) 22

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTA la decisione ECOFIN del 13 luglio 2021, con cui il Consiglio ha valutato positivamente il Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA, in particolare, la Missione 6, Componente 1 – Investimento 1.1: "Case della Comunità e presa in carico della persona"; Investimento 1.2: "Casa come primo luogo di cura e Telemedicina"; Investimento 1.3: "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità"; e Componente 2 - Investimento 1.1: "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"; Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"; Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione"; Investimento 2.2 "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario";

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*", e, in particolare l'articolo 10, comma 3, che prevede che "*La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.*";

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 "*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" che definisce e disciplina il Contratto Istituzionale di Sviluppo;

VISTO l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il quale prevede che per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge. 3 agosto 2017, n. 123, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*", , contenente disposizioni in materia di valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo – CIS;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*" (PNC) e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento "*Verso un ospedale sicuro e sostenibile*" per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ed in particolare:

- l'articolo 6 che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l'articolo 7, comma 8, ai sensi del quale "*ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";
- l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale, titolare di interventi del PNRR, provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- gli articoli 9 e il 10 che disciplinano il supporto tecnico operativo di cui le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono avvalersi al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi;
- l'articolo 12 che disciplina l'istituto e l'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi;
- l'articolo 56, comma 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della salute e comma 2 bis , che dispone che *"Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione"*.

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui sono stati individuati per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio con particolare riferimento al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*";

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della medesima legge, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021 che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 con la quale il Presidente della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, secondo i programmi operativi di cui

all'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, ivi ricomprendendo la gestione dell'emergenza pandemica; ai sensi della suddetta Deliberazione "*i contenuti del mandato commissariale ad acta - di cui, originariamente, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010, per come successivamente implementato - sono tali da affidare al nominato Commissario ad acta, ex art. 120, comma 2, della Costituzione, l'incarico prioritario di attuare i programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro nonché di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'attuazione del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150. In particolare, nel detto ambito provvedimentale e nel rispetto della cornice normativa vigente, sono stati affidati al Commissario ad acta le seguenti azioni e interventi prioritari: 1) adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento, in particolare con riguardo all'adesione agli screening oncologici, all'assistenza territoriale ed alla qualità e sicurezza dell'assistenza ospedaliera;* (…) 25) programmazione degli investimenti per interventi edilizi e/o tecnologici in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e secondo gli indirizzi di programmazione coerenti con il decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70 e con le misure di razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare strumentale e non strumentale, fermo restando quanto disposto dal decreto legge 10 novembre 2020, n. 150; (…) 26) attuazione dei nuovi compiti assegnati al Commissario ad acta dal decreto legge 10 novembre 2020, n. 150.

VISTO il Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, che ha disposto "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare, l'art. 3, che, al comma 3 e seguenti, recita: *"3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario ad acta può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi. 3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o degli enti di appartenenza. 3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano.*

VISTO l'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante il "*Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19*";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 in materia di procedure amministrativo contabili concernenti la gestione delle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla legge 23 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 1037 a 1050;

VISTE le Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR dell'11 ottobre 2021 trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali titolari di intervento con Circolare n. 21 prot. 266985 del 14 ottobre 2021;

VISTA la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali titolari di intervento con Circolare n. 32 prot. 309464 del 30 dicembre 2021;

VISTE le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021;

VISTE le convenzioni sottoscritte tra il Ministero dell'economia e delle finanze con Cassa Depositi Prestiti e con Invitalia S.p.A. con le quali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, lo stesso Ministero definisce e rende disponibili le modalità di attivazione del supporto tecnico-operativo a favore delle Amministrazioni centrali e, eventualmente, dei soggetti attuatori degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC;

CONSIDERATO che il PNRR è un programma "performance-based" e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di milestones e targets (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che, pertanto, il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 - ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti Attuatori - da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l'interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE);

CONSIDERATO che il PNC estende al bilancio nazionale la metodologia utilizzata per il PNRR mediante l'istituzione di un sistema semplificato di traguardi e obiettivi;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

CONSIDERATO che è opportuno definire i contenuti di un'azione comune e condivisa per portare a compimento un programma di interventi innovativo, complesso e di notevole rilevanza strategica nel rispetto di modalità, termini e condizioni convenuti con la Commissione Europea;

CONSIDERATO che occorre individuare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché esplicitare, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definire il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà

ovvero l'attivazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare uno strumento che consenta alle Regioni e Province Autonome l'esercizio delle prerogative proprie quali Soggetti Attuatori a condizione, tuttavia, che l'attuazione avvenga entro termini, modalità e condizioni coerenti con il Piano presentato e autorizzato dalla UE nonché nel rispetto degli obiettivi stabiliti nella citata scheda del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" di cui all'Allegato 1 del D.M. MEF 15 luglio 2021 e per i quali il Ministero della salute, quale responsabile, deve esercitare azione di coordinamento, monitoraggio, vigilanza e controllo ed intervento sostitutivo in caso di inadempienza;

RITENUTO di individuare nel CIS, quale strumento per l'attuazione rafforzata degli interventi speciali e di quelli finanziati con risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo economico e la coesione territoriale, la soluzione condivisa più idonea per soddisfare le esigenze innanzi considerate, in ragione della dimensione e complessità degli interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli interventi stessi ed assicurare il migliore raccordo tra tutti i soggetti coinvolti;

ACQUISITA la presa d'atto sullo schema di CIS e di Piano operativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - in data 7 marzo 2022;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 marzo 2022.

TUTTO QUANTO INNANZI, SI CONVIENE E
SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Definizioni. Premesse e allegati)

1. Ai fini del presente Contratto Istituzionale di Sviluppo, di seguito anche "CIS", si intende per:

   a) *Amministrazione centrale titolare di intervento:* il Ministero della salute quale amministrazione responsabile dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR (articolo 1, lettera l, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) i cui obblighi sono individuati dall'articolo 4 nonché del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

   b) *Soggetto attuatore*: il Commissario ad Acta della Regione Calabria che provvede alla realizzazione degli interventi di cui alle Schede Intervento riconducibili al Piano operativo allegato al CIS (articolo 1, comma 4, lettera o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), che può esercitare il suo ruolo direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio

sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati. Gli obblighi del soggetto attuatore sono individuati dall'articolo 5;

c) *Soggetto attuatore esterno:* Ente del Servizio sanitario regionale al quale viene affidata parte dell'attuazione del progetto finanziato dal PNRR come previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

d) *Tavolo Istituzionale (TI)*: l'organismo di concertazione istituzionale tra le Amministrazioni sottoscrittrici del CIS e il Ministero dell'economia e delle finanze che svolge le funzioni individuate dall'articolo 6;

e) *Responsabile Unico del Contratto (RUC)*: il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del CIS i cui compiti sono individuati dall'articolo 7;

f) *Nucleo Tecnico (NT):* l'organo tecnico istituito dal Ministero della salute al fine di supportare il RUC nella realizzazione delle attività di sua competenza;

g) *PNRR (o Piano)*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;

h) *PNC*: Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

i) *Referente unico della Parte*: il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nel CIS;

j) *Sistema unitario "ReGiS":*il sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178 , finalizzato a rispondere a quanto stabilito dall'articolo 29 del Regolamento (UE) 2021/241 con riferimento alla "raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati"; tale strumento si configura come applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR;

k) *MOP*: il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

l) *Milestone:* Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

m) *Target*: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

n) *Piano Operativo*: il documento tecnico, redatto e approvato dal Commissario ad Acta della Regione Calabria, su indicazione e con il supporto tecnico del Ministero della salute, tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)limitatamente agli investimenti della Missione 6 - Componente 1, che elenca gli interventi inseriti nel CIS organizzandoli secondo le rispettive Componenti/Linee di investimento. Il Piano Operativo è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante (Allegato 1);

o) *Rendicontazione delle spese*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

p) *Rendicontazione di milestone e target*: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;

q) *Scheda Intervento*: la scheda redatta per ciascun intervento oggetto del contratto. Nella scheda sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le milestone e i target stabiliti. Le Schede Intervento sono riconducibili al Piano operativo allegato al CIS che ne costituiscono parte integrante.

r) *Servizio centrale per il PNRR*: Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

s) *Unità di Missione RGS*: Struttura di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR.

t) *Unità di Audit:* Struttura che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera q), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

2. Le premesse, gli atti ivi richiamati e gli allegati, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed approvare integralmente ed incondizionatamente, formano parte integrante e sostanziale del presente CIS.

ART. 2
(Oggetto)

1. Il presente CIS ha ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 per le Linee di investimento richiamate in premessa e dal PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 di competenza del Commissario ad Acta della Regione Calabria, come da Piano Operativo, allegato al presente contratto e Schede Intervento.

ART. 3
(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente CIS. A tal fine, esse si danno reciprocamente atto che le *milestone*, i *target* e le ulteriori condizionalità stabiliti nell'ambito del PNRR e del PNC, inseriti nel Piano Operativo e nelle Schede Intervento, con i relativi cronoprogrammi, costituiscono elementi prioritari ed essenziali per l'attuazione dei singoli interventi e per la verifica del relativo stato di avanzamento.

2. Ciascuna delle Parti nomina un proprio referente, denominato Referente unico della parte, cui

è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti nel contratto e di relazionarsi con il RUC. La nomina del referente unico della parte viene comunicata dalla singola Parte al RUC entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente CIS. Il referente unico della Regione si relaziona con i responsabili di procedimento della propria Amministrazione ovvero degli Enti del Servizio sanitario regionale delegati all'attuazione e ne riceve ogni informazione utile, al fine di riferire al RUC sullo stato degli impegni contrattuali. Ogni referente unico della parte è destinatario di tutte le comunicazioni relative al presente CIS, indirizzate alla parte di riferimento, ed è componente del Tavolo Istituzionale. Le funzioni del referente unico del Ministero della salute sono assunte dal RUC di cui all'articolo 7.

3. Ciascuna Parte garantisce l'esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel cronoprogramma delle schede intervento.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

   a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, garantendo altresì, per quanto di competenza, il rilascio dei pareri, nulla osta, anche di carattere ambientale, necessari per la realizzazione di tutte le opere richiamate nel Piano Operativo, anche nel rispetto di quanto stabilito dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

   b) rimuovere tutti gli ostacoli che possono sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dal presente CIS;

   c) eseguire, con cadenza periodica, da determinarsi a cura del RUC e secondo le modalità da questi indicate, tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica del presente CIS, anche al fine di attivare prontamente tutte le azioni funzionali alla realizzazione degli interventi.

5. Le Parti si impegnano, altresì, a svolgere le specifiche attività di competenza descritte negli articoli che seguono.

ART. 4
(Amministrazione titolare)

1. Il Ministero della salute, nella qualità di Amministrazione centrale titolare della Missione 6 del PNRR, ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) ivi previsti. Esso provvede al coordinamento delle attività di gestione, di monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi di cui al presente Contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. A tali fini, il Ministero si avvale della Unità di Missione appositamente istituita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021.
2. Al Ministero della salute spetta il compito primario di presidiare e vigilare sull'esecuzione, in modo costante, tempestivo ed efficace, degli interventi che compongono le misure del PNRR di competenza e di garantire il raggiungimento dei relativi risultati (target e milestone), il cui conseguimento, secondo le tempistiche stabilite, rappresenta la condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione Europea. Al medesimo Ministero, spettano pari compiti e

funzioni in ordine al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del PNC nei termini e secondo le modalità previste dal decreto legge decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101e dal DM MEF 15 luglio 2021. A tal fine, il Ministero della salute, tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) limitatamente agli interventi della Componente 1, si impegna a:

a) svolgere il ruolo di coordinamento, vigilanza e monitoraggio previsto dalla normativa di attuazione e governance del PNRR e PNC;

b) assicurare, attraverso il RUC, il presidio continuo sull'attuazione degli interventi, verificando, da un lato, l'avanzamento degli interventi e i loro progressi in termini di procedure, di flussi finanziari e di realizzazioni fisiche e, dall'altro, il livello di conseguimento di targets e milestones;

c) porre in essere tutte le attività di coordinamento anche attraverso le strutture dal medesimo Ministero all'uopo incaricate e rende disponibile il supporto tecnico operativo di cui al successivo articolo 9;

d) garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;

e) assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, nonché del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, verificandone la corretta implementazione;

f) informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;

g) svolgere, anche attraverso il RUC, attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e degli eventuali progetti cofinanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del Piano Operativo;

h) rendere disponibili i fondi stanziati secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti necessari per l'attuazione degli interventi;

i) garantire la raccolta e messa a disposizione della documentazione amministrativa necessaria ai fini dei controlli di competenza del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, degli organismi comunitari, nonché eventualmente dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia nazionali;

j) comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato le informazioni sullo stato di attuazione del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma ai sensi dell'articolo 8 del citato DM MEF del 15 luglio 2021;

k) promuovere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti attraverso la società Consip S.p.A. e la società Sogei S.p.A.;

l) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Amministrazione centrale titolare di interventi dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Contratto.

ART. 5
(Soggetto Attuatore)

1. Il Commissario ad Acta della Regione Calabria, quale Soggetto attuatore degli interventi previsti nel presente Contratto, si obbliga ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Essa, inoltre, direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati all'attuazione di specifici interventi, svolge le seguenti attività:

   a) assicura l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

   b) adotta proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero della salute;

   c) garantisce il rispetto dell'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili;

   d) assicura il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241;

   e) garantisce la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

   f) garantisce l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e sottopone al Ministero della salute le eventuali modifiche al progetto;

   g) garantisce, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

   h) presenta, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dei costi indiretti, nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto ed atti conseguenti, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

   i) fornisce all'Amministrazione titolare le informazioni sullo stato di attuazione del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma ai fini della predisposizione della

comunicazione trimestrale di cui all'articolo 8 del citato DM MEF del 15 luglio 2021;

j) coordina le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi e la predisposizione degli elaborati tecnici necessari ai sensi di legge per renderli appaltabili;

k) individua eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma relazionando al Ministero della salute titolare dell'intervento;

l) mitiga e gestisce i rischi connessi al progetto nonché a porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;

m) partecipa alle conferenze di servizi, convocate dalla stessa Regione o dalle stazioni appaltanti eventualmente delegate, finalizzate ad ottenere le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari alla realizzazione dei singoli interventi;

n) svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto ai propri Enti eventualmente delegati alla attuazione degli interventi per lo svolgimento delle attività di competenza, di verifica tecnica e validazione dei progetti relativi ai singoli interventi;

o) adotta il sistema informatico utilizzato dal Ministero della salute, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della salute;

p) carica sul sistema informativo di cui al precedente punto i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli di competenza del Ministero della salute in qualità di Amministrazione centrale titolare della Missione 6 del PNRR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;

q) garantisce la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e ne assicura l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dal Ministero della salute nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute stesso;

r) fornisce tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero della salute;

s) garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108, nonché la messa a disposizione di detta documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, del Ministero della Salute, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

t) facilita le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero della salute, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori/Soggetti attuatori esterni;

u) garantisce la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati come previsto dall'articolo 9, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

v) predispone i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Ministero della salute, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

w) effettua i controlli di gestione, i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero della salute, nonché garantisce la riferibilità delle spese al progetto finanziato;

x) inoltra le richieste di pagamento al Ministero della salute con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento, e i pertinenti documenti giustificativi secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

y) garantisce l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021;

z) garantisce, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero della salute riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

aa) si impegna, per i progetti del PNRR, a conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e a fornire, su richiesta del Ministero della salute, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

bb) si impegna, altresì, al rispetto del cronoprogramma procedurale di cui alla citata scheda "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del PNC;

cc) individua inoltre e comunica al Ministero della salute i ritardi attuativi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica definita nel cronoprogramma concordato nella scheda intervento

dd) garantisce il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento

al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornisce un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornisce i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero della salute e per tutta la durata del progetto;

ee) garantisce una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero della salute sull'avvio e andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunica le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adotta le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero della salute stesso, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

2. Il Commissario ad Acta della Regione Calabria, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di cui al comma 1 attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei *target* e *milestone*, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto ferma rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato.

3. Il Commissario ad Acta della Regione Calabria e gli Enti del Servizio sanitario regionale, delegati ai sensi del comma 2, si impegnano ad individuare le soluzioni tecnico operative procedurali più efficaci a garantire la puntuale esecuzione degli interventi nei tempi previsti, assicurando presidi di trasparenza e legalità attraverso, ove possibile, il ricorso a procedure di affidamento aggregate, anche avvalendosi di Centrali di Committenza individuate dall'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

4. Il Commissario ad Acta della Regione Calabria si impegna a trasmettere al RUC il quadro economico di ciascun intervento rideterminato dopo l'affidamento dei lavori, nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, ivi ricomprendendo anche le eventuali economie da ribasso d'asta.

5. Il Commissario ad Acta della Regione Calabria informa il RUC in ordine a ogni avanzamento delle procedure amministrative relative all'attuazione degli interventi, ivi inclusi l'avvio e la conclusione della progettazione degli stessi.

6. Il Commissario ad Acta della Regione Calabria si obbliga a indicare nella scheda intervento l'eventuale delega del ruolo di soggetto attuatore a un Ente del Servizio sanitario regionale che, attraverso la sottoscrizione della medesima scheda da parte del suo legale rappresentante, accetta le clausole del presente contratto, assumendo congiuntamente e solidalmente con la Regione tutte le obbligazioni ivi contenute per la parte relativa all'intervento delegato.

ART. 6
(Tavolo Istituzionale)

1. Per assicurare la governance e il controllo dell'attuazione del presente Contratto è istituito un Tavolo Istituzionale presieduto dal Ministro della salute, o da suo delegato, e composto dal Commissario ad Acta della Regione Calabria, o da suo delegato, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da suo delegato.

2. Al Tavolo Istituzionale partecipano, senza diritto di voto, il RUC, un rappresentante della Unità di Missione costituita presso il Ministero della salute, il Direttore dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nonché il Referente unico della Regione. Su invito del Presidente del Tavolo possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Tavolo, ove necessario, anche rappresentanti di altri enti o amministrazioni eventualmente interessate o delegate all'attuazione di interventi.

3. Il Tavolo, convocato dal Presidente, si riunisce almeno ogni sei mesi, e ogniqualvolta ritenuto necessario da parte di uno dei componenti o anche su segnalazione del RUC, per aggiornamenti riguardanti l'andamento e la prosecuzione delle attività, nonché il rispetto degli impegni previsti dal Contratto. Esso può operare anche in modalità videoconferenza. Le decisioni del Tavolo sono adottate collegialmente e, se necessario, a maggioranza dei componenti. Le decisioni del Tavolo possono essere assunte anche mediante apposita procedura scritta da attivare da parte del Presidente del Tavolo o del RUC su delega del Presidente del Tavolo.

4. Il Tavolo ha il compito di:

   a) valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal presente Contratto;

   b) verificare, con periodicità almeno semestrale, lo stato di attuazione del Piano Operativo.

   c) approvare eventuali successive rimodulazioni delle schede intervento e dei finanziamenti, proposte dal RUC, ed eventualmente modificare il Piano Operativo, alla luce degli esiti conseguenti all'attuazione dei singoli interventi che lo compongono;

   d) approvare le proposte di definanziamento, eventualmente necessarie.

5. Il Tavolo Istituzionale esamina, inoltre, gli eventuali ritardi e inadempienze rispetto alle tempistiche indicate nelle schede intervento e segnalati dal RUC e fornisce idonea informativa, con propria delibera. Il Ministro della salute, sulla base di tale informativa, fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, per il PNC, dall'articolo 1, comma 7-bis del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:

   a) valuta la sussistenza dei presupposti di legge nei confronti del Commissario ad Acta della Regione Calabria per proporre l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

   b) valuta la sussistenza dei presupposti di legge nei confronti dei soggetti attuatori diversi dal Commissario ad Acta della Regione Calabria per procedere con l'attivazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 7
(Responsabile Unico del Contratto)

1. Il RUC è il responsabile dell'Unità di Missione del Ministero della salute.

2. Al RUC sono affidati i seguenti compiti:

   a) coordina il processo complessivo di esecuzione del CIS;

   b) acquisisce dai referenti unici delle Parti le informazioni relative allo stato di esecuzione degli impegni assunti e pone in essere tutte le azioni necessarie per accelerare il processo di esecuzione e prevenire ritardi insanabili che possano comportare il ricorso alla procedura prevista ai sensi dell'articolo12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

   c) acquisisce dal Soggetto attuatore, per il tramite del referente unico, le informazioni relative allo stato di esecuzione dei suddetti interventi;

   d) sottopone, su proposta del soggetto attuatore, al Tavolo Istituzionale eventuali rimodulazioni delle schede intervento, ivi compresa la proposta di rimodulazione dei finanziamenti afferenti ai singoli interventi;

   e) rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un'azione diretta di coordinamento e di supporto al Soggetto Attuatore degli interventi di cui alle Schede intervento;

   f) riscontra lo stato di avanzamento degli interventi ed il rispetto del cronoprogramma previsto nelle singole schede intervento, al fine di riferire al Tavolo Istituzionale;

   g) comunica al Tavolo Istituzionale gli esiti delle attività di controllo e valutazione e segnala eventuali ritardi e inadempienze ai sensi dell'articolo 12 del sopracitato decreto legge, per le conseguenti iniziative, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi da parte del Ministro della salute;

   h) attiva strumenti ed iniziative utili a garantire la trasparenza e l'accesso alle informazioni connesse agli interventi;

   i) valida i dati di monitoraggio sull'avanzamento fisico e finanziario degli interventi del PNRR inseriti dal/dai Soggetti Attuatori, nel sistema Unitario "ReGiS".

3. Per le attività di cui al comma 2, il RUC si avvale del supporto del Nucleo Tecnico di cui all'articolo 8 nonché del supporto tecnico operativo previsto all'articolo 9.

ART. 8
(Nucleo Tecnico)

1. Il Nucleo tecnico è l'organo che fornisce supporto tecnico al RUC per le seguenti attività:

   a) coordinare e dare impulso all'attuazione degli interventi;

   b) monitorare, valutare e verificare gli interventi di cui al Piano Operativo e alle relative schede intervento;

c) valutare le eventuali proposte di rimodulazione degli interventi presentate dal Commissario ad Acta della Regione Calabria al RUC;

d) rendere operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un'azione diretta di coordinamento e di supporto al Soggetto Attuatore per l'attuazione degli interventi di cui alle Schede intervento.

2. Il Nucleo è costituito dal Dirigente dell'Ufficio 1 dell'Unità di Missione del Ministero della salute o suo delegato, dalle figure dirigenziali delle competenti direzioni del Ministero della Salute in ragione della specifica competenza delle medesime con riferimento agli specifici interventi e dal Direttore dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

3. Il Nucleo si articola in due sezioni:
   - la Sezione Componente 1 a cui partecipa il Direttore dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che ne coordina le attività unitamente al Dirigente dell'Ufficio 1 dell'Unità di Missione del Ministero della salute o suo delegato, ai rappresentati delle Direzioni del Ministero della salute in ragione della specifica competenza delle medesime con riferimento agli specifici interventi;
   - la Sezione Componente 2, a cui partecipano il Dirigente dell'Ufficio 1 dell'Unità di Missione del Ministero della salute o suo delegato ed i rappresentanti delle Direzioni del Ministero della salute in ragione della specifica competenza delle medesime con riferimento agli specifici interventi.

ART. 9
(Supporto tecnico operativo)

1. Il Ministero della salute, per attuare gli interventi previsti nei tempi e nei modi contenuti nel presente Contratto, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ovvero di Cassa Depositi e Prestiti e di Invitalia S.p.A., secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Il supporto tecnico-operativo di cui al comma 1 può essere diretto anche ai soggetti attuatori dei singoli interventi, per il tramite del Ministero della salute.

3. Il Commissario ad Acta della Regione Calabria quale Soggetto Attuatore potrà avvalersi direttamente del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) da disciplinarsi con specifica convenzione che il Commissario ad Acta della Regione Calabria ed Agenas andranno a sottoscrivere nel rispetto del quadro normativo e regolamentare di riferimento.

4. Il Commissario ad Acta della Regione Calabria quale Soggetto Attuatore, per realizzare gli interventi previsti nei tempi e nei modi contenuti nel presente Contratto può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente regionale e locale e da enti vigilati secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 9, dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché nel rispetto dei limiti di ammissibilità al PNRR di cui alla Circolare RGS del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti

attuatori del PNRR.

ART. 10
(Erogazione delle risorse e certificazione delle spese)

1. Il trasferimento delle risorse è assicurato nel rispetto delle vigenti norme in materia e, con riferimento agli interventi del PNRR, in particolare secondo le previsioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 in materia di procedure amministrativo-contabili concernenti la gestione delle risorse del Fondo di Rotazione Next Generation UE-Italia di cui alla legge 23 dicembre 2020 n. 178, articolo 1, commi da 1037 a 1050.

ART. 11
(Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS)

1. L'attuazione del CIS è costantemente monitorata per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva relativa al raggiungimento delle *milestone*s e dei *target* stabiliti nonché degli avanzamenti procedurali, fisici, finanziari e di risultato. A tal fine si provvede attraverso il sistema di monitoraggio Unitario "ReGiS". I dati relativi al programma del PNC "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" confluiscono nel sistema MOP tramite funzioni che garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi.

2. Il referente unico della Regione assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle attività di controllo e di valutazione che saranno attuate secondo quanto previsto dalle Linee Guida, che saranno emanate dal Ministero della salute, in quanto Amministrazione centrale titolare di intervento e attraverso gli appositi strumenti forniti nell'ambito della manualistica di gestione e controllo.

3. Il Ministero della salute, attraverso i competenti uffici, effettua i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa (etc. citare obblighi PNRR e PNC).

ART. 12
(Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentatividi infiltrazione mafiosa)

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari dedicati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

ART. 13
(Durata e modifica del CIS)

1. Il presente CIS impegna le Parti fino alla completa realizzazione del programma degli interventi

previsti, nel rispetto delle tempistiche previste per il conseguimento dei connessi milestone e target, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2026 per gli interventi del PNRR, e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, previa approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS.

2. Ferme restando le tempistiche previste per il conseguimento di milestone e target associati agli interventi oggetto del presente CIS, il termine di durata può essere prorogato per sopravvenute modifiche, proroghe o necessità del PNRR e PNC ed in ragione dello stato di avanzamento degli interventi previsti, previa comunicazione scritta tra le Parti, con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

ART. 14
(Comunicazioni e Notifiche)

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente CIS dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente agli indirizzi per come appresso specificati:

(a) se al Ministero della Salute:

- pnrr@postacert.sanita.it

(b) se ai Referenti Unici delle Parti:

ediliziasanitaria.salute@pec.regione.calabria.it

c.a. del Dirigente dell'Unità Organizzativa Autonoma "Investimenti Sanitari"

(c) se alla Regione Calabria:

presidente@pec.regione.calabria.it

commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

c.a. del Presidente della Giunta Regionale – Commissario ad Acta

ovvero presso il diverso indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione odierna, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

ART. 15
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del presente contratto, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.

3. Salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ogni controversia scaturente dal presente contratto il foro competente sarà quello di Roma.

Il presente CIS è formato in unico originale e sottoscritto da ciascuna delle Parti.

IL MINISTRO

On. Roberto Speranza

Firma digitale

SPERANZA ROBERTO 30.05.2022 18:07:01 UTC

IL PRESIDENTE E COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Roberto Occhiuto

Firma digitale

ROBERTO OCCHIUTO Regione Calabria 30.05.2022 10:29:03 GMT+01:00

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Piano operativo regionale

Investimenti Missione 6 Salute

ALLEGATO AL CIS – REGIONE CALABRIA

MAGGIO 2022

Indice

Indice 2
1. Premesse 4
2. Descrizione Piano Operativo e Action Plan 9
3. Linee guida alla compilazione degli Action Plan 11
4. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento 12
4.1. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento lavori 12
4.2. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento grandi apparecchiature 13
4.3. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento digitalizzazione 13
5. Attuazione impegni previsti per la Regione/Provincia Autonoma 14
6. Action Plan 15
6.1. Componente 1 – Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona – Action Plan 15
6.2. Componente 1 – Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – Action Plan. 21
6.3. Componente 1 – Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) – Action Plan 27
6.4. Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) – Action Plan 32
6.5. Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie – Action Plan 38
6.6 Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) 43
6.7. Componente 2 – Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR) – Action Plan 49
6.8. Componente 2 – Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC) – Action Plan 54
6.9. Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" – Action Plan 58
6.10. Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK…) – Action Plan 65
6.11. Componente 2 – Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di medicina generale – Action Plan 71
6.12. Componente 2 – Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere – Action Plan 77

7. Rispetto principi direttiva in materia Disabilità 82
8. Equità di Accesso 83
9. Rispetto principi in materia di pari opportunità di genere e generazionali 85
10. Modalità di monitoraggio e rendicontazione 87

ALLEGATO 1 – Descrizione PNRR, overview Missione 6 Salute e dettaglio Investimenti

ALLEGATO 2 – Tabelle localizzazioni interventi

ALLEGATO 3 – Tabelle "Non arrecare danno significativo"

ALLEGATO 4 – Tabelle Schede di monitoraggio

ALLEGATO 5 – Action Plan M6C2 2.2 b – Indicazioni nazionali sulla strutturazione del programma del corso di formazione sulle infezioni correlate all'assistenza in ambito ospedaliero

1. Premesse

La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:

- **Componente 1:** Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale;
- **Componente 2:** Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

La *Componente 1* ha l'obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all'attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari.

La *Componente 2* comprende, invece, misure volte al rinnovamento e all'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, al potenziamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da realizzare anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Per una descrizione completa degli investimenti della Missione 6 si rimanda all'Allegato 1 del presente documento.

Per i progetti a regia, per i quali le Regioni e le Provincie Autonome si configurano come soggetti attuatori, è stato ritenuto necessario intraprendere tutte le attività atte a garantire l'operatività programmatica, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, attraverso il Decreto di ripartizione programmatica delle risorse firmato dal Ministro della Salute in data 20 gennaio 2022. Il richiamato decreto ha ripartito complessivamente euro 8.042.960.665,58 suddivisi come segue tra i singoli interventi interessati:

- M6C1 1.1 "*Case della Comunità e presa in carico della persona*" per un importo di euro 2.000.000.000;
- M6C1 1.2 *"Casa come primo luogo di cura e Telemedicina"* per un importo complessivo di euro 4.000.000.000 – di cui sub investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)per un importo di euro 280.000.000– di cui interventi COT, Interconnessione aziendale, Device per un importo di euro 204.517.588;
- M6C1 1.3 "*Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità*" per un importo di euro 1.000.000.000;
- M6C2 1.1 "*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*" (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature – nuovi progetti e FSC) per un importo complessivo di euro 2.639.265.000;
- M6C2 1.2 "*Verso un ospedale sicuro e sostenibile*" per un importo di euro 638.851.083,58;
- M6C2 1.3. *"Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione*"- sub investimento 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK….) per un importo complessivo di euro 292.550.000– di cui intervento Reingegnerizzazione NSIS a livello locale (Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali -Consultori di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure Primarie) per un importo di euro 30.300.000;

- M6C2 2.2 (b) "*Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Corso di formazione in infezioni ospedaliere*" per un importo di euro 80.026.994;
- PNC – "*Verso un ospedale sicuro e sostenibile*" dal costo complessivo di euro 1.450.000.000.

Oltre ai suddetti interventi di investimento, per le finalità attuative del PNRR, è stato ritenuto opportuno includere nel Piano operativo anche i seguenti:

- M6C2 1.1 "*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*" (Rafforzamento strutturale del SSN) – progetti in essere per un importo complessivo di euro 1.413.145.000;
- M6C2 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione - sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) per un importo complessivo di euro 1.379.989.999,93 – di cui intervento "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" per un importo di euro 610.390.000;
- M6C2 2.2 (a) "*Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale*" per un importo di euro 101.973.006,00.

Il presente Piano Operativo della REGIONE CALABRIA si inserisce, pertanto, in via generale, nell'ambito del decreto di ripartizione sopra richiamato. Il Piano Operativo, comprensivo dell'Action Plan, uno per ciascun investimento per il quale la Regione si configura come soggetto attuatore, costituisce parte integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).

Prima di entrare nel dettaglio del Piano Operativo, si esplicitano le motivazioni assunte e le valutazioni specifiche effettuate dalla Regione Calabria in ordine alla localizzazione degli interventi.

Le linee guida e le schede di censimento di immobili e terreni predisposte da AGENAS davano come indicazione principale quella di favorire la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici pubblici, di proprietà o comunque nella disponibilità delle Azienda Sanitarie, da destinare alle suddette finalità.

Per alcune regioni italiane, le caratteristiche orografiche del territorio, la presenza di una rete di infrastrutture stradali funzionanti ed efficienti ed una distribuzione pressoché omogenea della popolazione hanno reso possibile valutare di allocare in un unico edificio la Casa di Comunità, la Centrale Operativa Territoriale e l'Ospedale di Comunità di un determinato comprensorio, con innegabili benefici in termini di integrazioni di funzioni e di gestione del personale.
Per l'individuazione dei siti sul territorio della Regione Calabria, che purtroppo da lunghi anni ha subito il commissariamento della Sanità, si è dovuto tenere conto di alcuni specifici fattori di criticità. Infatti, la popolazione residente nella regione Calabria, che conta 409 comuni, molti dei quali con meno di 5,000 abitanti ed ubicati in zone montane e periferiche, sconta problemi di accesso ai servizi sanitari; le ragioni di tale situazione sono da ascrivere:

- alle elevate distanze medie per raggiungere i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie territoriali;
- alle carenze della rete assistenziale territoriale e dell'assistenza domiciliare;
- alla rete stradale, di non sempre agevole percorribilità nelle zone montane, che non consente di accedere tempestivamente e facilmente ai presidi sanitari;

- alla spesso inconsistente manutenzione stradale, cui spesso si aggiungono le criticità di un territorio destabilizzato, perché di frequente in frana o soggetto a temibili manifestazioni di dissesto idrogeologico o sismico;
- alle caratteristiche oro – geografiche del territorio.

Alle suddette criticità si sono associate specifiche valutazioni relative al fabbisogno sanitario e sociosanitario della popolazione di riferimento, relative:

- all'analisi dei dati epidemiologici e demografici propri delle specifiche e diverse comunità locali, spesso afferenti ad un'unica Azienda Provinciale, che sovente può estendersi anche su un vasto territorio comprendente numerosi comuni (ad esempio, l'ASP di Cosenza annovera ben 150 comuni e circa 750.000 abitanti);
- alla mobilità passiva sia extraregionale che intra-regionale;
- all'offerta di salute attuale, inadeguata ad affrontare le patologie conseguenti a fenomeni di povertà diffusa, causa di diseguaglianze sociali,
- alle condizioni di economia locale, particolarmente riferibili alla composizione della popolazione relativa, distinta per qualità/quantità dell'occupazione, per inoccupazione/disoccupazione nonché alla rilevazione della presenza di genere, della popolazione scolare e dell'età anagrafica degli abitanti, indispensabili per designare raggruppamenti comunali ideali cui destinare le nuove strutture e iniziative di prossimità;
- all'assenza, in diverse zone della regione, di strutture sanitarie di riferimento,
- ai tempi di percorrenza verso i presidi sanitari, spesso sono adeguati.

La ponderazione dei suddetti fattori ha orientato la localizzazione delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali, degli Ospedali di Comunità e la loro distribuzione su tutto il territorio regionale, in base ai siti individuati dalle Aziende Sanitarie Provinciali.

In una prima fase di programmazione sono state distribuite sul territorio regionale le strutture sanitarie previste nel Decreto 20 gennaio 2022, del Ministero della Salute, recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Provincie Autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha previsto, nella Regione Calabria la realizzazione di n° 57 Case della Comunità, n° 19 Centrali Operative Territoriali e n° 15 Ospedali di Comunità. In una fase successiva è emersa la necessità di implementare il numero di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali, per assicurare una migliore copertura territoriale dei servizi sanitari da erogare ai cittadini calabresi e per assicurare, in ogni caso, il raggiungimento dei target prefissati dal PNRR a livello regionale, scongiurando il rischio di inficiare la riuscita del programma stesso in caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi, anche solo di alcuni degli interventi programmati; al riguardo, si è deciso, pertanto, di implementare il programma già definito a valere sulle risorse PNRR assegnate alla Regione Calabria dal citato Decreto 20 gennaio 2022, mediante la programmazione di ulteriori 5 Ospedali di Comunità, 4 Case della Comunità e 2 Centrali Operative Territoriali, a valere su risorse regionali.

Nella provincia di Cosenza sono state allocate n. 22 Case delle Comunità, da distinguersi eventualmente nella configurazione differenziata di Hub e Spoke, n. 9 Ospedali di Comunità e n. 7 Centrali Operative Territoriali.

I criteri di localizzazione per le Case di Comunità hanno tenuto conto di un obiettivo di baricentrismo, garante dell'equità assicurata dalla facilità nel raggiungimento da parte di tutti gli abitanti residenti nell'ambito distrettuale di competenza, e a quello della facilitazione viaria da assicurare al ricorso alla assistenza e alle cure infermieristiche di breve durata, assicurando presenze professionali adeguate; inoltre si è tenuto conto, specialmente nel centro

urbano di Cosenza, della presenza di forme organizzative assistenziali, quali UCCP e AFT da integrare funzionalmente proprio con le suddette strutture; ultimo criterio di individuazione delle Case di Comunità è stato quello di comprendere, nel proprio bacino di utenza, anche i territori di confine di regioni confinanti in cui non sono presenti strutture sanitarie.

Per gli Ospedali di Comunità, invece, si è optato per una collocazione in siti non assistiti da presidi sanitari, prescindendo se pubblici e/o privati accreditati, ma che possono assicurare ricoveri brevi a bassa intensità assistenziale soprattutto per i pazienti che necessitano di una post ospedalizzazione e/o cure periodiche continue, ponendosi ad un livello intermedio tra il domicilio e l'ospedale.

Per le Centrali Operative Territoriali, che rappresentano un elemento di novità e di presumibile successo dell'attuazione del progetto PNRR, perché di supporto e coordinamento dell'attività svolta dalla medicina di famiglia e specialistica, esse sono state previste in siti strategici.

Inoltre per la provincia di Cosenza, nel processo di definizione della distribuzione delle nuove strutture di assistenza territoriale, si è tenuto doverosamente conto della necessaria e celere prosecuzione dei lavori finalizzati alla costruzione del Presidio Ospedaliero della Sibaritide, in relazione al quale la Regione Calabria prodigherà ogni suo impegno per la sua ultimazione, così come farà per programmare la costruzione del nuovo Ospedale Hub di Cosenza.

Nella provincia di Crotone sono state allocate n. 6 Case della Comunità, da distinguersi eventualmente nella configurazione differenziata di Hub e Spoke, n. 1 Ospedale di Comunità e n. 2 Centrali Operative Territoriali.

L'individuazione dei siti in questo caso, è stata caratterizzata, oltre che dalla applicazione dei criteri summenzionati di determinazione allocativa, dall'effettuazione di un processo estimativo delle reali condizioni assistenziali sul territorio crotonese, evidenziate anche, nel corso degli anni, e dell'analisi sui fattori di rischio epidemiologico che affliggono l'anzidetto territorio; su questo territorio per decine di anni è stato presente un insediamento industriale ad elevato rischio ambientale e di salute per tutti gli abitanti.

Per il resto e in via generale, si è ritenuto soddisfare la domanda di salute proveniente dalle aree territoriali interessate da fenomeni di insalubrità diffusa e dalla comunità residente nell'intera provincia individuando i siti di maggiore concentrazione urbana, privilegiando le sedi più attrattive dell'immigrazione crotonese.

Per la provincia di Catanzaro, sono state istituite n. 11 Case della Comunità, n. 4 Ospedali di Comunità e n. 4 Centrali Operative Territoriali.

Le scelte strategiche per l'individuazione dei siti su cui allocare le strutture sanitarie, oltre a fondarsi sui criteri sin qui descritti, si sono indirizzate verso l'utilizzo di strutture in disuso da vari anni; una ulteriore considerazione, che ha portato ad assumere la più attuale allocazione delle CdC, degli OdC e delle COT della provincia catanzarese, ha riguardato il perseguimento dell'equità assistenziale territoriale da assicurare sia sul versante tirrenico che su quello ionico della medesima, generando condizioni di soddisfacimento delle esigenze locali avvertite nella parte collinare-montana adiacente ai versanti.

Nella provincia di Vibo Valentia sono state allocate n. 5 Case della Comunità, da distinguersi eventualmente nella configurazione differenziata di Hub e Spoke, n. 2 Ospedali di Comunità e n. 2 Centrali Operative Territoriali.

Nella distribuzione delle Case della Comunità hanno inciso fattori emergenziali, nel senso di assicurare certezza assistenziale in favore di territori e comunità sprovvisti di presidi ospedalieri, gli unici a garantire in un siffatto territorio l'offerta pubblica di salute, peraltro non di livello di prestazione esaltante, tanto da aver causato in passato penosi incidenti operatori; il tutto, tenuto anche conto dell'avviata realizzazione dell'Ospedale di Vibo Valentia che offrirà alla provincia una qualità e una quantità prestazionale di spedalità finalmente all'altezza della domanda. Per le strutture di comunità si è tenuto conto anche della marginalizzazione dei centri semi-montani assicurando loro una presenza garante di una assistenza fissa h24, con la resa del servizio notturno della continuità assistenziale ben efficientata. Per quanto concerne le COT, l'individuazione dei relativi siti è stata improntata sul principio del baricentrismo rispetto al bacino d'utenza di riferimento.

Nella provincia di Reggio Calabria sono state allocate n. 17 Case della Comunità, da distinguersi eventualmente nella configurazione differenziata di Hub e Spoke, n. 4 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali.

In tale provincia di confine e ad alta intensità di traffico automobilistico pesante e navale, sono state prese in considerazione, attentamente e in via preliminare, le esigenze di fabbisogno epidemiologico generico. Le Case di Comunità sono state allocate utilizzando il patrimonio reso gratuitamente disponibile dal sistema della salute, da quello scolastico-comunale e da quello oggi impegnato nell'esercizio del centro per l'impiego; una opzione che ha assicurato una rinnovata presenza fissa H24 in altrettanti centri urbani ad alta intensità abitativa e a prevalente diffuso disagio sociale, anche di provenienza legati ai flussi immigratori, da dovere assolutamente compensare con l'esercizio continuativo di attività sociosanitarie e con corrette politiche di controllo sul lavoro nero.

In relazione agli Ospedali di Comunità, si è offerta l'occasione di una loro attribuzione a siti sprovvisti di qualsivoglia assistenza fissa ed organica, di tipo infermieristico, non disattendendo in proposito la necessità di implementazione strutturale, da effettuare nella Calabria grecanica.

Infine, per quanto riguarda le COT, si sono intese privilegiare le grandi aree urbane, e si è tenuto conto della costruzione dell'Ospedale della Piana di Gioia Tauro.

2. Descrizione Piano Operativo e Action Plan

Il presente Piano Operativo si compone degli Action Plan redatti dalla REGIONE CALABRIA per ciascuna Linea di investimento, dettagliati degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, e per i quali la Regione ha predisposto apposite "*schede intervento*", per le quali si rimanda al paragrafo 4.

La tabella che segue illustra per ciascun investimento di cui la Regione si configura quale soggetto attuatore, per il tramite delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (*articolo 5 del Contratto Istituzionale di Sviluppo*):

- il dettaglio dei macro-target nazionali, che rappresentano l'obiettivo minimo complessivo a livello nazionale dell'investimento, soggetto al monitoraggio da parte dell'Organismo competente nazionale o europeo;
- i termini di esecuzione regionali;
- le risorse economiche assegnate a livello nazionale per ciascun investimento.

Tabella 1 - Dettaglio Target massimo, termine di esecuzione e risorse assegnate per investimento/sub-investimento

Riferimento Missione e Componente	Codifica Decreto MEF_06/08/2021	Riferimenti Investimenti	Macro target nazionale	Termine esecuzione regionale	Totale Risorse [€]
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina					**3.204.517.588**
M6C1	**1.1**	**Case della Comunità e presa in carico della persona**	**1350**	**T1 2026**	**2.000.000.000**
	1.2	**Casa come primo luogo di cura e telemedicina**			**204.517.588**
	1.2.2	Centrali operative territoriali (COT)	600	T1 2024	204.517.588
		di cui COT	*600*	*T1 2024*	*103.845.000*
		di cui: interconnessione aziendale	*N/A*	*T1 2024*	*42.642.875*
		di cui: device	*N/A*	*T1 2024*	*58.029.713*
	1.3	**Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)**	**400**	**T1 2026**	**1.000.000.000**
PNRR - Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria					**5.513.951.084**
M6C2	**1.1**	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero**			**4.052.410.000**
	1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	280	T3 2025	1.450.110.000
		Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Rafforzamento strutturale del SSN) - progetti in essere	N/A	T2 2026	1.413.145.000
	1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apprecchiature)	3100	T4 2024	1.189.155.000
	1.2	**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**	**109**	**T2 2026**	**638.851.084**
	1.3.1	**Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni"**	**N/A**	**T2 2026**	**610.390.000**
	1.3.2	**Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK….)**	**4**	**T1 2025**	**30.300.000**
	2.2	**Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario**			**182.000.000**
	2.2 (a)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale	2700	T2 2024	101.973.006
	2.2 (b)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	293.386	T2 2026	80.026.994
Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)					**1.450.000.000**
	2	**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**	**220**	**T2 2026**	**1.450.000.000**
TOTALE					**10.168.468.672**

Il Piano Operativo è articolato in Action Plan per ciascuna delle Linee di Investimento della Missione 6 "Salute" di cui le Regioni/Province Autonome sono soggetti attuatori.

2.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - 3.4.1 Obblighi di comunicazione a livello di progetto

Per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono ripotare l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU.

Nello specifico i soggetti attuatori dovranno:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento);

- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;

- se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"

3. Linee guida alla compilazione degli Action Plan

Gli Action Plan relativi a ciascuna linea d'investimento sono redatti dalla REGIONE CALABRIA tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate:

OBIETTIVO PNRR o PNC	Sezione precompilata
INDICATORI COMUNI	Sezione precompilata
INDICAZIONI OPERATIVE	Sezione parzialmente precompilata da integrare indicando: • le eventuali ulteriori azioni che la Regione o PP.AA. intende intraprendere ai fini dell'attuazione dell'investimento; • le specifiche relative alle eventuali procedure aggregate di affidamento di cui la Regione o PP.AA. si serve al fine di rispettare quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Contratto Istituzionale di Sviluppo.
OBIETTIVI REGIONALI	Sezione parzialmente precompilata da integrare indicando: • Target massimo regionale; • Fabbisogno.
CR0NOPROGRAMMA	Sezione precompilata
RIFERIMENTI NORMATIVI	Sezione da compilare indicando i riferimenti normativi relativi all'ambito di investimento.
DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"	Sezione precompilata contenente il Dettaglio dell'eventuale quota assegnata (tag) alla dimensione "green" e "digital" per ciascun investimento, secondo le percentuali stabilite dalle linee guida comunitarie.
DO NO SIGNIFICANT HARM	Sezione precompilata con la valutazione degli investimenti rispetto al principio di "*non arrecare un danno significativo*" all'ambiente.

4. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento

Le Schede Intervento sono state redatte per ogni singolo intervento dalla REGIONE CALABRIA utilizzando, a seconda della tipologia di intervento oggetto della scheda (lavori/grandi apparecchiature/digitalizzazione), uno dei tre schemi presenti nel portale messo a disposizione da AGENAS e tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate:

4.1. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento lavori

SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN); • l'intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo intervento, CUP/Codice Progetto, Importo complessivo, Investimento PNRR, etc.).
SEZIONE II: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • la tipologia di intervento (i dati dimensionali del singolo intervento in termini di superfici lorde); • la dichiarazione di coerenza dell'intervento con gli obiettivi generali del PNRR; • la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della missione dell'intervento; • l'inquadramento programmatico; • gli aspetti giuridico – amministrativi relativi all'appaltabilità dell'intervento; • le procedure in materia ambientale, archeologica, etc.; • gli elementi progettuali e stato di attuazione attuale/previsto; • il cronoprogramma; • il quadro economico dei lavori.
SEZIONE III: DATI ECONOMICI, FINANZIARI	La presente sezione deve essere compilata specificando: • le fonti di finanziamento del progetto; • il cronoprogramma finanziario.
SEZIONE IV: DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE	La presente sezione deve essere compilata specificando i dati generali e i dati dimensionali/patrimoniali dell'immobile.

4.2. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento grandi apparecchiature

SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN); • l'intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo intervento, CUP/Codice Progetto, Descrizione apparecchiatura, Importo complessivo, etc.).
SEZIONE II: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • tipologia di intervento; • la dichiarazione di coerenza dell'intervento con gli obiettivi generali del PNRR; • la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della missione dell'intervento; • l'inquadramento programmatico; • il cronoprogramma; • il quadro del fabbisogno di spesa.
SEZIONE III: DATI ECONOMICI, FINANZIARI	La presente sezione deve essere compilata specificando: • le fonti di finanziamento del progetto; il cronoprogramma finanziario.

4.3. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento digitalizzazione

SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN); • l'intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo intervento, CUP/Codice Progetto, Importo complessivo, etc.).
SEZIONE II: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • la dichiarazione di coerenza dell'intervento con gli obiettivi generali del PNRR; • la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della missione dell'intervento; • l'inquadramento programmatico; • gli aspetti giuridico – amministrativi relativi all'appaltabilità dell'intervento; • il cronoprogramma; • il quadro economico dei lavori.
SEZIONE III: DATI ECONOMICI, FINANZIARI	La presente sezione deve essere compilata specificando: • le fonti di finanziamento del progetto; • il cronoprogramma finanziario.

5. Attuazione impegni previsti per la Regione Calabria

La Regione Calabria procede a dare attuazione agli impegni previsti per il soggetto attuatore dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, in particolare in riferimento a quanto previsto all'articolo 5 dello stesso, secondo quanto riportato nella tabella di seguito:

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI REGIONALI DI CUI AGLI ARTICOLO. 12 E 5 DEL CIS	
DELEGA DEL RUOLO DI SOGGETTO ATTUATORE AGLI ENTI DEL SSR – SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO (cfr. art. 5 comma 2 CIS)	▪ Azienda Sanitaria Provinciale di COSENZA (ASP CS); ▪ Azienda Sanitaria Provinciale di CATANZARO (ASP CZ); ▪ Azienda Sanitaria Provinciale di REGGIO CALABRIA (ASP RC); ▪ Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE (ASP KR); ▪ Azienda Sanitaria Provinciale di VIBO VALENTIA (ASP VV); ▪ Azienda Ospedaliera di COSENZA (AO CS); ▪ Azienda Ospedaliera di CATANZARO (AO CZ); ▪ Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di CATANZARO (AOU CZ); ▪ Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli-REGGIO CALABRIA (GOM RC).
RICORSO A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AGGREGATE (cfr. art. 5 comma 3 CIS)	▪ Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi nel presente Piano, la Regione Calabria intende avvalersi della previsione normativa dell'art.10 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che prevede la possibilità, mediante apposite convenzioni, di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (INVITALIA, CONSIP). ▪ La Regione Calabria ha aderito formalmente alla Manifestazione di interesse per la stipula di un Accordo Quadro con INVITALIA, per interventi infrastrutturali PNRR e PNC; sulla base delle indicazioni fornite dalle Aziende del SSR, sono state già definite, per ciascun intervento, le fasi prestazionali (progettazione, verifica, lavori, appalto integrato, collaudo) per cui si intende ricorrere al supporto tecnico-operativo di INVITALIA.

6. Action Plan

6.1. Componente 1 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona - Action Plan

C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

OBIETTIVO PNRR	
TARGET EU	1.350 case della comunità
TARGET MASSIMO	(definito a livello nazionale)
DESCRIZIONE CID	Il progetto di investimento consiste nella creazione e nell'avvio di almeno 1.350 Case della Comunità, attraverso l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza di base e la realizzazione di centri di assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta integrata alle esigenze di assistenza.
REQUISITI CID TARGET M6 C1 3	Almeno 1.350 Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multi professionale. Le nuove costruzioni finanziate dall'RRF devono esser conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
12. Capacità delle strutture di assistenza sanitarie nuove o modernizzate	▪ Numero massimo annuo di persone che possono essere servite almeno una volta nell'arco di un anno da una struttura sanitaria o modernizzata grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo	▪ Semestrale

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione ha concluso nel 2021 l'attività di ricognizione delle localizzazioni e siti idonei alla realizzazione delle Case di Comunità, in linea con le direttive date da AGENAS, ed entro dicembre 2021 ha caricato e ha trasmesso i dati relativi agli individuati immobili e terreni de quibus, sulle specifiche piattaforme telematiche, rese disponibili da AGENAS, previa una opportuna valutazione e validazione regionale, come previsto dalle scadenze PNRR. ▪ La Regione ha proceduto ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini dell'indizione delle gare per l'attivazione e avvio delle Case della Comunità. ▪ La Regione ha proceduto a verificare che i singoli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) monitorino l'aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello organizzativo delle Case della Comunità definito dal Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022. ▪ La Regione ha proceduto ad elaborare le schede intervento, come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento all'investimento in oggetto. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). ▪ Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, sarà data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato.
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione ha dettagliato le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e ha definito gli oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal MEF con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 ▪ Le schede di intervento del presente Action Plan evidenziano un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento; la Regione Calabria farà ricorso a risorse integrative di finanziamento regionali nell'ambito delle disponibilità che verranno reperite in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 30 aprile 2022 e con le modalità stabilite dall'art. 56 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50. ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed integrate dalle risorse aggiuntive suddette sono state modulate sulla base dell'attuale stima del fabbisogno, e potranno essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE	[57]
TARGET MASSIMO REGIONALE	[61]
FABBISOGNO	Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Case della Comunità (distinte fra da edificare e da ristrutturare) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascuna Casa della Comunità è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

Ente del SSR	Numero Case della Comunità da edificare	Numero Case della Comunità da ristrutturare	Totale
ASP Cosenza	*4*	*18*	22
ASP Catanzaro	*1*	*10*	11
ASP Crotone	*0*	*6*	6
ASP Vibo Valentia	*0*	*5*	5
ASP Reggio Calabria	*0*	*17*	17
Totale	*5*	*56*	*61*

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla Regione dal PNRR: € 84.677.262,22

Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 84.677.260,00

Importo integrativo regionale (DGR 174/2022) per efficientamento energetico: € 5.885.518,00

Importo integrativo regionale (DGR 174/2022) per nuovi interventi: € 6.000.000,00

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità	T2 2022	
Target	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità	T1 2023	
Target	Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte)	T1 2023	
Target	Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità	T3 2023	
Target	Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	T1 2026	

GANTT

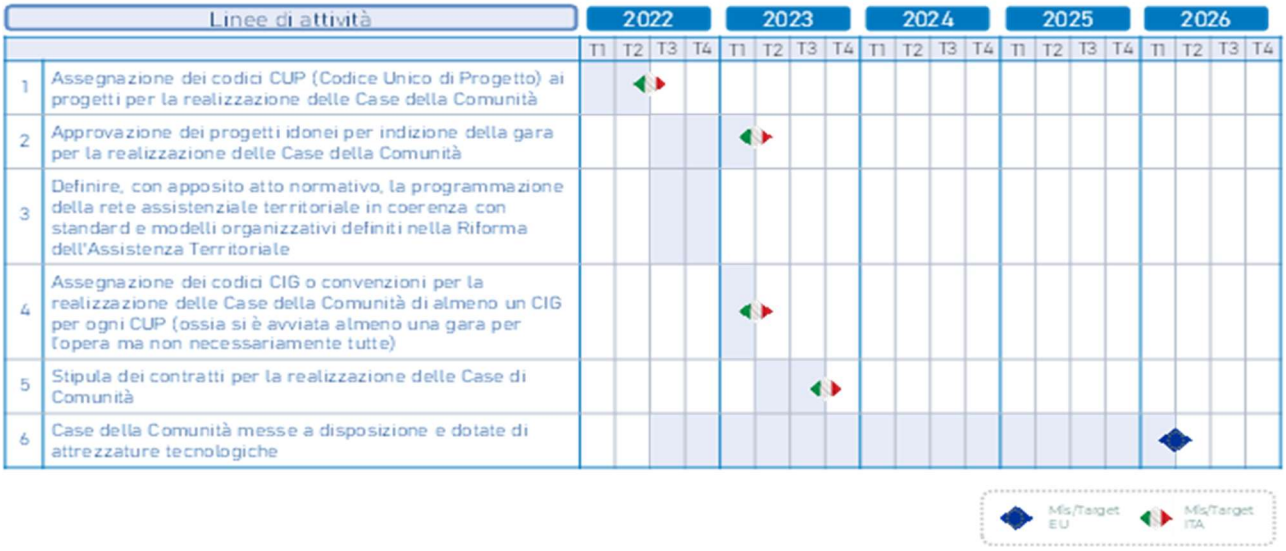

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 "Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere" e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)", ed in particolare il TITOLO II, recante "Disposizioni in materia sanitaria";*
- *Regione Calabria Decreto del Commissario ad Acta 10 marzo 2020, n. 65 "Programma operativo 2019/2021 - Riorganizzazione della Rete Territoriale";*
- *Regione Calabria DCA n.15 del 01/03/2022.*
- *DGR n. 174 del 30 aprile 2022*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse del piano.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.1.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota Risorse assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C1	**1.1**	**Case della Comunità e presa in carico della persona**	**84.677.260,00**	**7.727.830,00**	025 ter - Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico	40%			**3.091.132,00**	
				76.949.430,00	026 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40%			**30.779.773,00**	
			Totale	**100%**						

La Regione Calabria si impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare che le risorse siano destinate ad investimenti di cui ai seguenti tag 025 ter e 026 indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.1 è riportato nella tabella 5 dell'Allegato 3alpresente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano nonché quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 "Costruzione di nuovi edifici";
- scheda 2"Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
- scheda 4"Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5"Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

6.2. Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – Action Plan

C1 – 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina
1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT)

OBIETTIVOPNRR	
TARGET EU	**600** COT
TARGET MASSIMO	**(definito a livello nazionale)**
DESCRIZIONE CID	L'investimento previsto riguarda l'attivazione di 602 Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.
REQUISITI CID TARGET M6 C1 7	Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione di almeno 600 Centrali operative territoriali (una ogni 100 000 abitanti) con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE	
MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione ha concluso nel 2021 l'attività di ricognizione delle localizzazioni e siti idonei alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali e ha proceduto con l'individuazione dei siti idonei a dicembre 2021. ▪ La Regione ha proceduto ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini dell'indizione delle gare per la realizzazione delle COT. ▪ La Regione ha proceduto a verificare che i singoli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno monitorato l'aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello organizzativo delle COT definito dal Ministero della salute di concerto con il MEF. ▪ La Regione ha proceduto ad elaborare le schede di intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento all'investimento in oggetto. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). ▪ Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, sarà data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato.
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione ha dettagliato le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e ha definito gli oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 ▪ Le schede di intervento del presente Action Plan evidenziano un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento; la Regione Calabria farà ricorso a risorse integrative di finanziamento regionali

nell'ambito delle disponibilità che verranno reperite in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 30 aprile 2022 e con le modalità stabilite dall'art. 56 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed integrate dalle risorse aggiuntive suddette sono state modulate sulla base dell'attuale stima del fabbisogno, e potranno essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE	[19]
TARGET MASSIMO REGIONALE	[21]

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione/Provincia Autonoma in termini di numero di COT, dettagliato per Ente del SSR e sede/localizzazione COT. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascuna COT è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

AZIENDA	Sede COT
ASP Cosenza	*Corigliano-Rossano (A.U. Rossano) – Distretto Ionio Sud*
ASP Cosenza	*Corigliano-Rossano (A.U. Corigliano) – Distretto Ionio Nord*
ASP Cosenza	*Cosenza Distretto Cosenza Savuto*
ASP Cosenza	*Rende(Quattromiglia) – Distretto Valle Crati*
ASP Cosenza	*Paola Distretto Tirreno*
ASP Cosenza	*Castrovillari Distretto Esaro Pollino*
ASP Cosenza	*Via Degli Stadi*
ASP Crotone	*Crotone Poliambulatorio*
ASP Crotone	*Mesoraca Località Campizzi*
ASP Catanzaro	*Botricello Nuova Costruzione*
ASP Catanzaro	*Catanzaro Distretto*
ASP Catanzaro	*Soverato Nuova Costruzione*
ASP Catanzaro	*Lamezia Terme Distretto*
ASP Vibo Valentia	*Pizzo Struttura Sanitaria*
ASP Vibo Valentia	*Nicotera Via Filippella snc*
ASP Reggio Calabria	*Locri SAUB*
ASP Reggio Calabria	*Palizzi Struttura Sanitaria*
ASP Reggio Calabria	*Reggio Calabria Poliambulatorio (ex INAIL)*
ASP Reggio Calabria	*Bagnara Calabra Poliambulatorio*
ASP Reggio Calabria	*Cardeto Palazzo Municipale*
ASP Reggio Calabria	*Taurianova Poliambulatorio*
Totale	***21***

IMPORTO ASSEGNATO	Importo assegnato alla Regione dal PNRR per immobili COT: €3.288.425,00; Importo degli interventi sugli immobili COT a valere su risorse PNRR: €3.285.079,00 Importo integrativo regionale (DGR 174/2022) per efficientamento energetico: € 489.100,00; Importo integrativo regionale (DGR 174/2022) per nuovi interventi: € 348.000,00. Importo assegnato alla Regione dal PNRR per interconnessione COT: € 1.350.357,71; Importo degli interventi per interconnessione COT a valere su risorse PNRR: €1.350.349,00; Importo integrativo regionale (DGR 174/2022) per interconnessione COT: € 150.000,00; Importo assegnato alla Regione dal PNRR risorse device COT: €1.837.607,58; Importo degli interventi per device COT a valere su risorse PNRR: € 1.837.594,86; Importo Integrativo regionale (DGR 174/2022) per device COT: € 199.903,34

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T2 2022	
Target	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per l'interconnessione aziendale	T2 2022	
Target	Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali	T4 2022	
Target	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T4 2022	
Target	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l'interconnessione aziendale	T4 2022	
Target	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T2 2023	
Target	Stipula dei contratti per l'interconnessione aziendale	T2 2023	
Target	Centrali operative pienamente funzionanti	T1 2024	
Target	Completamento interventi per interconnessione aziendale	T1 2024	

GANTT

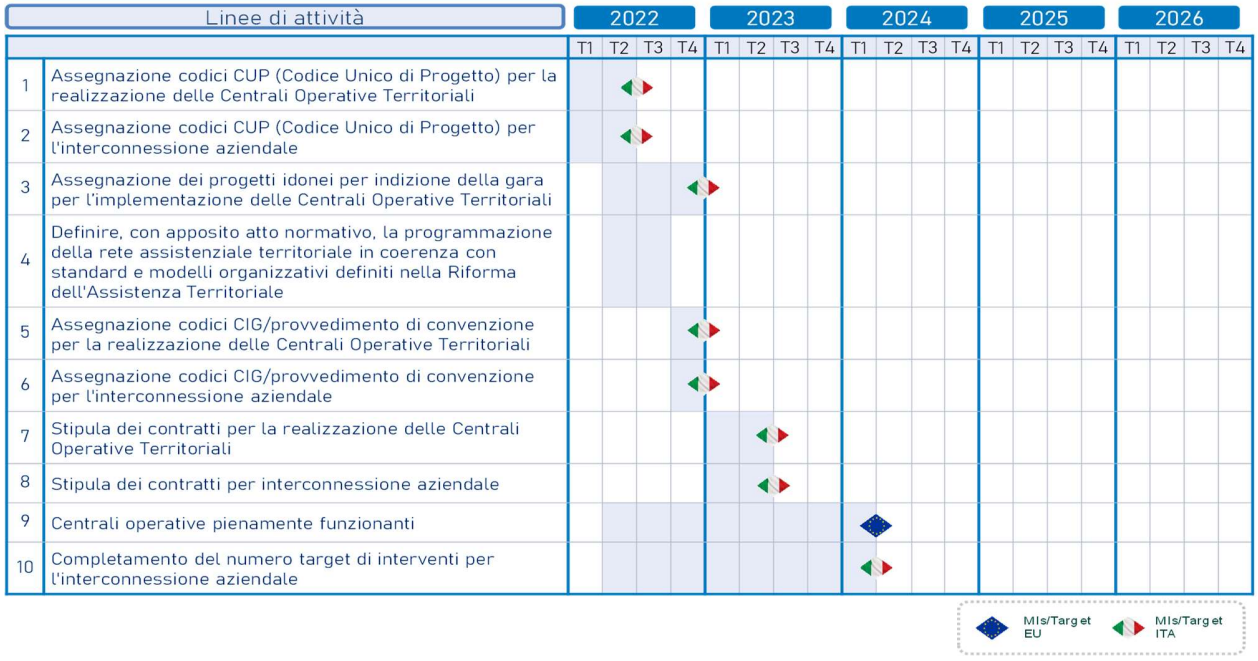

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 "Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere" e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)", ed in particolare il TITOLO II, recante "Disposizioni in materia sanitaria";*
- *Regione Calabria Decreto del Commissario ad Acta 10 marzo 2020, n. 65 "Programma operativo 2019/2021 - Riorganizzazione della Rete Territoriale";*
- *Regione Calabria DCA n.15 del 01/03/2022*
- *DGR n. 174 del 30 aprile 2022*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizzala quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.2.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	%Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C1	**1.2**	**Casa come primo luogo di cura e telemedicina**			013 - Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)	0%	013 - Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)	100%		**6.473.022,86**
	1.2.2	**Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)**	**6.476.390,29**	**6.473.022,86**						
		di cui: COT	**3.288.425,00**	**3.285.079,00**						
		di cui: interconnessione aziendale	**1.350.357,71**	**1.350.349,00**						
		di cui: device	**1.837.607,58**	**1.837.594,86**						

La Regione Calabria s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale)indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con

successive circolari da parte dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.2è riportato nella tabella 6 dell'Allegato 3 di cui al presente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud";
- scheda 9 "Acquisto di veicoli".

6.3. Componente 1 - Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) – Action Plan

C1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

OBIETTIVO PNRR	
TARGET EU	**400** Ospedali di Comunità
TARGET MASSIMO	**(definito a livello nazionale)**
DESCRIZIONE CID	L'investimento si concretizzerà nella realizzazione di almeno 400 Ospedali di Comunità,
REQUISITI CID TARGET M6 C1 11	Almeno 400 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche Gli ospedali comunitari sono strutture sanitarie destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
12. Capacità delle strutture di assistenza sanitarie nuove o modernizzate	▪ Numero massimo annuo di persone che possono essere servite almeno una volta nell'arco di un anno da una struttura sanitaria o modernizzata grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo	▪ Semestrale

INDICAZIONI OPERATIVE	
MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione ha concluso nel 2021 l'attività di ricognizione delle localizzazioni e siti idonei alla realizzazione degli Ospedali di Comunità, come previsto dalle scadenze PNRR, e ha proceduto con l'individuazione dei siti idonei a dicembre 2021. ▪ La Regione ha proceduto ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini dell'indizione delle gare per l'attivazione e avvio degli Ospedali di Comunità. ▪ La Regione ha proceduto a verificare che i singoli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno monitorato l'aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello organizzativo degli Ospedali di Comunità definito dal Ministero della salute di concerto con il MEF. ▪ La Regione ha proceduto ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento all'ambito di investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). ▪ Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato.
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione ha dettagliato le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e ha definito gli oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei

relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal MEF con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022

- Le schede di intervento del presente Action Plan evidenziano un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento; la Regione Calabria farà ricorso a risorse integrative di finanziamento regionali nell'ambito delle disponibilità che verranno reperite in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 30 aprile 2022 e con le modalità stabilite dall'art. 56 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed integrate dalle risorse aggiuntive suddette sono state modulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, e potranno essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE

[15]

TARGET MASSIMO REGIONALE

[20]

FABBISOGNO

Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Ospedali di Comunità (distinti fra da edificare e da riconvertire) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun Ospedale di Comunità è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

Ente del SSR	Numero Ospedali di Comunità da edificare	Numero Ospedali di Comunità da riconvertire	Totale
ASP Cosenza	*0*	*9*	*9*
ASP Crotone	*0*	*1*	*1*
ASP Catanzaro	*1*	*3*	*4*
ASP Vibo Valentia	*0*	*2*	*2*
ASP Reggio Calabria	*0*	*4*	*4*
Totale	***1***	***19***	***20***

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla regione dal PNRR: € 37.634.338,76

Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 37.631.958,00

Importo integrativo regionale (DGR 174/2022) per efficientamento energetico: € 2.578.065,00;

Importo integrativo regionale (DGR 174/2022) per nuovi interventi: € 12.500.000,00.

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T2 2022	
Target	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T1 2023	
Target	Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T1 2023	
Target	Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T3 2023	
Target	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T1 2026	

GANTT

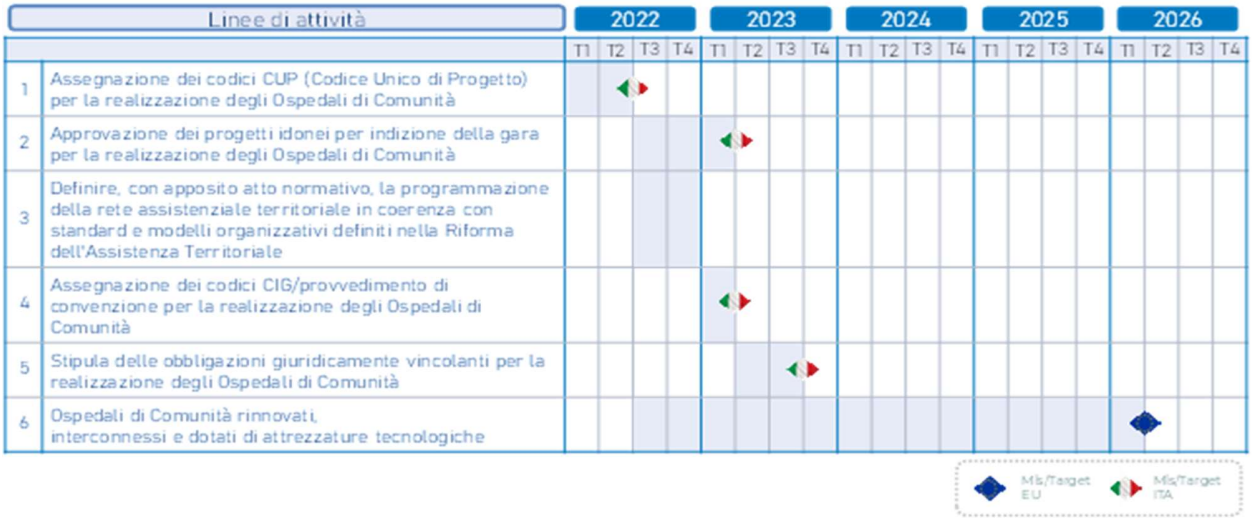

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *[Legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 "Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere" e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)", ed in particolare il TITOLO II, recante "Disposizioni in materia sanitaria";*
- *Decreto del Commissario ad Acta 10 marzo 2020, n. 65 "Programma operativo 2019/2021 - Riorganizzazione della Rete Territoriale";*
- *Regione Calabria DCA n.15 del 01/03/2022*
- *DGR n. 174 del 30 aprile 2022*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.3.

(tabella non modificabile da regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C1	**1.3**	**Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)**	**37.634.338,76**	**37.631.958,00**	092 - Infrastrutture per la sanità	0%			0	

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il citato Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.3è riportato nella tabella 7 dell'Allegato 3alpresente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 "Costruzione di nuovi edifici";
- scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici".

6.4. Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) – Action Plan

C2 – 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.11 – Digitalizzazione DEA I e II livello

OBIETTIVO PNRR

TARGET EU	**280 Ospedali sede di DEA I e II Livello digitalizzati**
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce al potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sede di DEA (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di I livello e di II livello.
REQUISITI CID TARGET M6C2 8	Ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un centro di elaborazione di dati (CED) necessario per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera e sufficienti tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione di ciascun reparto ospedaliero.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione ha il fondamentale obiettivo di garantire l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, per il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche, al fine di conseguire una migliore efficienza dei livelli assistenziali e di adeguare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali ▪ La Regione ha individuato 11 interventi di digitalizzazione di strutture sanitarie sede di DEA I e II livello, analizzando il fabbisogno di ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale (SSR) finalizzato alla digitalizzazione dei DEA di I e II livello. ▪ La Regione e le Aziende, di concerto con il Ministero della Salute, hanno individuato le modalità di approvvigionamento (gare Consip), attraverso un format semplificato predisposto da CONSIP ▪ La Regione e le Aziende hanno proceduto ad elaborare le schede intervento, come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno delle Aziende (DCA 16/2022) con riferimento al presente investimento. ▪ Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. inquadramento programmatico, aspetti giuridico-amministrativi relativi alla appaltabilità dell'intervento, elementi progettuali e stato di attuazione attuale/previsto quadro economico del progetto). ▪ La Regione e le Aziende del SSR ricorrono ad accordi quadro con Consip opportunamente indicati nelle schede di intervento.
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione e le Aziende del SSR hanno dettagliato le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento definite nelle schede di intervento ▪ Relativamente a questo sub-investimento le Aziende non hanno evidenziato un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate

sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE [11]

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione per Ente del SSR, per tipologia di struttura (DEA I o II livello) e intervento di digitalizzazione. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	Titolo Progetto	Presidio ospedaliero	DEA I o II Livello	Comune
ASP COSENZA	*INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEA I LIVELLO DELLO SPOKE DI ROSSANO CORIGLIANO*	*P.O. CORIGLIANO /ROSSANO*	*DEA I*	*CORIGLIANO /ROSSANO*
ASP COSENZA	*INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEA I LIVELLO DELLO SPOKE DI CASTROVILLARI*	*P.O. PAOLA/CETRARO*	*DEA I*	*PAOLA/CETRARO*
ASP COSENZA	*INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEA I LIVELLO SPOKE PAOLA-CETRARO*	*P.O. CASTROVILLARI*	*DEA I*	*CASTROVILLARI*
ASP CROTONE	*SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO DEL PO DI CROTONE*	*OSPEDALE DI CROTONE*	*DEA I*	*CROTONE*
ASP CATANZARO	*AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO*	*PO LAMEZIA TERME*	*DEA I*	*LAMEZIA TERME*
ASP VIBO VALENTIA	*IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE*	*P.O .VIBO VALENTIA*	*DEA I*	*VIBO VALENTIA*
ASP REGGIO CALABRIA	*PNRR INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL DEA DI I° LIVELLO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI (RC)*	*P.O. LOCRI*	*DEA I*	*LOCRI*
ASP REGGIO CALABRIA	*PNRR INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL DEA DI I° LIVELLO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI (RC)*	*P.O. POLISTENA*	*DEA I*	*POLISTENA*
AO "ANNUNZIATA" COSENZA	*SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO*	*ANNUNZIATA/S.BARBARA/MARIANO SANTO*	*DEA I I*	*COSENZA*
AO "PUGLIESE-CIACCIO" CATANZARO /AOU "MATER DOMINI" CATANZARO	*AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO*	*PO "PUGLIESE" /PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO E UFFICI AMMINISTRATIVI*	*DEA I I*	*CATANZARO*
G.O.M. "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" REGGIO CALABRIA	*SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI DEL GOM BIANCHI MELACRINO MORELLI DI REGGIO CALABRIA*	*P.O. G.O.M. "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" REGGIO CALABRIA*	*DEA I I*	*REGIO DI CALABRIA*

DEA: Dipartimento di Emergenza e Accettazione.

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla regione dal PNRR: € 54.573.930,99
Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 54.573.930,43

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) (*).	T4 2022	
Target	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione -Livello I e II)	T3 2025	

(*) La milestone è relativa alle gare Consip

GANTT

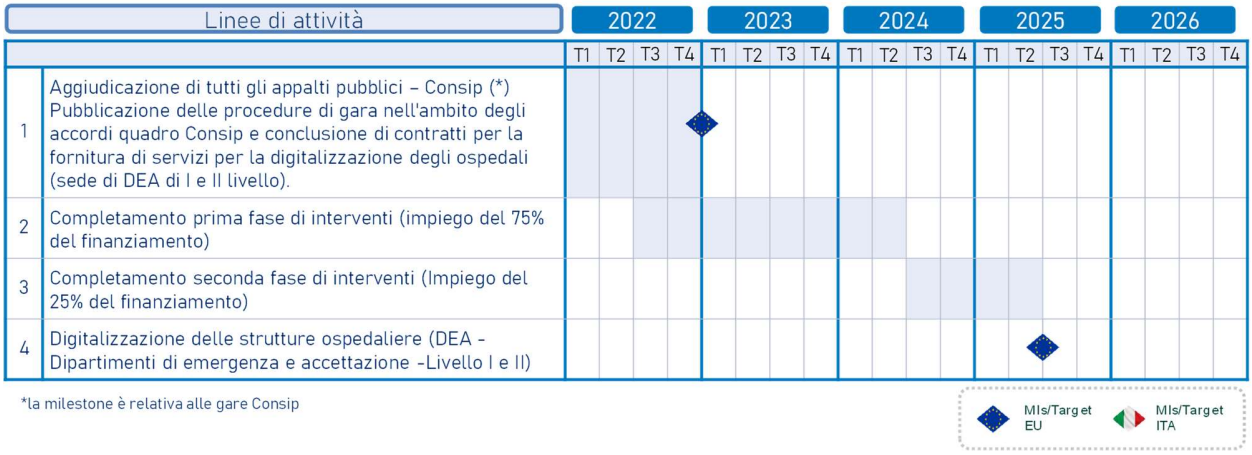

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *DLg 50/2016*
- *Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF),*
- *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 6*
- *Decreto 06 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 229 del 24 settembre 2021, che prevede , in particolare, alla Missione 6, Componente 2, l 'Investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", suddiviso nei due sub-investimenti:*
  - ✓ *Investimento 1.1.1 "Digitalizzazione" con uno stanziamento complessivo di € 1.450.110.000,00, al netto dei progetti già in essere;*
  - ✓ *Investimento 1.1.2 "Grandi Apparecchiature' ', con uno stanziamento complessivo di € 1.189.155.000*

- *Decreto del Ministero della Salute 20 gennaio 2022recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Provincie Autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasmesso dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha attribuito alla Regione Calabria gli importi:*
  - ✓ *di € 54.573.930,99, a valere sulla Missione 6, Componente 2, Sub-Investimento 1.1.1, per la realizzazione di n° 11 interventi di digitalizzazione;*
  - ✓ *di € 44.753.062, 11, a valere sulla Missione 6, Componente 2, Sub-Investimento 1.1.2, per la fornitura e posa in opera di n° 286 grandi apparecchiature;*
- *Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Deliberazione consiglio dei ministri 4 Novembre 2021 con la quale il Presidente della Giunte regionale della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario in Regione Calabria, secondo i programmi operativi di cui all'art.2, comma 88, della legge n.192 del 2009, ivi ricomprendendo la gestione dell'emergenza pandemica;*
- *Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021*
- *Legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 "Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere" e successive modifiche ed integrazioni; Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)", ed in particolare il TITOLO II, recante "Disposizioni in materia sanitaria";*
- *Accordo sul Piano di Rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della Salute, quello dell'Economia e della Finanze e il presidente p.t. Della Regione Calabria in data17.12.2009 e poi recepito con DGR n.97 del 12.2.2010*
- *Regione Calabria Decreto del Commissario ad Acta 5 luglio 2016, n. 64 "Programma operativo 2016/2018 - Riorganizzazione della Rete Ospedaliera";*
- *Regione Calabria DCA n.8 del 10/02/2022*
- *Regione Calabria DCA n.9 del 14/02/2022*
- *Regione Calabria DCA n.16 del 2022 Approvazione della proposta di piano degli interventi previsti nella Regione Calabria del PNRR Missione 6 componente 2 Investimento 1.1*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.1.1.

(tabella non modificabile da regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Innovazione, ricerca digitalizzazione dell'assistenza sanitaria									**Green**	**Digital**
M6C2	**1.1**	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero**								
	1.1.1	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)**	**54.573.930,99**	**54.573.930,43**	093 - Attrezzature sanitarie	0%	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	100%	-	**54.573.930,43**

La Regione s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale)indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.1.1è riportato nella Tabella 8 dell'Allegato 3alpresente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella"Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer eapparecchiature elettriche ed elettroniche"
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiatureelettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessicon la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

6.5. Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie – Action Plan

C2 – 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.1.2 – Grandi Apparecchiature Sanitarie

OBIETTIVO PNRR

TARGET EU	**3.100** grandi apparecchiature sanitarie
TARGET MASSIMO (definito a livello nazionale)	**3.133** grandi apparecchiature sanitarie
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce all'ammodernamento digitale del parco tecnologico ospedaliero tramite la sostituzione di modelli obsoleti con modelli tecnologicamente avanzati.
REQUISITI CID TARGET M6C2 6	In base a una ricognizione condotta dal Ministero della Salute, il fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie è stato individuato in 3 133 unità da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5anni). Il numero e le tipologie delle apparecchiature che devono essere sostituite sono: 340 TAC a 128 strati, 190 risonanze magnetiche 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET TAC, 295 mammografi, 928 ecotomografi.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione ha il fondamentale obiettivo di garantire l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, per il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche, al fine di conseguire una migliore efficienza dei livelli assistenziali e di adeguare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali ▪ La Regione ha individuato 11 interventi di digitalizzazione di strutture sanitarie sede di DEA I e II livello, analizzando il fabbisogno di ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale (SSR) finalizzato alla digitalizzazione dei DEA di I e II livello. La Regione e le Aziende, di concerto con il Ministero della Salute, hanno individuato le modalità di approvvigionamento (gare Consip), attraverso un format semplificato predisposto da CONSIP ▪ La Regione e le Aziende hanno proceduto ad elaborare le schede intervento, come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno delle Aziende (DCA 16/2022) con riferimento al presente investimento. ▪ Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. inquadramento programmatico, aspetti giuridico-amministrativi relativi alla appaltabilità dell'intervento, elementi progettuali e stato di attuazione attuale/previsto quadro economico del progetto). ▪ La Regione e le Aziende del SSR ricorrono ad accordi quadro con Consip opportunamente indicati nelle schede di intervento.

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione e le Aziende del SSR hanno dettagliato le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento definite nelle schede di intervento ▪ Relativamente a questo sub-investimento le Aziende non hanno evidenziato un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE	[286]
TARGET MASSIMO REGIONALE	[286]
FABBISOGNO	Il fabbisogno dichiarato dalla Regione in termini di numerosità di apparecchiature, dettagliato per tipologia e per Ente del SSR. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	TAC	RMN	ACC. LIN.	SIST. RAD.	ANG.	G.C.	MAMM.	G.C./TAC	PET/TAC	ECOT.	ULTER. APPAR.	Totale
ASP Cosenza	*3*	*2*	*0*	*0*	*2*	*0*	*4*	*0*	*0*	*39*	*18*	*68*
ASP Crotone	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*13*	*2*	*19*
ASP Catanzaro	*0*	*0*	*0*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14*	*6*	*24*
ASP Vibo Valentia	*0*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*16*	*4*	*27*
ASP Reggio Calabria	*0*	*0*	*0*	*4*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*36*	*7*	*49*
AO Cosenza	*1*	*0*	*0*	*3*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*15*	*3*	*23*
AO Catanzaro	*2*	*0*	*1*	*2*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*10*	*4*	*21*
AOU Catanzaro	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10*	*4*	*16*
GOM Reggio Calabria	*2*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*29*	*2*	*39*
Totale	***9***	***2***	***1***	***26***	***3***	***1***	**12**	***0***	***0***	***182***	***50***	***286***

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata a 128 strati; RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 T; Acc. Lin: Acceleratori Lineari; Sis. Rad.: Sistema Radiologico Fisso; ANG.: Angiografi; G.C.: Gamma Camera; Mamm.: Mammografi; PET: Tomografia a emissione di positroni; Ecot.: Ecotomografi.

IMPORTO ASSEGNATO	Importo assegnato alla regione dal PNRR: 44.753.062,11€ Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 44.753.062,00€

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO PER TIPOLOGIA

Regione	TAC	RMN	ACC. LIN.	SIST. RAD.	ANG.	G.C.	MAMM.	G.C./TAC	PET/TAC	ECOT.	ULTER. APPAR.
Numero Apparecchiature	***9***	***2***	***1***	***26***	***3***	***1***	**12**	***0***	***0***	***182***	***50***
Acquisizione tramite procedura centralizzata Consip	*8*	*2*	*1*	*26*	*2*	*1*	12	*0*	*0*	*182*	*50*
Acquisizione tramite iniziativa centralizzata Consip già attiva	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Procedura di gara autonoma per l'affidamento della fornitura già espletata	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Procedura di gara autonoma per l'affidamento della fornitura da espletare	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata a 128 strati; RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 T; Acc. Lin: Acceleratori Lineari; Sis. Rad.: Sistema Radiologico Fisso; ANG.: Angiografi; G.C.: Gamma Camera; Mamm.: Mammografi; PET: Tomografia a emissione di positroni; Ecot.: Ecotomografi.

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature	T4 2022	
Target	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	T4 2024	

GANTT

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale per la dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.1.2.

(tabella non modificabile da regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegna [€]	
PNRR -Innovazione, ricerca digitalizzazione dell'assistenza sanitaria									Green	Digi
M6C2	**1.1**	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero**								
	1.1.2	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)**	**€ 44.753.062,11**	**€ 44.753.062,00**	093 - Attrezzature sanitarie	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il citato Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.1.2 è riportato è riportato nella tabella 8 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

6.6 Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

OBIETTIVO PNRR	
TARGET EU	**7.700 Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva (3.500 posti letto di terapia intensiva e 4.200 posti letto di terapia semi-intensiva)**
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.
REQUISITI CID TARGET M6 C2 9	La dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva e 4.200 posti letto di terapia semi-intensiva con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa strutturale (pari a un aumento di circa il 70 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia).

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE POSTI LETTO

Regione	Totale risorse assegnate	P.L. Terapia Intensiva autorizzati da MdS	P.L. Terapia Semi - Intensiva autorizzati da MdS
Piemonte	111.222.717 €	299	305
Valle d'Aosta	3.038.688 €	10	9
Lombardia	225.345.817 €	585	704
PA di Bolzano	14.344.710 €	40	37
PA di Trento	16.269.428 €	46	38
Veneto	101.544.271 €	211	343
Friuli Venezia Giulia	25.703.911 €	55	85
Liguria	28.893.350 €	87	118
Emilia Romagna	95.040.697 €	197	312
Toscana	79.367.367 €	193	261
Umbria	24.180.508 €	58	62
Marche	39.790.608 €	105	107
Lazio	118.561.444 €	282	412
Abruzzo	29.047.242 €	66	92
Molise	6.970.569 €	14	21
Campania	163.813.544 €	499	406
Puglia	99.866.963 €	276	285
Basilicata	13.545.322 €	32	40
Calabria	51.171.973 €	134	136
Sicilia	123.309.660 €	301	350
Sardegna	42.116.211 €	101	115
Totale	**1.413.145.000 €**	**3.591**	**4.238**

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ Il Ministero della Salute ha adottato con Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 il "Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane", relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all'art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in attuazione a quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia per la Linea di Intervento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", inserita nella MISSIONE 6 COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. ▪ Le risorse sono altresì finalizzate al rafforzamento strutturale degli ospedali SSN, attraverso un piano di riorganizzazione al fine di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche (rinnovare e ristrutturare 651 strutture tra PS, DEA, strutture di supporto ospedaliero e territoriale). ▪ La Regione Calabria ha approvato il Piano di riorganizzazione delle terapie intensive e semintensive con DCA 91 del 18.6. 2020 "Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 2 - Documento di riordino della Rete Ospedaliera". Il Piano di riorganizzazione è volto a garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del DL 34/2020. ▪ La Regione Calabria ha rimodulato il numero dei posti letto di terapia semi-intensiva consentendo l'attivazione di 136 pi di terapia semintensiva con DCA n. 104 del 29.7.2020 "DCA n. 91 del 18 giugno 2020 avente ad oggetto:" Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 -Art. 2 -Documento di riordino della Rete Ospedaliera in Emergenza COVID-19" -Rettifica". ▪ La Regione e le Aziende del SSR hanno stabilito per l'investimento in oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento che, qualora già disponibili, si dettagliano di seguito: Accordi Quadro di INVITALIA per la progettazione, la verifica, l'esecuzione dei lavori ed il collaudo.
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione Calabria ha dettagliato nel DCA n, 91 del 18.6. 2020 "Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 -Art. 2 - Documento di riordino della Rete Ospedaliera" e nel DCA n.104 29.7.2020 "DCA n. 91 del 18 giugno 2020 avente ad oggetto:" Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 -Art. 2 -Documento di riordino della Rete Ospedaliera in Emergenza COVID-19" -Rettifica", le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento. ▪ Nel caso in cui si evidenziasse un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione Calabria dovrà indicare le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE	[134] PL TERAPIA INTENSIVA [136] PL TERAPIA SUB-INTENSIVA [17] INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PERCORSI PS su 16 stabilimenti
IMPORTO ASSEGNATO	Importo assegnato alla Regione dal PNRR: € 51.171.973,00 Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 51.171.973,00

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	45% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva	T4 2024	
Target	45% degli interventi di ristrutturazione dei percorsi PS	T4 2024	
Target	7700 Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva 3 500 posti letto di terapia intensiva e 4 200 posti letto di terapia semi-intensiva	T2 2026	
Target	Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di Ammissione - Livello I e II) – 651 interventi di ristrutturazione dei percorsi PS	T2 2026	

GANTT

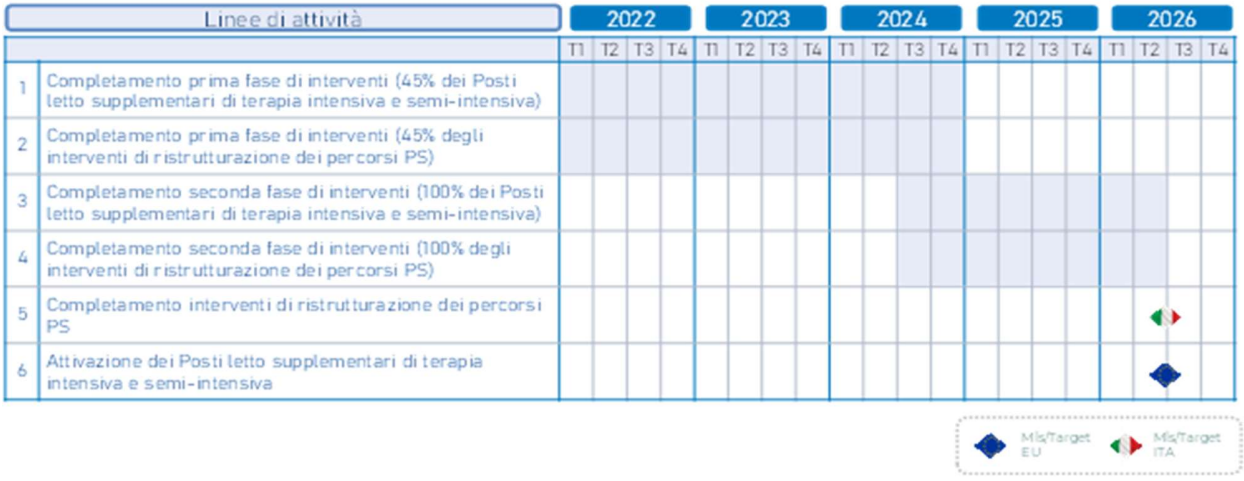

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);*
- *DD n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 e Piano di riorganizzazione di Riorganizzazione e rafforzamento Terapie Intensive e Semi Intensive (allegato al Decreto direttoriale);*
- *Dlgs. 50/2016*
- *DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- *DCA 91 del 18.6. 2020 "Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 -Art. 2 - Documento di riordino della Rete Ospedaliera".*
- *DCA n. 104 del 29.7.2020 DCA n. 91 del 18 giugno 2020 avente ad oggetto:" Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 -Art. 2 - Documento di riordino della Rete Ospedaliera in Emergenza COVID-19" -Rettifica"*
- *Accordo sul Piano di Rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della Salute, quello dell'Economia e della Finanze e il presidente p.t. Della Regione Calabria in data17.12.2009 e poi recepito con DGR n.97 del 12..2.2010*
- *Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF),*

- *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 6*
- *Decreto 06 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 229 del 24 settembre 2021, che prevede , in particolare, alla Missione 6, Componente 2, l 'Investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", suddiviso nei due sub-investimenti:*
  - *Investimento 1.1.1 "Digitalizzazione "con uno stanziamento complessivo di € 1.450.110.000,00, al netto dei progetti già in essere;*
  - *Investimento 1.1.2 "Grandi Apparecchiature' ', con uno stanziamento complessivo di € 1.189.155.000*
- *Decreto del Ministero della Salute 20 gennaio 2022 recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Provincie Autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasmesso dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha attribuito alla Regione Calabria gli importi:*
  - *di € 54.573.930,99, a valere sulla Missione 6, Componente 2 Sub-Investimento 1.1.1, per la realizzazione di n° 11 interventi di digitalizzazione;*
  - *di € 44.753.062 ,11, a valere sulla Missione 6, Componente 2, Sub-Investimento 1.1.2, per la fornitura e posa in opera di n° 286 grandi apparecchiature;*
- *Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Deliberazione consiglio dei ministri 4 Novembre 2021 con la quale il Presidente della Giunte regionale della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario in Regione Calabria, secondo i programmi operativi di cui all'art.2, comma 88, della legge n.192 del 2009, ivi ricomprendendo la gestione dell'emergenza pandemica;*
- *Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021*
- *Legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 "Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere" e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)", ed in particolare il TITOLO II, recante "Disposizioni in materia sanitaria";*
- *Regione Calabria DCA n.8 del 10/02/2022*
- *Regione Calabria DCA n.9 del 14/02/2022*
- *Regione Calabria Decreto del Commissario ad Acta 5 luglio 2016, n. 64 "Programma operativo 2016/2018 - Riorganizzazione della Rete Ospedaliera";*
- *Regione Calabria DCA n.16 del 2022 Approvazione della proposta di piano degli interventi previsti nella Regione Calabria del PNRR Missione 6 componente 2 Investimento 1.1*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.1.1.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Innovazione, ricerca digitalizzazione dell'assistenza sanitaria									**Green**	**Digital**
M6C2	**1.1**	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero**								
	1.1.1	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Progetti in essere**	**51.171.973 €**	**51.171.973 €**	093 - Attrezzature sanitarie	0%	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	100%	-	**51.171.973 €**

La Regione s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale)indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH.

Nello specifico, le schede di riferimento, previste all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

6.7. Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR) – Action Plan

C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR

OBIETTIVO PNRR

TARGET EU	**109** interventi strutturali
TARGET MASSIMO	**(definito a livello nazionale)**
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consiste nell'allineare le strutture ospedaliere alle normative antisismiche. L'investimento si riferisce in particolare agli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento delle strutture ospedaliere individuate nell'indagine delle esigenze espresse dalle Regioni
REQUISITI CID TARGET M6C2 10	Completamento di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere, al fine di allinearle alle norme antisismiche

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione - allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione al fine di garantire l'adeguamento sismico di presidi ospedalieri, attualmente in esercizio, che versano in situazioni di grave criticità strutturale, in un contesto geologico come quello della regione Calabria, caratterizzata da una sismicità tra le più diffuse ed elevate nel panorama nazionale ha effettuato una puntuale ricognizione degli interventi di adeguamento strutturale, individuando per ciascun intervento la fase progettuale prevista per anno, approvata con DCA n.9 del 14.2.2022. ▪ La Regione ha proceduto ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno con riferimento al presente investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). ▪ Con Deliberazione n. 483 del 22.11.2021 si è individuata la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria quale "ufficio" dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR. ▪ Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi nel presente Piano, la Regione Calabria intende avvalersi della previsione normativa dell'art.10 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che prevede la possibilità, mediante apposite convenzioni, di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (INVITALIA, CONSIP).
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione ha dettagliato le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e ha definito gli oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 ▪ Le schede di intervento del presente Action Plan evidenziano un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento; la Regione Calabria farà ricorso a risorse integrative di finanziamento regionali nell'ambito delle disponibilità

che verranno reperite in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 30 aprile 2022 e con le modalità stabilite dall'art. 56 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato da PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE [6 interventi]

TARGET MASSIMO REGIONALE [6 interventi]

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione Calabria in termini di numerosità di interventi, dettagliato per Ente del SSR e per stato di avanzamento del progetto. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	Titolo intervento	Dati immobile		Interventi	
		Superficie	Posti letto	Cat. Zona sismica	Livello progettazione
ASP REGGIO CALABRIA	*OSPEDALE GENERALE "GIOVANNI XXIII°"*	*5800*	*65*	*1*	*STUDIO DI FATTIBILITÀ*
GOM "BIANCHI-MELACRINO MORELLI" REGGIO CALABRIA	*GOM "BIANCHI-MELACRINO MORELLI" REGGIO CALABRIA*	*4836*	*95*	*1*	*STUDIO DI FATTIBILITÀ*
AO "ANNUNZIATA" COSENZA	*AO "ANNUNZIATA" COSENZA*	*4594*	*29*	*1*	*PROGETTAZIONE DA AVVIARE*
AO "PUGLIESE CIACCIO" CATANZARO	*AO "PUGLIESE CIACCIO" CATANZARO*	*4500*	*33*	*2*	*PROGETTAZIONE DA AVVIARE*
ASP VIBO VALENTIA	*PO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA*	*13500*	*163*	*1*	*PROGETTAZIONE DA AVVIARE*
AO "PUGLIESE CIACCIO" CATANZARO	*AO "PUGLIESE CIACCIO" CATANZARO*	*3200*	*0*	*2*	*PROGETTAZIONE DA AVVIARE*

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla regione dal PNRR: € 24.042.738,10

Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 24.042.738,00
Importo integrativo regionale (DGR 174/2022) per efficientamento energetico: € 10.804.608,00

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione procedure di gara per interventi antisismici	T1 2023	
Target	Completamento degli interventi antisismici nelle strutture	T2 2026	

GANTT

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 "Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere" e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)", ed in particolare il TITOLO II, recante "Disposizioni in materia sanitaria";*
- *Regione Calabria Decreto del Commissario ad Acta 5 luglio 2016, n. 64 "Programma operativo 2016/2018 - Riorganizzazione della Rete Ospedaliera";*
- *Regione Calabria DCA n.8 del 10/02/2022*
- *Regione Calabria DCA n.9 del 14/02/2022*
- *Regione Calabria DCA n.16 del 02/03/2022*
- *DGR n. 174 del 30 aprile 2022*

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” e quella “digital” all'investimento 1.2.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Innovazione, ricerca digitalizzazione dell'assistenza sanitaria									**Green**	**Digital**
M6C2	**1.2**	**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**	**24.042.738,10**	**24.042.738,00**	092 - Infrastrutture per la sanità	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.2è riportato nella tabella 9 dell'Allegato 3alpresente Piano.

La Regione Calabria, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 "Costruzione di nuovi edifici";
- scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario".

6.8. Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC) – Action Plan

C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC

OBIETTIVO PNC

TARGET NAZIONALE	**220** interventi strutturali
DESCRIZIONE DECRETO MEF DEL 15/07/2021	Adattare le strutture ospedaliere alle attuali normative antisismiche. L'obiettivo del progetto è la realizzazione di 220 interventi, finanziati con le risorse del Fondo Complementare.
RISULTATI FINALI	Completamento di220 interventi finalizzati al miglioramento strutturale degli edifici ospedalieri in ottica di adeguamento alle vigenti norme in materia di costruzioni in area sismica.

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione al fine di garantire l'adeguamento sismico di presidi ospedalieri, attualmente in esercizio, che versano in situazioni di grave criticità strutturale, in un contesto geologico come quello della regione Calabria, caratterizzata da una sismicità tra le più diffuse ed elevate nel panorama nazionale ha effettuato una puntuale ricognizione degli interventi di adeguamento strutturale, individuando per ciascun intervento la fase progettuale prevista per anno, approvata con DCA n.9 del 14.2.2022. ▪ La Regione ha proceduto ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno con riferimento al presente investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). ▪ Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi nel presente Piano, la Regione Calabria intende avvalersi della previsione normativa dell'art.10 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che prevede la possibilità, mediante apposite convenzioni, di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (INVITALIA, CONSIP).
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione Calabria ha dettagliato le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022. ▪ Le schede di intervento del presente Action Plan non evidenziano un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNC assegnate per la linea di investimento, ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNC ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNC che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNC.

OBIETTIVI REGIONALI

OBIETTIVOREGIONALE [7 interventi]

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione Calabria in termini di numerosità di interventi, dettagliato per Ente del SSR e per stato di avanzamento del progetto. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	Titolo Intervento	Dati immobile		Interventi	
		Superficie	Posti letto	Cat. Zona sismica	Livello progettazione
AO "ANNUNZIATA" COSENZA	*AO "ANNUNZIATA" COSENZA EDIFICIO 1939*	*24719*	*261*	*1*	*PROGETTAZIONE DA AVVIARE*
AO "ANNUNZIATA" COSENZA	*AO "ANNUNZIATA" COSENZA EDIFICIO MALATTIE INFETTIVE*	*6403*	*17*	*1*	*PROGETTAZIONE DA AVVIARE*
ASP COSENZA	*PO DI S. GIOVANNI IN FIORE*	*9525*	*51*	*1*	*PROGETTAZIONE DA AVVIARE*
ASP CATANZARO	*PO DI SOVERATO*	*11100*	*87*	*1*	*PROGETTAZIONE DA AVVIARE*
ASP CATANZARO	*PO DI LAMEZIA TERME*	*36024*	*216*	*1*	*PROGETTAZIONE DA AVVIARE*
ASP COSENZA	*PO DI TREBISACCE*	*2350*	*26*	*2*	*PROGETTAZIONE DA AVVIARE*
ASP COSENZA	*PO DI PRAIA A MARE*	*9300*		*2*	*PROGETTAZIONE DA AVVIARE*

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla regione dal PNC: € 54.569.791,21

Importo degli interventi a valere su risorse PNRR: € 54.569.789,00

CRONOPROGRAMMA

OBIETTIVI PREVISTI DA DM MEF 15/07/2021 E RELATIVO TERMINE DI ESECUZIONE REGIONALE

Obiettivi	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Ente preposto al controllo
Obiettivi intermedi	Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN	T1 2023	
Obiettivi intermedi	Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN	T3 2023	
Obiettivi intermedi	Avvio dei Lavori da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN	T4 2023	
Obiettivi finali	Ultimazione dei lavori – Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche	T2 2026	

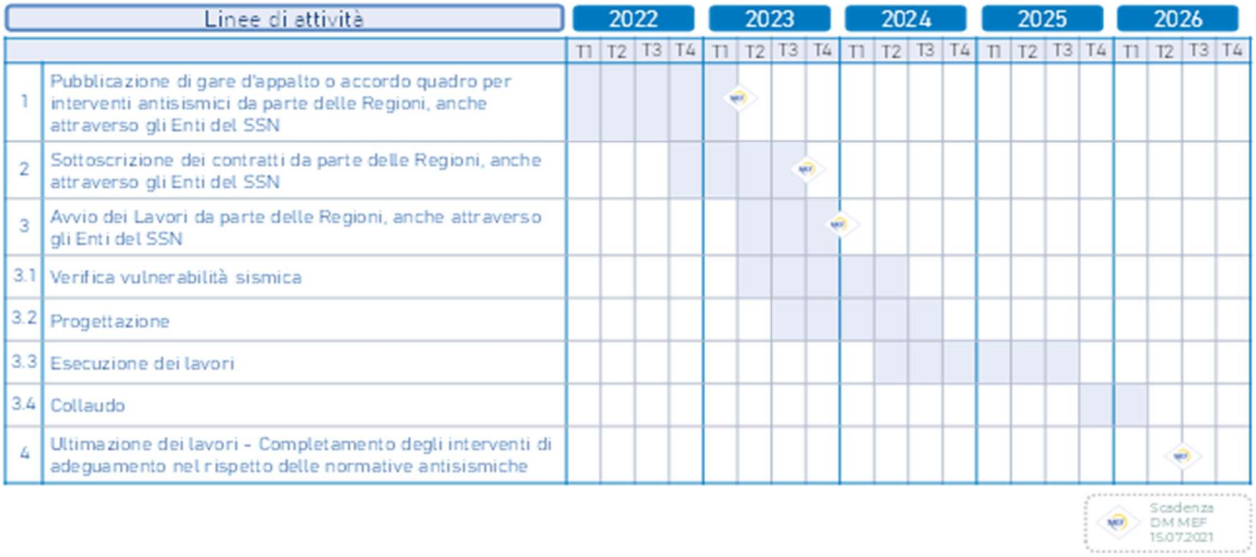

GANTT

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 "Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere" e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)", ed in particolare il TITOLO II, recante "Disposizioni in materia sanitaria";*
- *Regione Calabria Decreto del Commissario ad Acta 5 luglio 2016, n. 64 "Programma operativo 2016/2018 - Riorganizzazione della Rete Ospedaliera";*
- *Regione Calabria DCA n.8 del 10/02/2022*
- *Regione Calabria DCA n.9 del 14/02/2022*

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”

Non applicabile alla linea d’intervento di carattere nazionale.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.2è riportato nella tabella 9 dell’Allegato 3 al presente Piano.

La Regione, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 “Costruzione di nuovi edifici”;
- scheda 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”;
- scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”.

6.9. Componente 2 –Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" – Action Plan

C2 – 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome"

OBIETTIVO PNRR	
TARGET EU	**85%** dei medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico **21** Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico
DESCRIZIONE CID	Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano. L'investimento si compone dei due diversi progetti di seguito descritti. 1. Il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente. Ciò deve essere conseguito rendendolo un ambiente di dati completamente nativi digitali e quindi omogeneo, coerente e portabile in tutto il territorio nazionale. 2. Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico. L'obiettivo chiave e primario del Ministero della Salute italiano è conseguito con il raggiungimento dei 4 sotto-obiettivi seguenti integrati tra loro: i) il potenziamento dell'infrastruttura del Ministero della Salute italiano, mediante l'integrazione dei dati clinici del FSE con i dati clinici, amministrativi e finanziari del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e con le altre informazioni e gli altri dati relativi alla salute nell'ambito dell'approccio "*One-Health*" per monitorare i LEA e garantire le attività di sorveglianza e vigilanza sanitaria; ii) il miglioramento della raccolta, del processo e della produzione di dati NSIS a livello locale, mediante la reingegnerizzazione e la standardizzazione dei processi regionali e locali di produzione di dati, al fine di ottimizzare lo strumento del NSIS per la misurazione della qualità, dell'efficienza e dell'adeguatezza del SSN; iii) lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata per studiare fenomeni complessi e scenari predittivi al fine di migliorare la capacità di programmare i servizi sanitari e rilevare malattie emergenti; iv) la creazione di una piattaforma nazionale dove domanda ed offerta di servizi di telemedicina forniti da soggetti accreditati possano incontrarsi.
DESCRIZIONE SUB LINEA DI INTERVENTO OGGETTODELL'ACTION PLAN	L'investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1) si compone delle seguenti linee di attività relative a: a) repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly; b) adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome; c) utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica, e che quest'ultima si riferisce a progetti già in essere. In particolare, il presente Action Plan si riferisce al sub-intervento 1.3.1 (b) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome, il cui Soggetto attuatore, con

	facoltà di sub-delega in favore delle Regioni, è la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale.
REQUISITI CID TARGET M6 C2 13	Tutte le Regioni/Province autonome devono creare, alimentare e utilizzare il FSE. In particolare il piano prevede: - l'integrazione/inserimento dei documenti nel FSE deve iniziare dai documenti nativi digitali; la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; - il sostegno finanziario a favore delle strutture sanitarie, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza.
REQUISITI CID TARGETM6 C2 11	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.

Ciascuna Regione/Provincia autonoma contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati – per l'intervento FSE.	▪ Numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo..	▪ Semestrale

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ È prevista l'attivazione delle procedure per la realizzazione dell'archivio centrale (Repository centrale) - Fascicolo sanitario elettronico (FSE), da parte del Soggetto Attuatore (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale). ▪ È prevista l'attivazione delle attività per il supporto organizzativo, manageriale, strategico, tematico e la formazione a livello regionale e locale, da parte del Soggetto Attuatore (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale). ▪ È prevista la realizzazione, implementazione e messa in funzione di un registro centrale per i documenti digitali e di una piattaforma di interoperabilità e servizi, secondo lo standard Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) - Fascicolo sanitario elettronico da parte del Soggetto Attuatore (MEF – Sistema Tessera Sanitaria) ▪ La Regione sulla base dei decreti e delle linee guida nazionali che saranno emanate per il potenziamento del FSE, ai sensi della normativa vigente, predisporrà i piani regionali di adeguamento definendo le seguenti azioni: o Stabilire le strategie di coinvolgimento degli operatori (MMG, PLS, Farmacie) nel percorso di potenziamento del fascicolo; o Creare le condizioni affinché il FSE possa essere alimentato in modo completo, corretto e continuativo dalle strutture che producono i documenti, gestendo in modo coordinato il percorso di adeguamento tecnico ed organizzativo delle strutture stesse; o Coordinare le attività di promozione e formazione rivolte ai cittadini e agli operatori sanitari. ▪ Con decreto da pubblicare non oltre settembre 2022, saranno dettagliate le milestone e i target intermedi a livello regionale, nonché le risorse disponibili per ogni Regione/Provincia Autonoma per l'adeguamento dell'FSE e l'attuazione delle Linee Guida nazionali di cui al punto precedente, garantendo almeno il 40% alle regioni del sud ▪ La regione Calabria che sulla base del piano regionale e delle risorse stabilite con decreto, interverrà autonomamente nel potenziamento, dovrà comunicare periodicamente lo stato di avanzamento in base agli indicatori stabiliti con le Linee Guida nazionali e comunicherà al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Struttura della Presidenza del Consiglio responsabile per l'innovazione tecnologica e la struttura di gitale per coordinare il piano regionale e il raggiungimento di target e milestone intermedi di cui al secondo punto. ▪ Successivamente al riparto regionale delle risorse sarà previsto supporto operativo alle Regioni per il completamento e l'implementazione dei sistemi produttori ospedalieri, di MMG e PLS per aumentare l'indicizzazione e per formazione e supporto agli operatori sanitari con le competenze digitali necessarie per utilizzare e alimentare il FSE nelle sue potenzialità.
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione Calabria dettaglierà le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definirà eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR, stabilite con decreto di cui al paragrafo precedente, ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR che costituisce e importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE	85% dei medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico Adozione, alimentazione e utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico
FABBISOGNO	Il Fabbisogno sarà determinato sulla base del completamento dell'Assessment e indicato nel Decreto di ripartizione delle risorse destinate al sub-investimento, che sarà emanato non oltre settembre 2022
IMPORTO COMPLESSIVO A LIVELLO NAZIONALE OGGETTO DEL SUCCESSIVO DECRETO DI RIPARTIZIONE REGIONALE (Sub intervento (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni")	€ 610.389.999,93

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Cut off per digitalizzazione nativa di tutti i documenti dei FSE. I documenti devono essere nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i recenti standard FHIR.	T4 2024	
Target	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%)	T4 2025	
Target	Tutte le Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico	T2 2026	

GANTT

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *DPCM n.178 del 29 settembre 2015 "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico"*
- *DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, Art.21 recante: "Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale*
- *Accordo sul Piano di Rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della Salute, quello dell'Economia e della Finanze e il presidente p.t. Della Regione Calabria in data17.12.2009 e poi recepito con DGR n.97 del 12..2.2010*
- *il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF),*
- *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 6*
- *decreto 06 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 229 del 24 settembre 2021, che prevede , in particolare, alla Missione 6, Componente 2, l 'Investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", suddiviso nei due sub-investimenti:*
  - ✓ *Investimento 1.1.1 "Digitalizzazione", con uno stanziamento complessivo di € 1.450.110.000,00, al netto dei progetti già in essere;*
  - ✓ *Investimento 1.1.2 "Grandi Apparecchiature' ', con uno stanziamento complessivo di € 1.189.155.000*
- *schema di decreto del Ministero della Salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Provincie Autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasmesso dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha attribuito alla Regione Calabria gli importi:*
  - *di € 54.573.930,99, a valere sulla Missione 6, Componente 2, Sub-Investimento 1.1.1, per la realizzazione di n° 11 interventi di digitalizzazione;*
  - *di € 44.753.062,11, a valere sulla Missione 6, Componente 2, Sub-Investimento 1.1.2, per la fornitura e posa in opera di n° 286 grandi apparecchiature;*
- *Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *deliberazione consiglio dei ministri 4 Novembre 2021 con la quale il Presidente della Giunte regionale della Regione Calabria Dè stato nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario in Regione Calabria, secondo i programmi operativi di cui all'art.2, comma 88, della legge n.192 del 2009, ivi ricomprendendo la gestione dell'emergenza pandemica;*
- *DCA 10 marzo 2020 n. 65 Programma operativo 2019/2021 - Riorganizzazione della Rete Territoriale*
- *Legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 "Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere" e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)", ed in particolare il TITOLO II, recante "Disposizioni in materia sanitaria";*
- *Regione Calabria Decreto del Commissario ad Acta 10 marzo 2020, n. 65 "Programma operativo 2019/2021 - Riorganizzazione della Rete Territoriale";*
- *Regione Calabria DCA n.138 del 31/12/2021*
- *Regione Calabria DCA n.8 del 10/02/2022*
- *Regione Calabria DCA n.9 del 14/02/2022*
- *Regione Calabria DCA n.15 del 01/03/2022*
- *Regione Calabria DCA n.16 del 02/03/2022*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.3.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C1	**1.3**	**Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione**	**importo Regionale per l'investimento**	**[inserire 100% dell'importo regionale]**	095 – Digitalizzazione delle cure sanitarie	0%	095 – Digitalizzazione delle cure sanitarie	100%		**100% della quota assegnata tagging**

La Regione s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale)indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DSNH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.3 è riportato nella tabella 10 dell'Allegato 3alpresente Piano.

La Regione Calabria Autonoma nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

6.10. Componente 2 –Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK…) – Action Plan

C2 – 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione

Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali

OBIETTIVO PNRR	
TARGET NAZIONALE	4 nuovi flussi informativi nazionali
DESCRIZIONE CID	Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano. Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico.
REQUISITI TARGET M6 C2 10	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: riabilitazione territoriale e consultori familiari.
REQUISITI TARGET M6 C2 15	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione al fine di fornire specifici contributi ai Gruppi di Lavoro istituiti a livello nazionale per la definizione dei nuovi flussi informativi sanitari, procede ad effettuare un'apposita attività di analisi volta ad individuare gli eventuali gap funzionali ed informativi per singolo flusso. ▪ La Regione procederà a pianificare gli interventi tecnologici ed organizzativi necessari all'adeguamento informativo/funzionale: ▪ La Regione a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute del DM recante il regolamento del flusso, procederà al recepimento (adozione) dell'articolato DM tramite apposito atto normativo. ▪ La Regione, nell'ambito della fase di implementazione dei flussi definiti a livello nazionale, procederà a definire i parametri di controllo al fine di verificare i flussi prodotti a livello aziendale prima della trasmissione al Ministero della salute. ▪ La Regione e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR)hanno stabilito per l'investimento in oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5 comma 3 del Contratto Istituzionale di Sviluppo).
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione Calabria dettaglierà le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definirà eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022. ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE	4 nuovi flussi informativi (riabilitazione territoriale, consultori familiari, ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria)
FABBISOGNO	[N/A]
IMPORTO ASSEGNATO	Importo assegnato alla Regione Calabria: € 1.140.320,46

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: riabilitazione territoriale e consultori familiari	T1 2023	
Target	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria. .	T1 2025	

GANTT

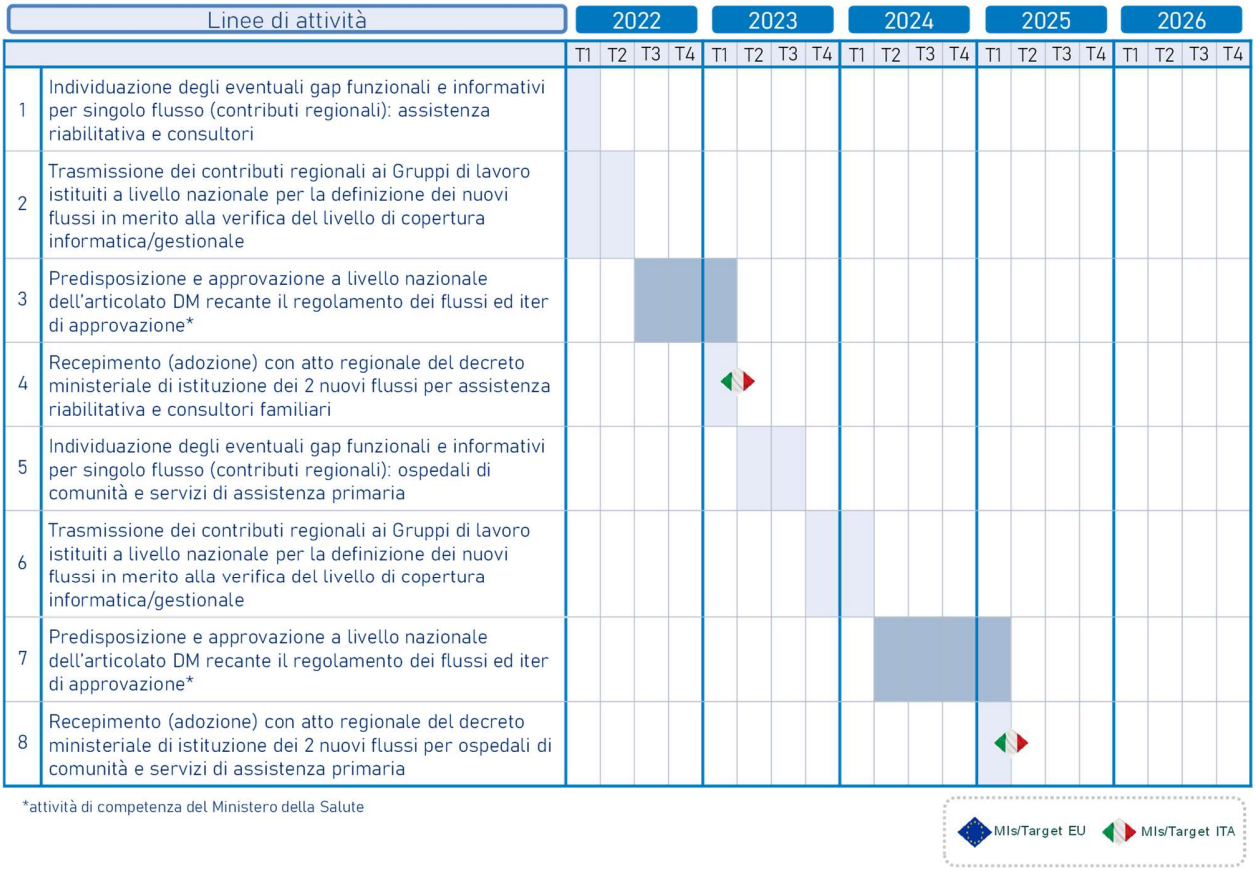

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 "Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere" e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)", ed in particolare il TITOLO II, recante "Disposizioni in materia sanitaria";*
- *Regione Calabria Decreto del Commissario ad Acta 5 luglio 2016, n. 64 "Programma operativo 2016/2018 - Riorganizzazione della Rete Ospedaliera";*

- *Regione Calabria Decreto del Commissario ad Acta 10 marzo 2020, n. 65 "Programma operativo 2019/2021 - Riorganizzazione della Rete Territoriale";*
- *Regione Calabria DCA n.138 del 31/12/2021*
- *Regione Calabria DCA n.8 del 10/02/2022*
- *Regione Calabria DCA n.9 del 14/02/2022*
- *Regione Calabria DCA n.15 del 01/03/2022*
- *Regione Calabria DCA n.16 del 02/03/2022*
- *Accordo sul Piano di Rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della Salute, quello dell'Economia e della Finanze e il presidente p.t. Della Regione Calabria in data17.12.2009 e poi recepito con DGR n.97 del 12.2.2010*
- *il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF)*
- *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 6*
- *decreto 06 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 229 del 24 settembre 2021, che prevede , in particolare, alla Missione 6, Componente 2, l 'Investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", suddiviso nei due sub-investimenti:*
  - ✓ *Investimento 1.1.1 "Digitalizzazione "con uno stanziamento complessivo di € 1.450.110.000,00, al netto dei progetti già in essere;*
  - ✓ *Investimento 1.1.2 "Grandi Apparecchiature' ', con uno stanziamento complessivo di € 1.189.155.000*
- *schema di decreto del Ministero della Salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Provincie Autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasmesso dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha attribuito alla Regione Calabria gli importi:*
  - *di € 54.573.930,99, a valere sulla Missione 6, Componente 2, Sub-Investimento 1.1.1, per la realizzazione di n° 11 interventi di digitalizzazione;*
  - *di € 44.753.062, 11, a valere sulla Missione 6, Componente 2, Sub-Investimento 1.1.2, per la fornitura e posa in opera di n° 286 grandi apparecchiature;*
- *Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *deliberazione consiglio dei ministri 4 Novembre 2021 con la quale il Presidente della Giunte regionale della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario in Regione Calabria, secondo i programmi operativi di cui all'art.2, comma 88, della legge n.192 del 2009, ivi ricomprendendo la gestione dell'emergenza pandemica;*
- *DCA 10 marzo 2020 n. 65 Programma operativo 2019/2021 - Riorganizzazione della Rete Territoriale;*
- *delibera n. 769 del 20/10/2008, Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR);*
- *POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, Asse Prioritario 2 "Sviluppo dell'Agenda Digitale (OT2 FESR), Obiettivo Specifico 2.2, digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia);*
- *DPGR 201 del 22 settembre 2011, il documento recante la Direttiva sui Flussi regionali denominata "Sistema Informativo Sanitario – Mappa dei flussi informativi".*

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” e quella “digital” all'investimento 1.3.2.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C2	**1.3**	**Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione**	**1.140.320,46**	**1.140.320,46**	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	0%	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	100%		**1.140.320,46**

La Regione s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale)indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DSNH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.3 è riportato nella tabella 10 dell'Allegato 3alpresente Piano.

La Regione nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

6.11. Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di medicina generale -Action Plan

C2 – 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale

OBIETTIVI NAZIONALI	
TARGET EUROPEO	Assegnazionedi **2.700** borse di studio per la formazione specifica in medicina generale
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consiste nell'incrementare le borse di studio per il corso specifico di medicina generale.
REQUISITI CID TARGET M6 C2 14	Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimentotriennali.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione – per gli interventi riferiti alla formazione in infezioni ospedaliere.	▪ L'indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l'impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell'ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. L'indicatore è pertanto rilevato e comunicato indicando i) i partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. È inoltre disaggregato per genere ed età. ▪ I partecipanti sono conteggiati all'inizio della loro partecipazione all'attività di istruzione o formazione.	▪ Semestrale

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	Per ciascun triennio formativo (2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026) nel rispetto delle istruzioni tecniche e delle indicazioni operative fornite dal Ministero della salute, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze: ▪ La Commissione Salute definisce il fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio specifico. Il Coordinamento regionale trasmette tale fabbisogno al Ministero della Salute. ▪ Il Ministero della Salute effettua il riparto delle risorse per il finanziamento delle borse aggiuntive per il corso di formazione specifica in medicina generale per il medesimo triennio. ▪ La Commissione Salute decide la data del concorso nazionale per accedere ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Vengono quindi pubblicati i bandi regionali e successivamente svolto il concorso nazionale nella data stabilita. ▪ Viene pubblicata la graduatoria definitiva del concorso, ogni Regione predispone l'elenco degli assegnatari di borsa e comunica la data di inizio corso. ▪ Le Regioni assegnano le borse e trasmettono al Ministero della Salute, anche attraverso l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR , entro il 1 giugno di ogni anno, la documentazione necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione, con riferimento a tutte le borse assegnate per il triennio formativo ed in particolare l'elenco degli assegnatari di borsa e l'elenco degli iscritti al Corso di formazione specifica in Medicina Generale. ▪ Le regioni provvedono ad aggiornare costantemente i dati inseriti nel sistema informatico predetto al fine di garantire il necessario per il monitoraggio e la rendicontazione.
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle voci di costo dell'investimento nel rispetto delle linee guida e delle indicazioni operative fornite dal Ministero della salute, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE	Definito con Decreto del Ministero della Salute **(34)**
IMPORTO ASSEGNATO	DM del 2 novembre 2021 con il quale sono state assegnate alle Regioni e Province Autonome le risorse per il finanziamento delle prime 900 borse aggiuntive relative al triennio formativo 2021-2024. Tale decreto è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti con Provv. n.2963 del 07/12/2021

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione di 900 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio formativo 2021-2024	T2 2022	
Milestone	Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di Medicina Generale	T4 2022	
Target	Assegnazione di 1800 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024 e 2022-2025.	T2 2023	
Milestone	Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di Medicina Generale	T4 2023	
Target	Assegnazione di 2700 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026.	T2 2024	

GANTT

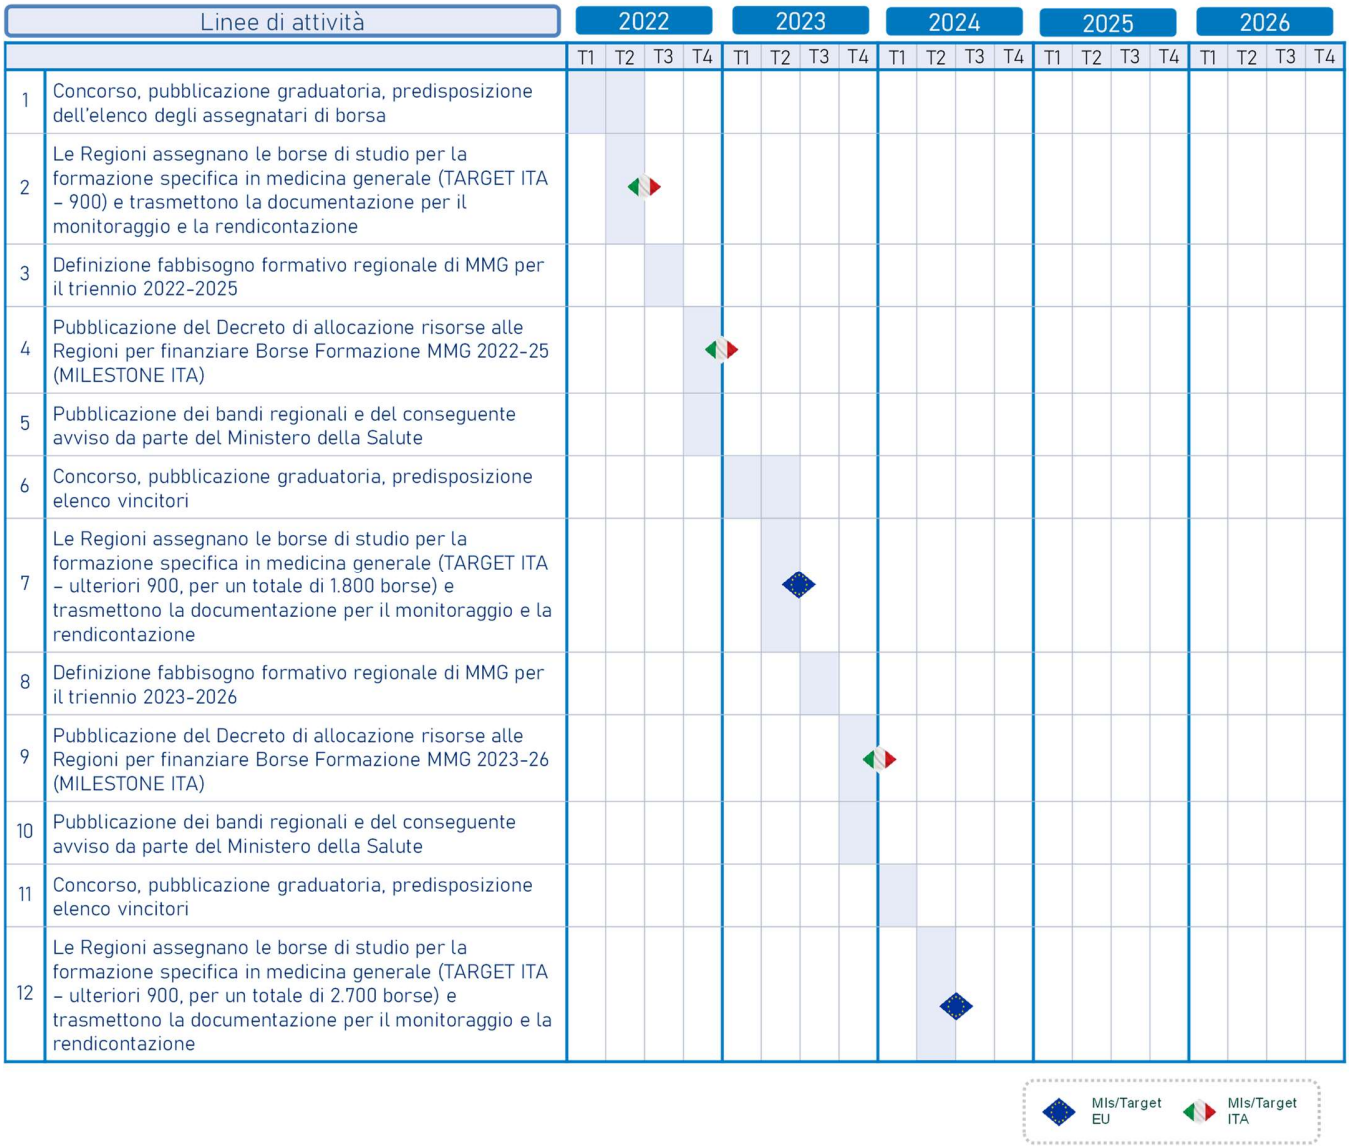

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Regione Calabria - Legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 "Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere" e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Regione Calabria - Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)", ed in particolare il TITOLO II, recante "Disposizioni in materia sanitaria";*
- *Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali - Settore 5, Decreto n. 12001 del 26/11/2021 – "APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2021/2024). D.LVO 368/99 E S.M.I."*
- *Decreto del Ministero della Salute del 29 ottobre 2021 che modifica il comma 6 dell'articolo 3 del DM 7 marzo 2006;*
- *'Intesa Rep. Atti n. 152/CSR, raggiunta in data 4 agosto 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato , Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Riparto fra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale anno 2021, con la quale è stata resa nota la ripartizione della quota vincolata dello stanziamento di FSN per l'anno*

2021 per il finanziamento delle borse di studio da erogare ai medici frequentanti il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;

- *Nota del 02.11.2021 prot. n. 56733 il Ministero della salute ha trasmesso il decreto ministeriale con il quale sono assegnate alla Regione Calabria, n. 34 borse di studio aggiuntive per ogni anno: 2021-2022-2023 e l'attribuzione delle relative risorse finanziarie pari ad € 1.284.104,52 gravanti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M6C2, investimento 2.2Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito, con modificazioni , nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;*
- *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 6;*
- *Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;*
- *Decreto 06 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 229 del 24 settembre 2021, che prevede , in particolare, alla Missione 6,M6C2, investimento 2.2, risorse al Ministero della Salute-Investimento2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario-Subinvestimento2.2 (a)borse aggiuntive informazione di medicina generale.*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 2.2 (a).

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C2	**2.2 (a)**	**Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale**	**1.284.104,52**	**1.284.104,52**	123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 2.2 è riportato nella tabella 11 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nel suddetto Allegato 3.

6.12. Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere -Action Plan

C2 – 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

OBIETTIVI NAZIONALI

TARGET NAZIONALE	**293.386** partecipanti
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consistenell'avviare un piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per tutto il personale del SSN.
REQUISITI TARGET M6 C2 29/30	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione – per gli interventi riferiti alla formazione in infezioni ospedaliere.	▪ L'indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l'impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell'ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. L'indicatore è pertanto rilevato e comunicato indicando i) i partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. È inoltre disaggregato per genere ed età. ▪ I partecipanti sono conteggiati all'inizio della loro partecipazione all'attività di istruzione o formazione.	▪ Semestrale

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione completa la procedura per la selezione dei provider dei corsi di formazione a marzo 2023, al fine di raggiungere il numero target complessivo in termini di partecipanti coinvolti tenendo conto delle indicazioni riportate all'interno dell'Allegato 5 del presente Piano operativo. ▪ L'adesione al programma da parte dei professionisti sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale operanti nelle strutture ospedaliere dovrà essere accreditata ECM, ferma restando la specificità del Modulo D dell'Allegato 5 del presente Piano operativo. ▪ Il programma viene sviluppato da ciascuna regione/P.A. ed è articolato nelle sue diverse componenti (corsi/moduli) sulla base delle indicazioni nazionali, di cui al suddetto Allegato 5, tenendo in considerazione le peculiarità di ogni regione/P.A. e i diversi setting. A tale scopo si valorizzano le competenze specifiche dei vari stakeholders presenti sul territorio, anche attraverso la collaborazione con le Università, gli IRCSS, l'Agenas e l'Istituto Superiore di Sanità. ▪ Il programma deve essere sviluppato in modalità blended (modalità mista in ambienti di apprendimento diversi che includano formazione frontale in aula e apprendimento online), prevedendo sia una formazione teorica, che degli approfondimenti pratici a livello locale presso le strutture sanitarie di afferenza dei partecipanti, assicurando così la possibilità di formazione attraverso la metodologia learning by doing, considerata una delle strategie didattiche più efficaci in materia. ▪ In ragione dei diversi profili professionali e delle diverse aree di attività dei destinatari del corso, questo dovrà includere sia moduli che forniscano conoscenze relative ad un approccio di base trasversale sia approfondimenti specifici per le diverse professionalità/aree di attività
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal MEF con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2022. ▪ Il presente Action Plan allo stato attuale non evidenzia un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento. ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE	[11.707]
FABBISOGNO	N/A
IMPORTO ASSEGNATO	€ 3.193.404,38 PNRR

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

Regione/Provincia Autonoma	Totale
Totale corsi	*468*
di cui da procedure regionali	.
di cui da procedure aziendali/altro	*468*

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Completamento procedure di selezione dei provider	T1 2023	
Milestone	Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	T3 2024	
Target	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	T1 2025	
Milestone	Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	T4 2025	
Target	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	T2 2026	

GANTT

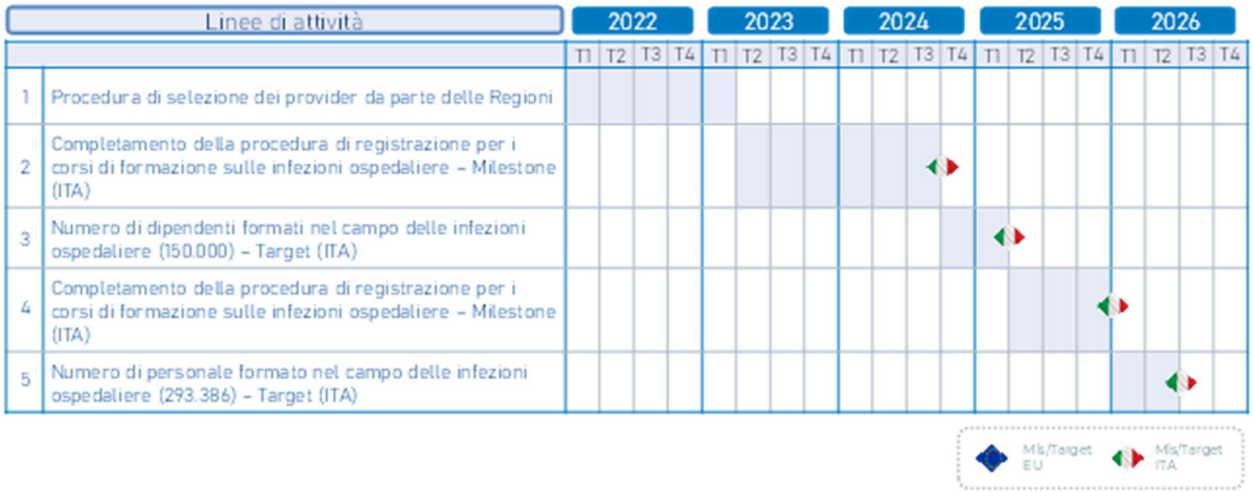

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;*
- *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 6;*
- *Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;*
- *Decreto 06 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 229 del 24 settembre 2021, che*

*prevede , in particolare, alla Missione 6,M6C2, investimento 2.2, risorse al Ministero della Salute-Investimento2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario-**Subinvestimento2.2(b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere***

- *Legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 "Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere" e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *D.G. n. 14425 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Linee Guida 2021-2023 per la definizione dei Piani di Formazione aziendali per il miglioramento delle competenze del personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio sanitario regionale".*
- *DDG n. 12509 del 27/11/2020 avente ad oggetto "Convenzione tra la Regione Calabria e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali avente ad oggetto l'affidamento da parte della Regione Calabria all'Agenzia di attività tecnico-operative, procedurali ed informatiche, finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali".*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 2.2 (b).

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	RiferimentiInvestimenti	TotaleRisorse per Regione [€]	Quotaassegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C2	**2.2 (b)**	**Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere**	**3.193.404,38**	**3.193.404,38**	123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 2.2è riportato nella tabella 11 dell'Allegato 3alpresente Piano.

La Regione, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nel suddetto Allegato 3.

7. Rispetto principi direttiva in materia Disabilità

Tutti gli interventi previsti e i servizi innovativi introdotti contribuiranno a migliorare la qualità dell'assistenza, anche per le persone con disabilità, con un impatto in termini di:

Accessibilità

Nell'implementazione dei progetti sarà assicurata la consultazione delle associazioni con disabilità. Come previsto dall'art. 9 della Convenzione ONU, nella realizzazione/adeguamento delle strutture di prossimità sarà garantito l'accesso all'ambiente fisico mediante l'abbattimento delle barriere fisiche ed architettoniche, creando ambienti liberamente fruibili da tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante. Inoltre, lo sviluppo della telemedicina e degli investimenti tecnologici previsti in ogni progetto strutturale, contribuiranno a favorire l'accesso alle informazioni e alla comunicazione da parte di tutti gli assistiti.

Progettazione universale

Gli interventi agevoleranno la fruibilità, l'autonomia e la sicurezza degli spazi da parte di tutti i soggetti, a prescindere dalle condizioni di salute. Promuoveranno inoltre una presa in carico personalizzata, che tenga conto delle condizioni sanitarie e sociosanitarie, nonché, delle preferenze del singolo individuo, promuovendo i principi dell'empowerment e della co-produzione dei servizi.

Promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione

Gli interventi mirano ad integrare i servizi sanitari e i diversi stakeholder coinvolti per una presa in carico complessiva della persona al fine di migliorare il servizio di assistenza sanitaria ai pazienti con condizioni croniche e alle categorie di popolazione più vulnerabili, come le persone con disabilità.

il potenziamento dell'assistenza domiciliare, della comunità di riferimento e il potenziamento delle cure intermedie sono infatti fondamentali per fornire sostegno alle persone con disabilità, assicurando servizi necessari alla permanenza in sicurezza della persona sul proprio territorio, a partire proprio dai servizi domiciliari.

L'obiettivo è quello di assicurare la massima autonomia e indipendenza della persona nel proprio ambiente di vita e lavoro, favorendo la presa in carico nella comunità di riferimento al fine di rispondere ai bisogni sanitari e sociosanitari della persona.

Non discriminazione

Il potenziamento dei servizi con la definizione di standard e modelli organizzativi uniformi su tutto il territorio nazionale, previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale, consentirà di ridurre le disuguaglianze sia in termini di accessibilità che di servizi, assicurando outcome di salute uniformi sull'intero territorio nazionale.

8. Equità di Accesso

Il diritto alla salute è uno dei principi fondamentali della Costituzione Italiana (art. 32); un diritto per il cittadino e un dovere per la collettività, che si coniuga con il pilastro dell'uguaglianza tra i cittadini. In tale ottica, la presente programmazione regionale si è orientata all'obiettivo di consentire alla popolazione calabrese l'accesso tempestivo alla diagnosi e alle terapie proprie dell'assistenza territoriale, nell'ambito più ampio della complessiva rete di assistenza sanitaria regionale, perché supporti il malato nelle diverse fasi della patologia.

Gli interventi della Regione Calabria programmati si pongono l'obiettivo di rendere il Sistema Sanitario Regionale più moderno, digitale e inclusivo, garantendo equità di accesso alle cure, rafforzando la prevenzione e i servizi sul territorio attuando;

- Assistenza di prossimità attraverso la realizzazione di strutture sanitarie (Case della Comunità) di facile accesso ed individuazione da parte dell'assistito;
- Appropriatezza, sicurezza, tempestività e personalizzazione delle cure;
- Rafforzamento dell'assistenza territoriale attraverso "una maggiore omogeneità ed accessibilità" alle prestazioni non solo sanitarie ma anche sociosanitarie
- Gestione di condizioni clinico-assistenziali particolarmente complesse e di evidente difficoltà attraverso l'utilizzo di strumenti di telemedicina e di teleconsulto;
- Coordinamento della presa in carico dell'assistito ed ottimizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di idonei supporti informativi e logistici per tutti gli operatori della rete assistenziale;
- Realizzazione di strutture intermedie tra il domicilio del paziente ed il ricovero ospedaliero (Ospedale di Comunità) evitando, così, i ricoveri ospedalieri impropri, nonché favorire le cure dei malati cronici, evitando il sovra affollamento attuale dei presidi ospedalieri;
- Ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali ospedaliere al fine di garantire qualità delle prestazioni e l'efficienza del sistema.

Il piano prevede la realizzazione di 61 Case della Comunità, 21 Centrali Operative Territoriali, 20 Ospedali di Comunità così distribuiti:

Ente del SSR	Case della Comunità	Ospedali della Comunità	Centrali Operative Territoriali
ASP Cosenza	*22*	*9*	*7*
ASP Catanzaro	*11*	*4*	*4*
ASP Crotone	*6*	*1*	*2*
ASP Vibo Valentia	*5*	*2*	*2*
ASP Reggio Calabria	*17*	*4*	*6*

I siti sono stati individuati dalle cinque Aziende Sanitarie Provinciali del Servizio Sanitario Regionale previa concertazione con gli organismi di rappresentanza degli Enti Locali interessati.
Al fine di garantire omogeneità nella capacità di dare risposte di natura sanitaria e sociosanitaria e di equità di accesso alle cure gli interventi e le ubicazioni sono stati individuati distintamente per tipologia territoriale, composizione sociale e abitudini ricorrenti delle rispettive collettività, e tenendo conto nell'individuazione degli stessi:

- dall'elevato numero di comuni della Regione Calabria, moltissimi di quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e molti in zone di non facile accessibilità;
- della carente rete assistenziale territoriale su tutto il territorio regionale nonché dell'assenza di assistenza domiciliare omogeneamente distribuita sul territorio regionale;
- della rete stradale non sempre agevole specialmente nelle zone montane che non consente di accedere tempestivamente e facilmente ai presidi sanitari;
- dei fabbisogni sanitari e sociosanitari in relazione alle caratteristiche epidemiologiche della popolazione e delle caratteristiche oro-geografiche del territorio;
- della distribuzione territoriale dei siti in modo omogeneo e capillare;
- delle precarie condizioni di trasporto pubblico locale.

Nel piano sono inclusi interventi di Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero derivanti dai fabbisogni riportati dalle Aziende del SSR le cui infrastrutture presentano un significativo grado di obsolescenza e risultano carenti in molti presidi, al fine di migliorare la prestazione dei servizi sanitari e garantirli equamente in tutti gli Ospedali regionali.

9. Rispetto principi in materia di pari opportunità di genere e generazionali

Il PNRR attraverso il Dl n. 77 del 2021 ha previsto che nei bandi di gara siano indicati come requisiti necessari e, in aggiunta, come requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità, tenendo altresì conto degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile.

In particolare l'articolo 47 del PNRR, in attuazione di tali principi contiene una serie di disposizioni volte a favore le pari opportunità generazionali e di genere e quelle per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Il comma 8 dell'articolo 47 del Dl n. 77/2021 ha affidato alle Linee Guida adottate con decreto del 7 dicembre 2021 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia e del Ministro per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nonché il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Disabilità, decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021 - Linee Guida che si intendono esaminare con il presente approfondimento - la definizione degli orientamenti in ordine alle modalità e ai criteri applicativi delle disposizioni contenute nello stesso articolo 47.

Le misure di incentivazione e tutela dovranno essere applicate a tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, integralmente o parzialmente con le risorse del PNRR e del PNC, sia che si tratti di concessioni sia che si tratti di appalti, a prescindere altresì dal relativo importo (sia che esso sia superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea).
Ciò significa che l'applicazione delle suddette linee guida avrà carattere generalizzato e opererà nell'ambito di tutti i contratti pubblici del PNRR e del PNC.

Il 7 dicembre 2021, è stato adottato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato nella GURI n. 309 del 30 dicembre 2021, relativo alle linee guida che forniscono alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità applicative delle varie disposizioni dell'art. 47, fra cui appunto anche quelle relative alle clausole di primalità.

Le linee guida riportano alcuni esempi di possibili criteri di valutazione, indicando per ciascuno anche delle ipotesi di modalità di attribuzione del punteggio.
Tali modalità sono tutte di tipo automatico/tabellare e, dunque, i criteri in questione sono tutti riconducibili al modello dei criteri on/off, che prevede l'assegnazione di un punteggio per un determinato parametro, in base alla mera presenza o assenza di un elemento o di una qualità, senza che sia necessaria una valutazione discrezionale da parte della commissione di gara.

Per esempio, fra i criteri indicati in via esemplificativa dalle linee guida troviamo il possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente e altri elementi agevolmente computabili, come l'impiego di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge e la previsione nell'organico aziendale del disability manager.

Altro esempio è l'attribuzione di punteggio alla circostanza che l'impresa sia di titolarità persone con disabilità oppure che il direttivo della stessa sia costituito per la maggioranza di persone tra i 18 e i 35 anni o che oltre la metà della compagine sociale sia composta da persone sotto i 36 anni.
Altri elementi, che possono essere oggetto di punteggio premiale sono accorpati nella categoria relativa all'adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i

propri dipendenti: sul punto le linee guide elencano una serie di possibili strumenti quali l'asilo nido aziendale o convenzionato, misure di flessibilità oraria e Smart Working, con un punteggio in base al numero degli strumenti adottati.

Risulta di particolare interesse, la scelta quale elemento meritevole dell'attribuzione di punteggio della natura di cooperativa sociale di tipo b dell'impresa, ma solo nell'ipotesi in cui le persone con disabilità impiegate dalla cooperativa costituiscano almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, dunque, al netto delle altre categorie di lavoratori "svantaggiati" previste dall'art. 4 della l. 8 novembre 1991, n. 381, quali tossicodipendenti e detenuti.

Le linee guida prevedono, un diverso peso nell'ambito complessivo dei criteri di valutazione dell'appalto per le clausole di primalità in questione, in relazione alla componente di lavoro femminile e giovanile nel settore economico di attività prevalente per l'impresa. Ad esempio, si prevede che il peso delle clausole non sia inferiore al 4% del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro femminile inferiore al 10% nel settore economico di attività prevalente per l'impresa e che non sia inferiore al 2% nel caso di componente di lavoro giovanile inferiore al 20%. Non viene specificato espressamente, ma è da ritenersi che tale ultima indicazione vada rispettata solo con riferimento alle clausole volte a favorire, rispettivamente, l'occupazione femminile e giovanile.

La percentuale di punteggio da destinare alle clausole si riduce all'aumentare della percentuale della componente del lavoro rilevante nel settore, rivelando che la specificazione relativa al peso non è volta a rendere la misura proporzionale allo stato del settore in cui opera l'impresa, ma al contrario a rafforzarne l'incisività nei settori in cui risulti maggiormente necessario un intervento. La Regione Calabria, nonché gli enti del SSR coinvolti nell'attuazione delle attività relative al PNRR, adotteranno i criteri previsti dalle Linee Guida per lo svolgimento delle gare di appalto, verificando che le imprese possano rispettare, in considerazione anche dell'autonomia dell'appaltatore, la previsione dell'articolo 47.

10. Modalità di monitoraggio e rendicontazione

La Regione procede ad elaborare le schede di monitoraggio per ciascun investimento. Tale monitoraggio avverrà attraverso il sistema Regis sulla base di tempistiche prestabilite.

Nello specifico, si riportano di seguito alcune indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR, per garantire la corretta redazione delle schede:

- **Step attuativo-procedurale**: in questa colonna sono riportati i passi procedurali/amministrativi utili per la realizzazione concreta dell'investimento al fine di rispettare milestone/target EU e nazionali;
- **Data inizio e fine:** in questa colonna sono riportate le date presunte, di inizio e fine, dello step attuativo-procedurale utili a comprendere la durata della procedura posta in essere. È sempre richiesta la valorizzazione della data di fine procedura (anche previsionale), al fine di rendere più facile l'individuazione delle scadenze programmate.
- **Strumento/Atto:** in questa colonna viene riportato lo strumento o l'atto dello step attuativo-procedurale (ad esempio: bando di gara, determina a contrarre, Decreto Ministeriale, etc.).
- **Note/Criticità:** in questa colonna sono riportate le presunte criticità o elementi degni di nota relativi alla procedura in essere.

Il dettaglio delle schede di monitoraggio procedurale relative a ciascun investimento sono riportate nell'Allegato 4al presente Piano.

Tabella 2 - Dettaglio Monitoraggio investimento

Format cronoprogramma attuativo dei singoli investimenti				
Step attuativo procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità

La Regione provvede, così come indicato nelle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR di cui alla Circolare n. 21/MEF, ai seguenti adempimenti:

- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- garantire il rispetto dell'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili;
- effettuare i controlli di gestione, i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese

sostenute prima di rendicontarle al Ministero della salute, nonché garantire la riferibilità delle spese al progetto finanziato;

- presentare, con cadenza almeno trimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dei costi nei tempi e nei modi previsti dal presente Piano ed atti conseguenti, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- garantire la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale delle spese sostenute e dei target realizzati in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché la messa a disposizione di detta documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, del Ministero della Salute, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione titolare con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- impegnarsi, per i progetti del PNRR, a conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e ad inviare la documentazione a supporto dell'avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei target e milestone del PNRR;
- si impegna, altresì, al rispetto del cronoprogramma procedurale di cui alla scheda "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del PNC;
- definire le modalità di implementazione e trasmissione delle informazioni e della documentazione anche tramite il sistema informatico per il monitoraggio degli interventi PNRR utilizzato dal Ministero della salute, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della salute;
- prevedere negli atti di rendicontazione la dichiarazione di aderenza dei progetti e delle relative spese al principio DNSH *Tagging* clima e digitale, *Gender Equality*, Valorizzazione dei giovani e Riduzione dei divari territoriali (ove pertinente), in funzione delle ulteriori indicazioni che saranno emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- prevedere negli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese;

- attenersi alle modalità e a eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione da parte del Soggetto attuatore;
- attenersi alle modalità di presentazione dei SAL (se pertinente);
- attenersi alle modalità di erogazione dell'eventuale anticipo (eventuale richiesta di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria);
- garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- attenersi in maniera puntuale alla documentazione da presentare ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, in funzione delle modalità di "rendicontazione" delle spese;
- attenersi ai controlli e agli adempimenti propedeutici all'erogazione svolti dall'Amministrazione responsabile nonché ai termini entro i quali l'Amministrazione provvede all'erogazione.;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornisce un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornisce i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero della salute e per tutta la durata del progetto.

Il Recovery and Resilience Facility (RRF) ha una dimensione totale pari a € 672,5 miliardi, di cui € 312,5 miliardi sono sovvenzioni e € 360 miliardi prestiti a tassi agevolati. Per l'Italia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede circa €191,5 miliardi, di cui € 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.

Le aree prioritarie di investimento del piano sono: la transizione verde; la trasformazione digitale; la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; la coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani.

Il PNRR si articola nelle seguenti 6 Missioni, a loro volta divise in 16 Componenti.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (€ 40,32 mld).
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (€ 59,47 mld).
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile (€ 25,40 mld).
4. Istruzione e ricerca (€ 30,88 mld).
5. Inclusione e coesione (€ 19,8 mld).
6. Salute (€ 15,63 mld).

Al fine di finanziare tutti i progetti ritenuti in linea con la strategia del PNRR, è stato istituito un Fondo Nazionale Complementare, per un importo complessivo pari a € 30,6 miliardi.

Focus Missione 6 "Salute"

La Missione 6 «Salute» si articola, come segue, in due Componenti separate ma complementari:

- **Componente 1:** Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale
- **Componente 2:** Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

La Componente 1 mira a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari.

Essa prevede i seguenti investimenti e sub-investimenti:

- Investimento 1.1.: Case della Comunità e presa in carico della persona.
- Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina:
  - *Investimento 1.2.1:* Casa come primo luogo di cura (Adi).
  - *Investimento 1.2.2: Implementazione delle* Centrali operative territoriali (COT).
  - *Investimento 1.2.3:* Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici.
- Investimento 1.3.: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).

La Componente 2 comprende, invece, misure volte al rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da realizzare attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica ed a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) anche mediante il potenziamento della formazione del personale.

Essa prevede i seguenti investimenti e sub-investimenti:

- Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.
  - *Investimento 1.1.1:* Digitalizzazione di 280 ospedali sede DEA I e II livello.
  - *Investimento 1.1.2:* Sostituzione di almeno 3.100 grandi apparecchiature sanitarie.
  - *Investimento 1.1.3:* Rafforzamento strutturale del SSN (tendenziale).
- Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile:
  - Realizzazione di almeno 109 interventi di adeguamento antisismico. A questi si aggiungono altri 220 interventi attraverso le risorse del PNC.
  - Risorse da accordi di programma: Art. 20 legge finanziaria 67/88 – strutture sanitarie.

- Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione:
  - *Sub-investimento 1.3.1:* Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
    - Creazione del repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly.
    - Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni.
    - Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica (tendenziale).
  - *Sub-investimento 1.3.2:* Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati e modello predittivo per garantire i LEA italiani e la sorveglianza e vigilanza sanitaria.
    - Evoluzione dell'infrastruttura e degli strumenti tecnologici e di analisi del Ministero della salute.
    - Reingegnerizzazione del NSIS a livello locale.
    - Costruzione di uno strumento potente e complesso di simulazione e predizione di scenari a medio lungo termine del SSN.
    - Sviluppo di una piattaforma nazionale di servizi di telemedicina.
- Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN.
  - *Investimento 2.1.1:* 100 progetti di ricerca finanziati con voucher Proof of Concept (PoC).
  - *Investimento 2.1.2:* 100 progetti di ricerca finanziati per tumori rari e malattie rare.
  - *Investimento 2.1.3:* 324 progetti di ricerca finanziati per malattie altamente invalidanti.
- Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.
  - *Investimento 2.2.1:* finanziamento di 2.700 borse aggiuntive in formazione di medicina generale.
  - *Investimento 2.2.2:* circa 294.000 corsi di formazione in infezioni ospedaliere.
  - *Investimento 2.2.3:* circa 6.500 corsi di formazione manageriale.
  - *Investimento 2.2.4:* 4.200 contratti di formazione medico-specialistica aggiuntivi.

Allegato 2

Tabelle localizzazione interventi

Per ciascun investimento della Componente 1, si riporta, il dettaglio delle informazioni relative alla localizzazione degli interventi (Comune, Provincia e Indirizzo) come evidenziato nella tabella seguente:

	Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona									
CUP	**ENTE del SSR**	**HUB/SPOKE [inserire HUB o SPOKE]**	**SUPERFICIE [MQ] Immobile**	**SUPERFICIE [MQ] Intervento**	**Utilizzo Si/No (*)**	**Comune**	**Provincia**	**Indirizzo**	**IMPORTO INTERVENTO PNRR**	**IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)**
E48I22000100006	*A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO*	SPOKE	*1515*	*1050*	SI	*CURINGA*	*CATANZARO*	*SALICE ,SNC*	*1,655,660.00*	*236,686.00*
B32C22000840001	*A.S.P. COSENZA - RUP: MUTO EUGENIO*	SPOKE	*27440*	*800*	SI	*CETRARO*	*COSENZA*	*Località Testa ,snc*	*0.00*	*1,500,000.00*
B82C22000250001	*A.S.P. COSENZA - RUP: MUTO EUGENIO*	SPOKE	*5120*	*800*	NO	*MONTALTO UFFUGO*	*COSENZA*	*Loc. Taverna ,snc*	*1,400,000.00*	*0.00*
B22C22000300001	*A.S.P. COSENZA - RUP: MUTO EUGENIO*	SPOKE	*11598*	*800*	SI	*SCALEA*	*COSENZA*	*Loc. Petrosa ,snc*	*1,400,000.00*	*0.00*
B42C22000320001	*A.S.P. COSENZA - RUP: LUZZI ROSSELLA*	SPOKE	*1050*	*1050*	NO	*LONGOBUCCO*	*COSENZA*	*Via S. Giuseppe ,16*	*1,400,000.00*	*0.00*
B52C22000170001	*A.S.P. COSENZA - RUP: LUZZI ROSSELLA*	SPOKE	*9725*	*800*	SI	*LUNGRO*	*COSENZA*	*Contrada S.Leonardo ,snc*	*1,400,000.00*	*0.00*
B72C22000250001	*A.S.P. COSENZA - RUP: MIGLIO PIERCARLO*	SPOKE	*1193*	*790*	NO	*BISIGNANO*	*COSENZA*	*Via Castello ,snc*	*1,400,000.00*	*0.00*
B32C22000400001	*A.S.P. COSENZA - RUP: MIGLIO PIERCARLO*	SPOKE	*1120*	*800*	SI	*ROCCA IMPERIALE*	*COSENZA*	*Contrada Rivustica ,snc*	*1,400,000.00*	*0.00*
G82C21001160001	*A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO*	SPOKE	*820*	*820*	NO	*ROGHUDI*	*REGGIO DI CALABRIA*	*Ghorio ,snc*	*1,486,419.00*	*0.00*
B22C22000290001	*A.S.P. COSENZA - RUP: MIGLIO PIERCARLO*	SPOKE	*10072*	*800*	SI	*MORMANNO*	*COSENZA*	*Contrada Malinieri ,snc*	*1,400,000.00*	*0.00*
B25F22000410001	*A.S.P. COSENZA - RUP: MIGLIO PIERCARLO*	HUB	*800*	*800*	SI	*RENDE*	*COSENZA*	*Località Quattromiglia ,snc*	*1,827,830.00*	*0.00*

E42C22000050005	A.S.P. CROTONE - RUP: BENNARDO FRANCESCO SALVATORE	SPOKE	1283	1283	SI	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	CROTONE	SUGGESARO ,SNC	1,400,000.00	0.00
E12C22000200005	A.S.P. CROTONE - RUP: BENNARDO FRANCESCO SALVATORE	HUB	1178	1178	NO	CROTONE	CROTONE	CORSO MESSINA ,SNC	1,827,830.00	0.00
E82C22000080005	A.S.P. CROTONE - RUP: BENNARDO FRANCESCO SALVATORE	SPOKE	965	963	SI	CIRÒ MARINA	CROTONE	P. TOGLIATTI ,SNC	1,400,000.00	0.00
E38I22000140006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	SPOKE	3000	1050	SI	SAN MANGO D'AQUINO	CATANZARO	PIANO ,SNC	1,650,000.00	280,881.00
E88I22000150006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	SPOKE	1400	870	SI	LAMEZIA TERME	CATANZARO	PIAZZA BORELLI ,SNC	1,800,000.00	229,137.00
E68I22000140006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	SPOKE	3250	800	SI	CATANZARO	CATANZARO	2. Via: CROTONE ,SNC	1,250,000.00	173,616.00
E38I22000130006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	SPOKE	1350	880	SI	TAVERNA	CATANZARO	CAMPO SPORTIVO ,SNC	1,400,000.00	169,808.00
E58I22000180006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	SPOKE	900	850	NO	SERSALE	CATANZARO	PIAZZA C. BORELLI ,SNC	1,700,000.00	256,731.00
J62C22000630006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: FILIPPELLI FRANCESCO	HUB	8212	2208	SI	SORIANO CALABRO	VIBO VALENTIA	AMENDOLA ,SNC	1,400,000.00	0.00
J92C22000560006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: FILIPPELLI FRANCESCO	HUB	10100	2330	SI	NICOTERA	VIBO VALENTIA	FILIPPELLA ,SNC	1,613,915.00	0.00
J32C22000560006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: FILIPPELLI FRANCESCO	SPOKE	10800	2000	SI	SERRA SAN BRUNO	VIBO VALENTIA	ALFONSO SCRIVO ,SNC	1,400,000.00	0.00
J52C22000640001	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: FILIPPELLI FRANCESCO	SPOKE	1200	1200	NO	MILETO	VIBO VALENTIA	ALDO MORO ,SNC	1,400,000.00	0.00
J44E22003370006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: FILIPPELLI FRANCESCO	SPOKE	960	880	NO	FILADELFIA	VIBO VALENTIA	PIAZZA G.A SERRAO ,SNC	1,613,915.00	0.00
G32C21001250008	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	HUB	4275	1310	NO	REGGIO DI CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	Via Torrione, ,96	1,500,000.00	1,228,234.00
G32C21001240001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	HUB	2015	930	NO	REGGIO DI CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	Placido Geraci ,snc	1,489,875.00	0.00
G92C21000840001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	777	777	NO	VILLA SAN GIOVANNI	REGGIO DI CALABRIA	Zanotti Bianco ,snc	1,489,138.00	0.00
G62C21000850006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	HUB	11750	1050	NO	PALMI	REGGIO DI CALABRIA	Bruno Buozzi ,sbc	1,500,000.00	686,753.00
G32C21001230006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	1150	835	NO	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	REGGIO DI CALABRIA	Sergente Crea ,snc	1,500,000.00	686,753.00
G62C21000840001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	5500	900	NO	TAURIANOVA	REGGIO DI CALABRIA	Via Cavour ,snc	1,497,453.00	0.00
G92C21000830001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	800	700	NO	ROSARNO	REGGIO DI CALABRIA	Piazza Calvario ,1	1,331,945.00	0.00
G12C21001280006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	HUB	900	900	NO	CAULONIA	REGGIO DI CALABRIA	Martiri di Gerace ,snc	1,500,000.00	139,317.00
G62C21000860001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	850	850	NO	GIOIOSA IONICA	REGGIO DI CALABRIA	Delle Rimembranze ,SNC	1,497,453.00	0.00
G22C21000630001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	430	800	NO	MONTEBELLO IONICO	REGGIO DI CALABRIA	Località Fossato ,snc	1,500,000.00	110,944.00

B92C22000240001	A.S.P. COSENZA - RUP: PISANO MARIA ROSARIA	HUB	4512	800	SI	AMANTEA	COSENZA	Santa Maria ,snc	1,656,698.00	0.00
B42C22000310001	A.S.P. COSENZA - RUP: LINORI GABRIELE	HUB	1110	800	SI	ROGGIANO GRAVINA	COSENZA	Contrada Cardosa ,sns	1,656,698.00	0.00
B12C22000190001	A.S.P. COSENZA - RUP: LINORI GABRIELE	HUB	9186	800	SI	CASSANO ALL'IONIO	COSENZA	Via Tevere ,snc	1,742,264.00	0.00
B62C22000210001	A.S.P. COSENZA - RUP: MUTO EUGENIO	SPOKE	800	800	NO	LUZZI	COSENZA	Contrada Serra Civita ,SNC	1,400,000.00	0.00
B82C22000280001	A.S.P. COSENZA - RUP: MUTO EUGENIO	SPOKE	800	800	NO	VERBICARO	COSENZA	Località Patia ,10	1,400,000.00	0.00
B72C22000260001	A.S.P. COSENZA - RUP: LUZZI ROSSELLA	SPOKE	800	800	NO	SPEZZANO DELLA SILA	COSENZA	Via Fausto Gullo ,snc	1,400,000.00	0.00
B92C22000260001	A.S.P. COSENZA - RUP: LUZZI ROSSELLA	SPOKE	800	800	NO	SAN GIORGIO ALBANESE	COSENZA	Strada Provinciale n° 186 ,snc	1,400,000.00	0.00
B32C22000440001	A.S.P. COSENZA - RUP: MIGLIO PIERCARLO	SPOKE	1000	800	NO	TORANO CASTELLO	COSENZA	Corso Umberto I ,snc	1,400,000.00	0.00
E22C22000240005	A.S.P. CROTONE - RUP: BENNARDO FRANCESCO SALVATORE	SPOKE	1343	1343	NO	CACCURI	CROTONE	ADUA ,SNC	0.00	1,500,000.00
E92C22000100005	A.S.P. CROTONE - RUP: BENNARDO FRANCESCO SALVATORE	SPOKE	1017	1017	NO	VERZINO	CROTONE	NAZIONALE ,SNC	1,400,000.00	0.00
E12C22000180005	A.S.P. CROTONE - RUP: BENNARDO FRANCESCO SALVATORE	SPOKE	1084	1084	NO	ROCCA DI NETO	CROTONE	LOCALITA' SETTEPORTE ,SNC	1,400,000.00	0.00
E75F22000740006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	SPOKE	800	800	SI	NOCERA TERINESE	CATANZARO	CAMPO SPORTIVO ,SNC	0.00	1,500,000.00
E35F22000430006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	HUB	800	800	SI	SOVERATO	CATANZARO	AMIRANTE ,SNC	1,700,000.00	614,099.00
E88I22000140006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	SPOKE	815	815	NO	SQUILLACE	CATANZARO	DAMIANO ASSANTI ,4	1,700,000.00	175,906.00
E98I22000090006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	SPOKE	855	855	SI	BADOLATO	CATANZARO	NAZIONALE ,SNC	1,400,000.00	110,263.00
E64E22000970006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	SPOKE	3149	799	SI	CATANZARO	CATANZARO	FRANCESCO ACRI ,124	600,000.00	184,773.00
G72C22000590001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	6000	675	NO	ANTONIMINA	REGGIO DI CALABRIA	Fraz. Bagni ,snc	0.00	1,500,000.00
G28I21001150003	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	105	695	NO	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	REGGIO DI CALABRIA	S. Anna ,snc	1,500,000.00	394,472.00
G12C21001290001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	1140	808	NO	BAGNARA CALABRA	REGGIO DI CALABRIA	Adone ,4	1,481,865.00	0.00
G31B21008630001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	2000	2000	NO	CINQUEFRONDI	REGGIO DI CALABRIA	Roma ,29/b	1,497,453.00	0.00
G62C21000830001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	2670	800	NO	BOVALINO	REGGIO DI CALABRIA	G. Spagnuolo Moresciano ,snc	1,497,453.00	0.00
G12C21001270006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	SPOKE	680	120	NO	MONASTERACE	REGGIO DI CALABRIA	Aspromonte snc ,snc	1,500,000.00	207,145.00

B22C22000330001	A.S.P. COSENZA - RUP: PISANO MARIA ROSARIA	SPOKE	800	800	NO	PARENTI	COSENZA	Contrada Gerardo ,snc	1,400,000.00	0.00
B12C22000200001	A.S.P. COSENZA - RUP: PISANO MARIA ROSARIA	HUB	1060	800	NO	CROSIA	COSENZA	S. Andrea ,snc	1,571,132.00	0.00
B22C22000310001	A.S.P. COSENZA - RUP: PISANO MARIA ROSARIA	SPOKE	395	800	NO	CASALI DEL MANCO	COSENZA	Via Fiano – Casole Bruzio ,snc	1,400,000.00	0.00
B82C22000260001	A.S.P. COSENZA - RUP: LINORI GABRIELE	HUB	4500	800	NO	COSENZA	COSENZA	Via Bendicenti ,snc	1,742,264.00	0.00
B92C22000250001	A.S.P. COSENZA - RUP: LINORI GABRIELE	SPOKE	850	800	NO	VILLAPIANA	COSENZA	Contrada S. Maria del Monte ,27-31-35	1,400,000.00	0.00

(*) Indicare SI se la CdC utilizza spazi disponibili esistenti e funzionali non oggetto di intervento

Dati relativi a "Case della Comunità e presa in carico della persona" aggiornati al 18/05/2022 21:05

	Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)								
CUP	**ENTE del SSR**	**SUPERFICIE [MQ] Immobile**	**SUPERFICIE [MQ] Intervento**	**Utilizzo Si/No (*)**	**Comune**	**Provincia**	**Indirizzo**	**IMPORTO INTERVENTO PNRR**	**IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)**
B22C22000360001	A.S.P. COSENZA - RUP: ABATE GIANFRANCO	1850	100	NO	RENDE	COSENZA	loc.tà Quattromiglia Via Meucci ,1	173,075.00	0.00
B92C22000280001	A.S.P. COSENZA - RUP: ABATE GIANFRANCO	1860	100	SI	PAOLA	COSENZA	Viale dei Giardini ,70	173,075.00	0.00
B52C22000230001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	36700	100	SI	CASTROVILLARI	COSENZA	VIALE DEL LAVORO ,snc	173,075.00	0.00
B82C22000290001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	1986	100	SI	COSENZA	COSENZA	Piazza Amendola ,snc	173,075.00	0.00
B32C22000410001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	900	100	SI	CORIGLIANO-ROSSANO	COSENZA	Via Mazzei ,snc	173,075.00	0.00
E12C22000190005	A.S.P. CROTONE - RUP: BENNARDO FRANCESCO SALVATORE	150	150	SI	CROTONE	CROTONE	NAZIONI UNITE ,SNC	173,075.00	0.00
E62C22000170005	A.S.P. CROTONE - RUP: BENNARDO FRANCESCO SALVATORE	175	175	SI	MESORACA	CROTONE	LOCALITA' CAMPIZZI ,SNC	0.00	173,000.00
E65F22000520006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	860	150	SI	CATANZARO	CATANZARO	DANIELE ,24	173,075.00	0.00
E85F22000570006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	3000	150	SI	LAMEZIA TERME	CATANZARO	PIAZZA BORELLI ,12	173,075.00	0.00
B32C22000420001	A.S.P. COSENZA - RUP: BORROMEO GIOVANNA	2700	100	SI	CORIGLIANO CALABRO	COSENZA	Via Stevenson ,Snc	173,075.00	0.00
G12C21001310001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	1140	150	NO	BAGNARA CALABRA	REGGIO DI CALABRIA	Adone ,4	145,108.00	0.00
G12C21001300001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	670	670	NO	LOCRI	REGGIO DI CALABRIA	Matteotti ,snc	145,108.00	0.00
G32C21001260001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	4275	140	NO	REGGIO DI CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	Torrione ,96	135,434.00	0.00
G62C21000870001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	3100	150	NO	TAURIANOVA	REGGIO DI CALABRIA	Cavour ,snc	145,108.00	0.00
G52C21000590001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	640	180	NO	PALIZZI	REGGIO DI CALABRIA	Fiume ,snc	319,238.00	0.00
J91B22001170005	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: SORIANO MICHELA	15250	500	SI	NICOTERA	VIBO VALENTIA	FILIPPELLA ,SNC	0.00	175,000.00
J21B22000910006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: SORIANO MICHELA	6100	901	SI	PIZZO	VIBO VALENTIA	NAZIONALE ,SNC	173,075.00	0.00
B82C22000310001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	4500	100	SI	COSENZA	COSENZA	Via degli Stadi ,snc	173,075.00	0.00
E35F22000440006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	150	150	SI	SOVERATO	CATANZARO	DELLA STAZIONE ,SNC	173,075.00	248,107.00
E45F22000280006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	150	150	SI	BOTRICELLO	CATANZARO	LOCALITA' MARINA DI BRUNI ,SNC	173,075.00	240,993.00

G72C21001060001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	500	150	NO	CARDETO	REGGIO DI CALABRIA	Torrente S'Agata ,snc	145,108.00	0.00

(*) Indicare SI se la COT utilizza spazi disponibili esistenti e funzionali non oggetto di intervento

Dati relativi a "Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)" aggiornati al 18/05/2022 21:05

	Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Device		
CUP	Soggetto richiedente (Regione o ASL)	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
B89G22000080006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	677,001.00	0.00
E15I22000050005	E1S.P. CROTONE - RUP: BENNARDO FRANCESCO SALVATORE	96,716.19	99,995.16
E39G22000000006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	386,864.50	0.00
G34E21003800001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	580,297.00	0.00
J99B22000050006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: SORIANO MICHELA	96,716.17	99,908.18

Dati relativi a "Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Device" aggiornati al 18/05/2022 21:05

	Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) - Interconnessione		
CUP	Soggetto richiedente (Regione o ASL)	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
E39B22000010006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	284,284.00	0.00
B89B22000040006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	497,497.00	0.00
E14E22001020005	E1S.P. CROTONE - RUP: BENNARDO FRANCESCO SALVATORE	71,071.00	75,000.00
G35F21001840001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	426,426.00	0.00
J99B22000040006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: SORIANO MICHELA	71,071.00	75,000.00

Dati relativi a "Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Interconnessione" aggiornati al 18/05/2022 21:05

	Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)								
CUP	ENTE del SSR	SUPERFICIE [MQ] Immobile	SUPERFICIE [MQ] Intervento	Utilizzo Si/No (*))	Comune	Provincia	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
G72C21001070001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	1700	1200	NO	BOVA MARINA	REGGIO DI CALABRIA	L.tà Spina Santa ,snc	2,753,837.00	0.00
B22C22000350001	A.S.P. COSENZA - RUP: ABATE GIANFRANCO	11598	1100	SI	SCALEA	COSENZA	Loc. Petrosa ,snc	2,508,956.00	0.00
B22C22000340001	A.S.P. COSENZA - RUP: ABATE GIANFRANCO	10072	1100	SI	MORMANNO	COSENZA	Contrada Malinieri ,snc	2,508,956.00	0.00
B62C22000720001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	4400	1100	SI	CARIATI	COSENZA	Via Mingiani ,6	0.00	2,500,000.00
B52C22000200001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	9725	1100	SI	LUNGRO	COSENZA	Contrada S. Leonardo ,snc	2,508,956.00	0.00
E62C22000100005	A.S.P. CROTONE - RUP: BENNARDO FRANCESCO SALVATORE	1680	1680	SI	MESORACA	CROTONE	LOCALITA' CAMPIZZI ,SNC	2,508,955.00	0.00
E48I22000090006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	5161	1600	SI	SOVERIA MANNELLI	CATANZARO	DOTT. GUIDO PELLICO ,SNC	2,508,955.00	181,982.00
E64E22000990006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	3066	1610	SI	GIRIFALCO	CATANZARO	CONTRADA SERRE ,SNC	2,508,955.00	408,029.00
B52C22000720001	A.S.P. COSENZA - RUP: BORROMEO GIOVANNA	13480	1100	SI	TREBISACCE	COSENZA	Via della Libertà ,468	0.00	2,500,000.00
B12C22000210001	A.S.P. COSENZA - RUP: BORROMEO GIOVANNA	9186	1100	SI	CASSANO ALL'IONIO	COSENZA	Via Tevere ,Snc	2,508,956.00	0.00
B52C22000210001	A.S.P. COSENZA - RUP: BORROMEO GIOVANNA	8220	1100	SI	SAN MARCO ARGENTANO	COSENZA	Via Nazionale ,Snc	2,508,956.00	0.00
G24C21000870001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	3950	3950	NO	OPPIDO MAMERTINA	REGGIO DI CALABRIA	C.so Aspromonte ,snc	2,321,736.00	0.00
G32C21001270001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	5500	1700	NO	GERACE	REGGIO DI CALABRIA	Largo Piane ,snc	2,652,261.00	0.00
G24C21000860001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	3000	3000	NO	CITTANOVA	REGGIO DI CALABRIA	Calabria ,snc	2,305,613.00	0.00

J12C22000700005	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: SORIANO MICHELA	13450	1125	SI	TROPEA	VIBO VALENTIA	PROVINCIALE ,SNC	0.00	2,500,000.00
J64E22000710006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: SORIANO MICHELA	8212	2180	SI	SORIANO CALABRO	VIBO VALENTIA	AMENDOLA ,SNC	2,508,955.00	878,135.00
B82C22000580001	A.S.P. COSENZA - RUP: ABATE GIANFRANCO	4500	1100	NO	COSENZA	COSENZA	Via Bendicenti ,snc	0.00	2,500,000.00
B52C22000190001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	5900	1100	SI	ROGLIANO	COSENZA	Via A. Altomare ,snc	2,508,956.00	0.00
E45F22000270006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	6050	1100	SI	BOTRICELLO	CATANZARO	LOICALITA' MARINA DI BRUNI ,SNC	2,508,955.00	1,109,919.00
E95F22000900006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	1100	1100	SI	BADOLATO	CATANZARO	GIUSEPPE SCUTERI ,SNC	0.00	2,500,000.00

(*) Indicare SI se l'Ospedale di Comunità utilizza spazi disponibili esistenti e funzionali non oggetto di intervento

Dati relativi a "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)" aggiornati al 18/05/2022 21:05

Per ciascun investimento della Componente 2, si riporta, laddove applicabile, il dettaglio delle informazioni relative alla localizzazione degli interventi (Comune, Provincia e Indirizzo) come evidenziato nella tabella seguente:

Tabella 4 - Dettaglio localizzazioni investimenti - Componente 2

	Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)						
CUP	**ENTE del SSR**	**Titolo Progetto**	**Presidio ospedaliero**	**DEA di I o II livello** *(I o II Livello)*	**Comune**	**MPORTO INTERVENTO PNRR**	**IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)**
J46G21004560006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: RENDA ANNA	Implementazione dotazione hardware e software	180034#Ospedale Vibo Valentia	DEA I	VIBO VALENTIA	1,310,000.00	0.00
B92C22000290001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEA I LIVELLO SPOKE PAOLA-CETRARO	180012#OSPEDALE SPOKE CETRARO PAOLA	DEA I	PAOLA	4,800,000.00	0.00
B32C22000430001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEA I LIVELLO DELLO SPOKE DI ROSSANO CORIGLIANO	180010#OSPEDALE SPOKE ROSSANO CORIGLIANO	DEA I	CORIGLIANO-ROSSANO	4,000,000.00	0.00
B52C22000240001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEA I LIVELLO DELLO SPOKE DI CASTROVILLARI	180006#OSPEDALE SPOKE DI CASTROVILLARI	DEA I	CASTROVILLARI	4,400,000.00	0.00
E37H22001210006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO	180033#Presidio Ospedaliero Lamezia Terme	DEA I	LAMEZIA TERME	4,680,132.00	0.00
G14E21004060001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	pnrr interventi finalizzati alla digitalizzazione del DEA di I° livello del Presidio Ospedaliero di Locri (RC)	180061#P.O.S MARIA DEGLI UNGHERESI	DEA I	POLISTENA	7,120,000.00	0.00
G14E21004050001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	PNRR Interventi finalizzati alla digitalizzazione del DEA di I° livello del Presidio Ospedaliero di Locri (RC)	180059#Ospedale Civile di Locri	DEA I	LOCRI	6,703,000.00	0.00
E14E22000690006	A.S.P. CROTONE - RUP: CIMINELLI VINCENZO	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO DEL PO DI CROTONE	180032#OSPEDALE CIVILE SAN GIOVANNI DI DIO	DEA I	CROTONE	6,588,410.00	0.00
J61C22000000006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: MARTORELLI PIERO	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	180913#Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio"	DEA II	CATANZARO	2,636,888.43	0.00
F87H22001720006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: SANTELLI CONCETTA	Sviluppo del sistema informativo Ospedaliero	180912#azienda ospedaliera di cosenza	DEA II	COSENZA	7,532,500.00	0.00
G36G21010330006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: TRIOLO GIOVANNI	Sviluppo dei sistemi informativi aziendali del GOM Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria	180915#GOM REGGIO CALABRIA	DEA II	REGGIO DI CALABRIA	4,803,000.00	0.00

Dati relativi a "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)" aggiornati al 18/05/2022 21:05

	Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)						
CUP	**ENTE del SSR**	**Grande Apparecchiature**	**Presidio**	**Unità operativa**	**Comune**	**MPORTO INTERVENTO PNRR**	**IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)**
J64E22000410006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ECOTOMOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Endocrinologia	CATANZARO	82,000.00	0.00
B54E22000200006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180179#CASA SALUTE SAN MARCO ARGENTANO	UO RADIOLOGIA	SAN MARCO ARGENTANO	82,000.00	0.00
B34E22000470006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180001001#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CORIGLIANO	AMB PEDIATRIA	CORIGLIANO	82,000.00	0.00
B64E22000780006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180114#CASA DELLA SALUTE DI CARIATI	CARDIOLOGIA	CARIATI	82,000.00	0.00
B54E22000240006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180016#PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREBISACCE	UO RADIOLOGIA	TREBISACCE	82,000.00	0.00
B64E22000790006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180114#CASA DELLA SALUTE DI CARIATI	UO RADIOLOGIA	CARIATI	82,000.00	0.00
B24E22000260006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180011#PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACRI	UO RADIOLOGIA	ACRI	82,000.00	0.00
B24E22000370006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	008800#POLIAMBULATORIO RENDE	AMB	RENDE	82,000.00	0.00

B14E22000680006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180109#PO Praia a mare	UO RADIOLOGIA	PRAIA A MARE	82,000.00	0.00
B54E22000260006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180006#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTROVILLARI	CARDIOLOGIA	CASTROVILLARI	82,000.00	0.00
B24E22000320006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	008800#POLIAMBULATORIO RENDE	CARDIOLOGIA	RENDE	82,000.00	0.00
B34E22000480006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180001002#PRESIDIO OSPEDALIERO ROSSANO	UO RADIOLOGIA	ROSSANO	82,000.00	0.00
B34E22000550006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180001001#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CORIGLIANO	UO GINECOLOGIA E OSTETRICIA	CORIGLIANO	82,000.00	0.00
B94E22000230006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180001202#PRESIDIO OSPEDALIERO DI PAOLA	UO RADIOLOGIA	PAOLA	82,000.00	0.00
B54E22000250006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180006#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTROVILLARI	UO RADIOLOGIA	CASTROVILLARI	82,000.00	0.00
B14E22000700006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180015#PO SAN GIOVANNI IN FIORE	UO RADIOLOGIA	SAN GIOVANNI IN FIORE	82,000.00	0.00
B24E22000270006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	008800#POLIAMBULATORIO RENDE	UO RADIOLOGIA	RENDE	82,000.00	0.00
B54E22000190006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180016#PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREBISACCE	AMB ECOGRAFIA PO TREBISACCE	TREBISACCE	82,000.00	0.00
B54E22000290006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180006#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTROVILLARI	UO GINECOLOGIA E OSTETRICIA	CASTROVILLARI	82,000.00	0.00
B14E22000810006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180109#PO Praia a mare	AMB	PRAIA A MARE	82,000.00	0.00
B94E22000260006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180001202#PRESIDIO OSPEDALIERO DI PAOLA	MEDICINA ECOGRAFIA	PAOLA	82,000.00	0.00
B34E22000430006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180001201#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CETRARO	DAY HOSPITAL	CETRARO	82,000.00	0.00
B14E22000780006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180015#PO SAN GIOVANNI IN FIORE	PO SAN GIOVANNI INFIORE	SAN GIOVANNI IN FIORE	82,000.00	0.00
B34E22000560006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180001201#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CETRARO	UO GINECOLOGIA E OSTETRICIA	CETRARO	82,000.00	0.00
B54E22000230006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180179#CASA SALUTE SAN MARCO ARGENTANO	CARDIOLOGIA	SAN MARCO ARGENTANO	82,000.00	0.00
B34E22000460006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180001001#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CORIGLIANO	UO RADIOLOGIA	CORIGLIANO	82,000.00	0.00
B34E22000500006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180001201#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CETRARO	AMB CHIRURGIA	CETRARO	82,000.00	0.00
B94E22000240006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	007000#POLIAMBULATORIO DI AMANTEA	UROLOGIA	AMANTEA	82,000.00	0.00
B94E22000250006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	007000#POLIAMBULATORIO DI AMANTEA	AMBULATORIO ECOGRAFIA	AMANTEA	82,000.00	0.00
B24E22000380006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180011#PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACRI	AMB	ACRI	82,000.00	0.00
B54E22000170006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	ECOTOMOGRAFI	180006#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTROVILLARI	UO RADIOLOGIA	CASTROVILLARI	82,000.00	0.00
B34E22000620006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180001002#PRESIDIO OSPEDALIERO ROSSANO	UO RADIOLOGIA	ROSSANO	80,000.00	0.00
B34E22000570006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	TAC A 128 STRATI	180001001#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CORIGLIANO	UO RADIOLOGIA	CORIGLIANO	530,000.00	0.00
B34E22000600006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	MAMMOGRAFI	180001201#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CETRARO	UO RADIOLOGIA	CETRARO	280,000.00	0.00
B24E22000400006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	008800#POLIAMBULATORIO RENDE	UO RADIOLOGIA	RENDE	80,000.00	0.00
B34E22000580006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	ANGIOGRAFI	180001002#PRESIDIO OSPEDALIERO ROSSANO	CARDIOLOGIA	ROSSANO	608,000.00	0.00
B14E22000820006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180015#PO SAN GIOVANNI IN FIORE	UO RADIOLOGIA	SAN GIOVANNI IN FIORE	47,800.00	0.00
B14E22000920006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	002801#POLIAMBULATORIO DI CASSANO ALLO IONIO	UO RADIOLOGIA	CASSANO ALLO IONIO	260,180.00	0.00
B54E22000390006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	RMN A 1,5 T	180006#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTROVILLARI	UO RADIOLOGIA	CASTROVILLARI	914,000.00	0.00
B34E22000630006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180001001#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CORIGLIANO	UO RADIOLOGIA	CORIGLIANO	47,800.00	0.00
B54E22000340006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180016#PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREBISACCE	UO RADIOLOGIA	TREBISACCE	47,800.00	0.00
B94E22000310006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	ANGIOGRAFI	180001202#PRESIDIO OSPEDALIERO DI PAOLA	UO CARDIOLOGIA	PAOLA	608,000.00	0.00
B54E22000410006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180016#PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREBISACCE	UO RADIOLOGIA	TREBISACCE	260,180.00	0.00
B94E22000300006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	TAC A 128 STRATI	180001202#PRESIDIO OSPEDALIERO DI PAOLA	UO RADIOLOGIA	PAOLA	530,000.00	0.00
B14E22000900006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180015#PO SAN GIOVANNI IN FIORE	UO RADIOLOGIA	SAN GIOVANNI IN FIORE	260,180.00	0.00
B94E22000390006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	007000#POLIAMBULATORIO DI AMANTEA	UO RADIOLOGIA	AMANTEA	48,820.00	0.00
B94E22000380006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	007000#POLIAMBULATORIO DI AMANTEA	UO RADIOLOGIA	AMANTEA	260,180.00	0.00

B54E22000300006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	TAC A 128 STRATI	180006#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTROVILLARI	UO RADIOLOGIA	CASTROVILLARI	530,000.00	0.00
B24E22000390006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	MAMMOGRAFI	008800#POLIAMBULATORIO RENDE	UO RADIOLOGIA	RENDE	280,000.00	0.00
B34E22000690006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	18001002#PRESIDIO OSPEDALIERO ROSSANO	UO RADIOLOGIA	ROSSANO	260,180.00	0.00
B54E22000400006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180179#CASA SALUTE SAN MARCO ARGENTANO	UO RADIOLOGIA	SAN MARCO ARGENTANO	260,180.00	0.00
B34E22000610006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	MAMMOGRAFI	18001002#PRESIDIO OSPEDALIERO ROSSANO	UO RADIOLOGIA	ROSSANO	280,000.00	0.00
B14E22000910006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180109#PO Praia a mare	UO RADIOLOGIA	PRAIA A MARE	260,180.00	0.00
B64E22000870006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180114#CASA DELLA SALUTE DI CARIATI	UO RADIOLOGIA	CARIATI	260,180.00	0.00
B14E22000800006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	ECOTOMOGRAFI	002801#POLIAMBULATORIO DI CASSANO ALLO IONIO	AMBULATORIO ECOGRAFIA	CASSANO ALLO IONIO	82,000.00	0.00
B54E22000330006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180006#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTROVILLARI	UO RADIOLOGIA	CASTROVILLARI	80,000.00	0.00
B94E22000360006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	18001202#PRESIDIO OSPEDALIERO DI PAOLA	UO RADIOLOGIA	PAOLA	260,180.00	0.00
B34E22000680006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	RMN A 1,5 T	18001002#PRESIDIO OSPEDALIERO ROSSANO	UO RADIOLOGIA	ROSSANO	914,000.00	0.00
B54E22000320006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	MAMMOGRAFI	180006#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTROVILLARI	UO RADIOLOGIA	CASTROVILLARI	280,000.00	0.00
B24E22000450006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180011#PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACRI	UO RADIOLOGIA	ACRI	260,180.00	0.00
B94E22000370006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (bis)	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	18001202#PRESIDIO OSPEDALIERO DI PAOLA	UO RADIOLOGIA	PAOLA	260,180.00	0.00
B54E22000270006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (ter)	ECOTOMOGRAFI	180006#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTROVILLARI	UO CARDIOLOGIA	CASTROVILLARI	82,000.00	0.00
B34E22000530006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (ter)	ECOTOMOGRAFI	18001002#PRESIDIO OSPEDALIERO ROSSANO	UO CARDIOLOGIA	ROSSANO	82,000.00	0.00
B84E22000430006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (ter)	ECOTOMOGRAFI	008600#POLIAMBULATORIO DI COSENZA	AMBULATORIO ECOGRAFIA	COSENZA	82,000.00	0.00
B94E22000280006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (ter)	ECOTOMOGRAFI	18001202#PRESIDIO OSPEDALIERO DI PAOLA	UO CARDIOLOGIA	PAOLA	82,000.00	0.00
B34E22000540006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (ter)	ECOTOMOGRAFI	18001002#PRESIDIO OSPEDALIERO ROSSANO	UO CARDIOLOGIA	ROSSANO	82,000.00	0.00
B84E22000420006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (ter)	ECOTOMOGRAFI	008600#POLIAMBULATORIO DI COSENZA	RADIOLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
B54E22000280006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (ter)	ECOTOMOGRAFI	180006#PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTROVILLARI	UO CARDIOLOGIA	CASTROVILLARI	82,000.00	0.00
B94E22000290006	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO (ter)	ECOTOMOGRAFI	18001202#PRESIDIO OSPEDALIERO DI PAOLA	UO CARDIOLOGIA	PAOLA	82,000.00	0.00
E14E22000760006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	GERIATRIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E14E22000710006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	MAMMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	SCREENING	CROTONE	274,500.00	0.00
E14E22000790006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	CARDIOLOGIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E14E22000800006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	CARDIOLOGIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E14E22000770006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	RADIOLOGIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E14E22000720006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	MAMMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	SCREENING	CROTONE	274,500.00	0.00
E14E22000730006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	NEONATOLOGIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E64E22001100006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	RADIOLOGIA	CROTONE	244,000.00	0.00
E84E22000340006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	UROLOGIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E14E22000750006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	PEDIATRIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E84E22000400006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	GINECOLOGIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E14E22000740006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	RADIODIAGNOSTICA	CROTONE	82,000.00	0.00

E14E22000830006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	RADIOLOGIA	CROTONE	73,200.00	0.00
E14E22000810006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	GINECOLOGIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E14E22000700006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	TAC A 128 STRATI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	RADIOLOGIA	CROTONE	530,000.00	0.00
E14E22000780006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	CARDIOLOGIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E84E22000350006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	CARDIOLOGIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E64E22001020006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	RADIOLOGIA	CROTONE	82,000.00	0.00
E14E22000820006	A.S.P. CROTONE - RUP: SOLANO INVAN GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180032#OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE	RADIOLOGIA	CROTONE	247,700.00	0.00
E64E22001090006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180033#PO LAMEZIA TERME	CARDIOLOGIA	LAMEZIA TERME	82,000.00	0.00
E84E22000440006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180033#PO LAMEZIA TERME	RADIOLOGIA	LAMEZIA TERME	244,000.00	0.00
E64E22001050006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180203#POLO SANITARIO TERRITORIALE DI CATANZARO LIDO	RADIOLOGIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
E84E22000450006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180033#PO LAMEZIA TERME	RADIOLOGIA	LAMEZIA TERME	244,000.00	0.00
E44E22000320006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180040#PO DI SOVERIA MANNELLI	RADIOLOGIA	SOVERIA MANNELLI	247,700.00	0.00
E84E22000410006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180033#PO LAMEZIA TERMA	PRONTO SOCCORSO	LAMEZIA TERME	247,700.00	0.00
E84E22000370006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180033#PO LAMEZIA TERME	CARDIOLOGIA	LAMEZIA TERME	82,000.00	0.00
E64E22001070006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180203#POLO SANITARIO DI CATANZARO LIDO	CARDIOLOGIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
E84E22000360006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180033#PO LAMEZIA TERME	RADIOLOGIA	LAMEZIA TERME	82,000.00	0.00
E64E22001010006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180203#POLO SANITARIO DI CATANZARO	INTERNISTICA	CATANZARO	82,000.00	0.00
E84E22000430006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180033#PO LAMEZIA TERME	PRONTO SOCCORSO	LAMEZIA TERME	280,600.00	0.00
E34E22000360006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180055#PO BASSO IONIO - SOVERATO	RADIOLOGIA	SOVERATO	82,000.00	0.00
E64E22001000006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180203#CONSULTORIO CATANZARO	GINECOLOGIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
E64E22001040006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180203#POLO SANITARIO DI CATANZARIO	CARDIOLOGIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
E84E22000380006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180033#PO LAMEZIA TERME	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAMEZIA TERME	82,000.00	0.00
E34E22000350006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180203#POLO SANITARIO TERITORIALE DI SOVERATO	CONSULTORIO	SOVERATO	82,000.00	0.00
E64E22001080006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180203#POLO SANITARIO DI GIRIFALCO	RADIOLOGIA	GIRIFALCO	82,000.00	0.00
E84E22000390006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180033#PO LAMEZIA TERME	RADIOLOGIA	LAMEZIA TERME	247,700.00	0.00
E64E22001030006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180203#POLO SANITARIO DI CATANZARO	CARDIOLOGIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
E64E22001060006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180203#POLO SANITARIO DI CATANZARO LIDO	ENDOSCOPIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
E34E22000370006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180055#PO BASSO IONIO - SOVERATO	RADIOLOGIA	SOVERATO	247,700.00	0.00
E84E22000420006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180033#PO LAMEZIA TERME	PRONTO SOCCORSO	LAMEZIA TERME	280,600.00	0.00
E34E22000380006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180055#PO BASSO IONIO - SOVERATO	RADIOLOGIA	SOVERATO	244,000.00	0.00
E44E22000330006	A.S.P. CATANZARO - RUP: ROMANO GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180040#PO SOVERIA MANNELLI	PRONTO SOCCORSO	SOVERIA MANNELLI	280,600.00	0.00
J44E22003340006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180034#OSPEDALE VIBO	RADIOLOGIA	VIBO VALENTIA	247,700.00	0.00
J64E22000310006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180056#Soriano Calabro	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SORIANO CALABRO	82,000.00	0.00
J44E22003270006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	000100#Vibo Valentia	MODERATA DURANT CONSULTORIO F	VIBO VALENTIA	82,000.00	0.00

J64E22000300006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180056#Soriano Calabro	ENDOCRINOLOGIA	SORIANO CALABRO	82,000.00	0.00
J34E22001190006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180057#Serra San Bruno	Radiologia	SERRA SAN BRUNO	82,000.00	0.00
J34E22001200006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180057#Serra San Bruno	RADIOLOGIA	SERRA SAN BRUNO	73,200.00	0.00
J44E22003220006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180035#Tropea	Radiologia	TROPEA	82,000.00	0.00
J44E22003350006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180034#OSPEDALE VIBO	RADIOLOGIA	VIBO VALENTIA	247,700.00	0.00
J64E22000290001	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	MAMMOGRAFI	180056#Soriano Calabro	Radiologia	SORIANO CALABRO	274,500.00	0.00
J44E22003330006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	003300#Nicotera	RADIOLOGIA	NICOTERA	247,700.00	0.00
J14E22000180006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	MAMMOGRAFI	180035#Tropea	Radiologia	TROPEA	274,500.00	0.00
J44E22003210006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180204#CASA CIRCONDARIALE VIBO	AMBULATORIO ECOGRAFIA	VIBO VALENTIA	82,000.00	0.00
J14E22000200006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180035#Tropea	RADIOLOGIA	TROPEA	247,700.00	0.00
J44E22003280006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180034#OSPEDALE VIBO	U.T.I.C.	VIBO VALENTIA	82,000.00	0.00
J64E22000320006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180056#Soriano Calabro	OSTETRICIA GINECOLOGIA	SORIANO CALABRO	48,800.00	0.00
J44E22003260006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180034#OSPEDALE VIBO	OSTETRICIA GINECOLOGIA	VIBO VALENTIA	82,000.00	0.00
J44E22003290006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180034#OSPEDALE VIBO	U.T.I.C.	VIBO VALENTIA	82,000.00	0.00
J44E22003310006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180034#OSPEDALE VIBO	OSTETRICIA GINECOLOGIA	VIBO VALENTIA	82,000.00	0.00
J44E22003240006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180034#OSPEDALE VIBO	OSTETRICIA GINECOLOGIA	VIBO VALENTIA	82,000.00	0.00
J44E22003360006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180204#Casa Circondariale Vibo	AMBULATORIO RADIOLOGICO	VIBO VALENTIA	73,200.00	0.00
J44E22003320006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180204#Casa Circondariale Vibo	AMBULATORIO RADIOLOGICO	VIBO VALENTIA	247,700.00	0.00
J94E22001000006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	003300#Nicotera	I PIANO AMBULATORIO ECOGRAFICO	NICOTERA	82,000.00	0.00
J44E22003230004	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180034#OSPEDALE VIBO	Medicina Generale	VIBO VALENTIA	82,000.00	0.00
J44E22003250006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	000100#Vibo Valentia	MODERATA DURANT AMB. ECO	VIBO VALENTIA	82,000.00	0.00
J44E22003300006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180034#OSPEDALE VIBO	OSTETRICIA GINECOLOGIA	VIBO VALENTIA	82,000.00	0.00
J14E22000190006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	ECOTOMOGRAFI	180035#Tropea	CARDIOLOGIA	TROPEA	82,000.00	0.00
J94E22001010006	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: ZAPPONE ALFONSO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	003300#Nicotera	RADIOLOGIA	NICOTERA	48,800.00	0.00
G34E22000200006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	010000#Polo Sanitario Territoriale Reggio Calabria nord	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	36,600.00	0.00
G19J21015650006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180059#PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI	CARDIOLOGIA	LOCRI	82,000.00	0.00
G84E22000130006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180062#P.O. TIBERIO EVOLI DI MELITO DI PORTO SALVO	RADIOLOGIA	MELITO PORTO SALVO	247,700.00	0.00
G84E22000140006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180062#P.O. TIBERIO EVOLI DI MELITO DI PORTO SALVO	GERIATRIA	MELITO PORTO SALVO	82,000.00	0.00
G34E22000280006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	010000#Polo Sanitario Territoriale Reggio Calabria nord	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	244,000.00	0.00
G14E22000150006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180061#PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI UNGHERESI DI POLISTENA	RADIOLOGIA	POLISTENA	82,000.00	0.00
G79J22001240006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	MAMMOGRAFI	180069#CASA DELLA SALUTE DI SCILLA	RADIOLOGIA	SCILLA	274,500.00	0.00
G74E22000730006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180069#CASA DELLA SALUTE DI SCILLA	CARDIOLOGIA	SCILLA	82,000.00	0.00
G14E22000200006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180059#PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI	RADIOLOGIA	LOCRI	82,000.00	0.00
G84E22000120006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180062#P.O. TIBERIO EVOLI DI MELITO DI PORTO SALVO	RADIOLOGIA	MELITO PORTO SALVO	73,200.00	0.00

G54E22000100006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180068#PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI XIII GIOIA TAURO	RADIOLOGIA	GIOIA TAURO	247,700.00	0.00
G14E22000110006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180059#PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI	RADIOLOGIA	LOCRI	73,200.00	0.00
G14E22000220006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180059#PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI	CHIRURGIA GENERALE	LOCRI	82,000.00	0.00
G84E22000160006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180062#P.O. TIBERIO EVOLI DI MELITO DI PORTO SALVO	RADIOLOGIA	MELITO PORTO SALVO	82,000.00	0.00
G14E22000140006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180061#PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI UNGHERESI DI POLISTENA	RADIOLOGIA	POLISTENA	247,700.00	0.00
G14E22000130006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180059#PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI	RADIOLOGIA	LOCRI	247,700.00	0.00
G19J22001500006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	MAMMOGRAFI	100006#CASA DELLA SALUTE DI SIDERNO	RADIOLOGIA	SIDERNO	274,500.00	0.00
G54E22000110006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180068#PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI XIII GIOIA TAURO	RADIOLOGIA	GIOIA TAURO	82,000.00	0.00
G84E22000240006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180062#P.O. TIBERIO EVOLI DI MELITO DI PORTO SALVO	MEDICINA	MELITO PORTO SALVO	82,000.00	0.00
G14E22000160006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180059#PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LOCRI	82,000.00	0.00
G84E22000250006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180062#P.O. TIBERIO EVOLI DI MELITO DI PORTO SALVO	UROLOGIA	MELITO PORTO SALVO	82,000.00	0.00
G74E22000670004	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180069#CASA DELLA SALUTE DI SCILLA	RADIOLOGIA	SCILLA	244,000.00	0.00
G14E22000170006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180061#PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI UNGHERESI DI POLISTENA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	POLISTENA	82,000.00	0.00
G64E22000150006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180009#DISTRETTO SANITARIO TAURIANOVA	RADIOLOGIA	TAURIANOVA	36,600.00	0.00
G54E22000120006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180068#PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI XIII GIOIA TAURO	MEDICINA	GIOIA TAURO	82,000.00	0.00
G84E22000150006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180062#P.O. TIBERIO EVOLI DI MELITO DI PORTO SALVO	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MELITO PORTO SALVO	82,000.00	0.00
G14E22000190006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180059#PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI	CARDIOLOGIA UTIC	LOCRI	82,000.00	0.00
G14E22000120006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	100006#CASA DELLA SALUTE DI SIDERNO	RADIOLOGIA	SIDERNO	244,000.00	0.00
G14E22000210006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180059#PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI	PEDIATRIA	LOCRI	82,000.00	0.00
G14E22000230006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO	ECOTOMOGRAFI	180059#PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOCRI	UROLOGIA	LOCRI	82,000.00	0.00
G34E22000290006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	016700#POLO SANITARIO TERRITORIALE REGGIO SUD	ECOGRAFIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G34E22000340006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	008200#PRESIDIO POLISPECIALISTICO GALLICO	ASS. SANITARIA DI BASE	GALLICO	82,000.00	0.00
G64E22000170006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	180006#CAPT TAURIANOVA	DIALISI	TAURIANOVA	82,000.00	0.00
G14E22000250006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	180061#PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI UNGHERESI DI POLISTENA	CARDIOLOGIA	POLISTENA	82,000.00	0.00
G24E22000350006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	015800#POLIAMBULATORIO SALINE JONICHE	ECOGRAFIA	SALINE JONICHE	82,000.00	0.00
G14E22000270006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	000200#POLIAMBULATORIO BAGNARA CALABRA	ASS. SANITARIA DI BASE	BAGNARA CALABRA	82,000.00	0.00
G94E22000200006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	180008#STRUTTURA POLISPECIALISTICA TERRITORIALE DI ROSARNO	ECOGRAFIA	ROSARNO	82,000.00	0.00
G34E22000300006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	000200#POLIAMBULATORIO S. EUFEMIA D'ASPROMONTE	ECOGRAFIA	S.EUFEMIA D'ASPROMONTE	82,000.00	0.00
G34E22000350006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	010000#POLO SANITARIO TERRITORIALE REGGIO NORD	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G74E22000680006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	180069#CASA DELLA SALUTE DI SCILLA	GINECOLOGIA - ECOGRAFIA	SCILLA	82,000.00	0.00
G14E22000240006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	180061#PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI UNGHERESI DI POLISTENA	PRONTO SOCCORSO	POLISTENA	82,000.00	0.00
G14E22000290006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	180061#PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI UNGHERESI DI POLISTENA	MEDICINA	POLISTENA	82,000.00	0.00
G64E22000180006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	100002#POLIAMBULATORIO BOVALINO	ECOGRAFIA	BOVALINO	82,000.00	0.00

G14E22000180006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	100006#CASA DELLA SALUTE DI SIDERNO	RADIOLOGIA	SIDERNO	82,000.00	0.00
G64E22000190006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	180060#CAPT DI PALMI	NEFROLOGIA E DIALISI	PALMI	82,000.00	0.00
G64E22000160006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	180009#STRUTTURA POLISPECIALISTICA TAURIANOVA	ECOGRAFIA	TAURIANOVA	82,000.00	0.00
G14E22000260006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	180061#PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI UNGHERESI DI POLISTENA	CARDIOLOGIA	POLISTENA	82,000.00	0.00
G84E22000180006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	014500#STRUTTURA POLISPECIALISTICA EX INAM MELITO DI PORTO SALVO	ECOGRAFIA	MELITO PORTO SALVO	82,000.00	0.00
G94E22000160006	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MINNITI CARMELO (bis)	ECOTOMOGRAFI	011800#STRUTTURA POLISPECIALISTICA VILLA SAN GIOVANNI	ECOGRAFIA	VILLA SAN GIOVANNI	82,000.00	0.00
F84E22001770006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001800006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	TAC A 128 STRATI	180912#Azienda Ospedaliera COSENZA P.O. Annunziata	radiologia	COSENZA	649,862.00	0.00
F84E22001600006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	ENDOCRINOLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001640006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	CARDIOLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001660006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	AMBULATORIO DI UROLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001620006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	ONCOLOGIA GINECOLOGICA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001330006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA PO ANNUNZIATA	RADIOLOGIA	COSENZA	247,700.00	0.00
F54E22000530006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. SANTA BARBARA DI ROGLIANO CS	RADIOLOGIA	ROGLIANO	280,600.00	0.00
F84E22001730006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	CARDIOLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001720006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	CARDIOLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001670006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	ONCOLOGIA SENOLOGICA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001760006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001630006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	MEDICINA GENERALE REUMATOLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001690006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	CARDIOLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
F54E22000540006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. SANTA BARBARA DI ROGLIANO CS	SALA OPERATORIA ROGLIANO	ROGLIANO	82,000.00	0.00
F84E22001590006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	RADIOLOGIA	COSENZA	48,800.00	0.00
F84E22001710006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	CARDIOLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001780006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	GAMMA CAMERE	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. MARIANO SANTO	MEDICINA NUCLEARE	COSENZA	525,000.00	0.00
F84E22001400006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	RADIOLOGIA	COSENZA	280,600.00	0.00
F84E22001250006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	RADIOLOGIA	COSENZA	247,700.00	0.00
F84E22001580006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	RADIOLOGIA	COSENZA	247,700.00	0.00
F84E22001740006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
F84E22001680006	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: GAGLIARDI GIUSEPPE	ECOTOMOGRAFI	180912#AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.O. ANNUNZIATA	NEUROLOGIA	COSENZA	82,000.00	0.00
J64E22000690006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Radiologia	CATANZARO	247,700.00	0.00
J64E22000430006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ECOTOMOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Pediatria Aziendale	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000330006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	TAC A 128 STRATI	180913#PRESIDIO OSPEDALIERO PUGLIESE	Radiologia	CATANZARO	530,000.00	0.00
J64E22000420006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ECOTOMOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Chirurgia Generale	CATANZARO	82,000.00	0.00

J64E22000390006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ECOTOMOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Radiologia	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000440006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ECOTOMOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Malattie Infettive	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000340006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	TAC A 128 STRATI	180913#PRESIDIO OSPEDALIERO DE LELLIS	Radioterapia	CATANZARO	530,000.00	0.00
J64E22000370006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ANGIOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Cardiologia	CATANZARO	608,000.00	0.00
J64E22000650006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180913#PRESIDIO DE LELLIS	Radiologia	CATANZARO	73,200.00	0.00
J64E22000630006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ECOTOMOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Cardiologia	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000660006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Radiologia	CATANZARO	244,000.00	0.00
J64E22000380006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ECOTOMOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Radiologia	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000680006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Radiologia	CATANZARO	247,700.00	0.00
J64E22000620006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ECOTOMOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Cardiologia	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000610006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ECOTOMOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Cardiologia	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000350006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ACCELERATORI LINEARI	180913#PRESIDIO DE LELLIS	Radioterapia	CATANZARO	2,295,000.00	0.00
J64E22000400006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	ECOTOMOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Radiologia	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000670006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180913#PRESIDIO DE LELLIS	Radiologia	CATANZARO	244,000.00	0.00
J64E22000640006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Radiologia	CATANZARO	73,200.00	0.00
J64E22000360006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	MAMMOGRAFI	180913#PRESIDIO PUGLIESE	Radiologia	CATANZARO	274,500.00	0.00
J64E22000570006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	RADIOLOGIA	CATANZARO	36,600.00	0.00
J64E22000460006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	ECOTOMOGRAFI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	CHIRURGIA VASCOLARE	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000500006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	ECOTOMOGRAFI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000580006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	RADIOLOGIA	CATANZARO	244,000.00	0.00
J64E22000560006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	RADIOLOGIA	CATANZARO	247,700.00	0.00
J64E22000520006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	ECOTOMOGRAFI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	CARDIOLOGIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000490006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	ECOTOMOGRAFI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	RADIOLOGIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000540006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	ECOTOMOGRAFI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000450006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	ECOTOMOGRAFI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	GERIATRIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000470006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	ECOTOMOGRAFI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	UROLOGIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000480006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	ECOTOMOGRAFI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000530006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	ECOTOMOGRAFI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	CARDIOLOGIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000590006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	RADIOLOGIA	CATANZARO	244,000.00	0.00
J64E22000550006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	RADIOLOGIA	CATANZARO	247,700.00	0.00
J64E22000510006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	ECOTOMOGRAFI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	CARDIOCHIRURGIA	CATANZARO	82,000.00	0.00
J64E22000600006	A.O. MATER DOMINI CATANZARO - RUP: ARGIRO' GIANFRANCO	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	180914#PRESIDIO OSPEDALIERO GERMANETO	RADIOLOGIA	CATANZARO	244,000.00	0.00
G39J22001950006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	PRONTO SOCCORSO	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002070006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091502#PRESIDIO OSPEDALIERO MORELLI	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00

G39J22002120006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	Nefrologia	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22001980006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G34E22000260006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	TAC A 128 STRATI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	NEURORADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	530,000.00	0.00
G39J22002110006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	Chirurgia generale	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002060006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002080006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	GASTROENTEROLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G34E22000240006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	73,200.00	0.00
G39J22001970006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	NEONATOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G34E22000180006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	18091502#PRESIDIO OSPEDALIERO MORELLI	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	247,700.00	0.00
G39J22002090006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	MALATTIE INFETTIVE	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G34E22000190006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	18091502#PRESIDIO OSPEDALIERO MORELLI	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	247,700.00	0.00
G34E22000220006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	MAMMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	274,500.00	0.00
G39J22002150006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	CARDIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002020006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	MALATTIE INFETTIVE	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002050006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	UROLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G34E22000270006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	TAC A 128 STRATI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	530,000.00	0.00
G39J22001990006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	BLOCCO OPERATORIO	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G34E22000160006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	NEURORADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	247,700.00	0.00
G39J22002040006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091502#PRESIDIO OSPEDALIERO MORELLI	MEDICINA GENERALE	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002100006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	Gastroenterologia	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002160006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PREDISIO OSPEDALIERO RIUNITI	CARDIOCHIRURGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002010006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	CHIRURGIA VASCOLARE	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G34E22000210006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	247,700.00	0.00
G39J22002130006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	UROLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G34E22000170006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	247,700.00	0.00
G34E22000250006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	RADIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	244,000.00	0.00

G39J22001960006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002030006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	NEFROLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002230006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA (bis)	ECOTOMOGRAFI	18091502#PRESIDIO OSPEDALIERO MORELLI	CARDIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002180006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA (bis)	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	CARDIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002170006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA (bis)	ECOTOMOGRAFI	18091502#PRESIDIO OSPEDALIERO MORELLI	CARDIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002190006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA (bis)	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	CARDIOCHIRURGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002250006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA (bis)	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	Cardiologia	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G38I22000350006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA (bis)	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	CARDIOCHIRURGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002210006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA (bis)	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	CARDIOCHIRURGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002200006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA (bis)	ECOTOMOGRAFI	18091501#PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	CARDIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00
G39J22002240006	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: MAIOLINO GIANLUCA (bis)	ECOTOMOGRAFI	18091502#PRESIDIO OSPEDALIERO MORELLI	CARDIOLOGIA	REGGIO CALABRIA	82,000.00	0.00

Dati relativi a "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)" aggiornati al 18/05/2022 21:05

	Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)						
CUP	**ENTE del SSR [inserire Regione/PP.AA.]**	**Presidio Ospedaliero**	**Comune**	**Provincia**	**Indirizzo**	**MPORTO INTERVENTO PNRR**	**IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)**
F55F22000610001	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: MARSICO EUGENIO	P.O. S. Barbara di Rogliano	ROGLIANO	COSENZA	Luigi Sturzo ,snc	2,664,520.00	0.00
J65F22000510006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	P.O. "PUGLIESE" - PALAZZINA POLIAMBULATORIO	CATANZARO	CATANZARO	Viale PIO X ,snc	1,478,654.00	0.00
J65F22000500006	Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio - RUP: GIOVANNI ROMANO	P.O. "PUGLIESE" - PADIGLIONE MALATTIE INFETTIVE	CATANZARO	CATANZARO	Viale Pio X ,snc	2,031,632.00	0.00
G55F21001390001	A.S.P. REGGIO CALABRIA - RUP: MITTIGA ROBERTO	Ospedale Sicuro - Presidio Ospedaliero "Giovanni XXIII° di Gioia Tauro	GIOIA TAURO	REGGIO DI CALABRIA	Madame Curiè ,snc	3,194,525.00	0.00
J45F22000370005	A.S.P. VIBO VALENTIA - RUP: SORIANO MICHELA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIBO VALENTIA JAZZOLINO	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	PIAZZA FLEMING ,SNC	10,804,607.00	10,804,608.00
G35F22000470001	Azienda Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli - RUP: GIOVINAZZO FRANCESCO	Corpo A degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria	REGGIO DI CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	Via G. Melacrino ,21	3,868,800.00	0.00

Dati relativi a "Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)" aggiornati al 18/05/2022 21:05

	Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC)						
CUP	**ENTE del SSR [inserire Regione/PP.AA.]**	**Presidio Ospedaliero**	**Comune**	**Provincia**	**Indirizzo**	**MPORTO INTERVENTO PNC**	**IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)**
F85F22001470001	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: ESPOSITO GIULIANO	VECCHIO PLESSO 1939	COSENZA	COSENZA	FELICE MIGLIORI ,SNC	15,335,780.00	0.00
B12C22000180001	A.S.P. COSENZA - RUP: ABATE GIANFRANCO	Ospedale Sicuro e Sostenibile Ospedale Civile di PRAIA A MARE	PRAIA A MARE	COSENZA	Località S. Stefano ,2	5,665,400.00	0.00
B52C22000160001	A.S.P. COSENZA - RUP: ABATE GIANFRANCO	Ospedale Sicuro e Sostenibile OSPEDALE CIVILE "G. CHIDICHIMO" DI TREBISACCE	TREBISACCE	COSENZA	VIA PIERRE E MARIE CURIE ,snc	1,084,450.00	0.00
B12C22000170001	A.S.P. COSENZA - RUP: CAPRISTO ANTONIO	Presidio Ospedaliero di San Giovanni in Fiore	SAN GIOVANNI IN FIORE	COSENZA	Via Gramsci ,snc	5,638,280.00	0.00
E85F22000580006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME (POLT)	LAMEZIA TERME	CATANZARO	ARTURO PERUGINI ,SNC	18,192,410.00	0.00
E35F22000450006	A.S.P. CATANZARO - RUP: BENVENUTO MAURIZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO SOVERATO (POSO)	SOVERATO	CATANZARO	DE CARDONA ,98	5,095,268.00	0.00
F88122000540001	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA - RUP: FRUGIUELE CARLO	Edificio Malattie Infettive	COSENZA	COSENZA	della Repubblica ,snc	3,558,201.00	0.00

Dati relativi a "Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC)" aggiornati al 18/05/2022 21:05

Allegato 3

Tabelle “non arrecare danno significativo”

Tabella 3 Dettaglio DNSH Componente 1 –Investimento 1.1

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
1. Mitigazione del cambiamentoclimatico	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?	NO	La misura è assegnabile al campo di intervento 025ter "Costruzione di nuovi edifici energeticamente efficienti" nell'allegato del regolamento RRF, con un coefficiente di cambiamento climatico del 40%. L'edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazioni energetiche ed emissioni di CO2 e con un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali). Non si prevede che la misura comporti significative emissioni di gas serra in quanto: - l'edificio non è destinato all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili; - il programma di interventi riguarda la costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica caratterizzati da un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto ai requisiti degli edifici NZEB, ed è quindi compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra e di neutralità climatica. In questo senso, la misura contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di aumento annuale dell'efficienza energetica stabilito dalla direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e permetterà il rispetto degli accordi dichiarati a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima.
2. Adattamento al cambiamentoclimatico	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?	NO	La misura consiste nell'implementazione delle Case della Comunità, che non incidono significativamente sui meccanismi che portano al cambiamento climatico.L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) permetterà di ridurre l'impatto ambientale delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e della manutenzione degli edifici, considerando il loro ciclo di vita. Gli interventi saranno realizzati prevedendo tra i criteri minimi o premianti di scelta dell'operatore economico l'adozione di sistemi di gestione ISO 14001 o Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). La misura richiederà agli operatori economici, attraverso specifiche clausole nei bandi di gara e nei contratti, di ottimizzare i nuovi edifici in termini di sistemi tecnici e soluzioni impiantistiche utilizzando le migliori tecnologie possibili, al fine di garantire il comfort termico agli occupanti anche a temperature estreme. Non vi è quindi evidenza di effetti negativi significativi legati agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita in relazione a questo obiettivo ambientale.

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e le falde acquifere; o (ii) al buono stato ambientale delle acque marine?	NO	L'utilizzo del GPP consentirà di ridurre l'impatto ambientale delle nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni di edifici, lungo il ciclo di vita. I progetti degli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione dovranno prevedere la raccolta delle acque piovane per l'irrigazione e/o la depurazione sanitaria, attuata con sistemi realizzati secondo le norme UNI/TS 11445 "Sistemi per la raccolta e l'utilizzo delle acque piovane per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e UNI EN 805 "Approvvigionamento idrico - Requisiti per sistemi e componenti esterni agli edifici" o norme equivalenti. Tutti gli apparecchi idrici interessati (box doccia, miscelatore, rubinetteria, wc, vasi e cassette di risciacquo, orinatoi, vasche da bagno) devono rientrare nelle prime 2 classi per consumo d'acqua dell'EU Water Label.La misura risponde ai criteri di GPP in conformità con le direttive nazionali vigenti (CAM-Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia - D.M. 11.10.2017) e rispetta i principi della sostenibilità dei prodotti e della gerarchia dei rifiuti, con priorità sulla riduzione dei rifiuti e su una gestione incentrata sulla preparazione, il riutilizzo e il riciclo dei materiali. La misura coprirà anche i costi per la gestione sostenibile dei rifiuti da costruzione e da demolizione e per l'utilizzo di aggregati riciclati, garantendo il rispetto dei livelli di prestazione ambientale previsti anche attraverso una specifica rendicontazione dei materiali utilizzati dagli operatori economici aggiudicatari delle attività.Elementi della misura prevedevano, per la selezione degli operatori economici, l'utilizzo di criteri premianti finalizzati al miglioramento dei livelli di prestazione ambientale del progetto e testati sulla certificazione ISO 14001 e/o sulla registrazione EMAS degli operatori.Inoltre, attraverso specifiche clausole nelle gare d'appalto e nei contratti, sarà richiesto agli operatori economici che ristrutturano edifici di garantire che una quota significativa dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione (escluso il materiale allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere saranno preparati per il riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti per sostituire altri materiali.
4. Economia circolare, compresa la	D. No, la misura richiede una	"Si prevede che la misura: (i) comporti un		NO	"La misura risponde al GPP (Green Public Procurement).

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	valutazione sostanziale del DNSH.	aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) porti a significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del suo ciclo di vita che non siano minimizzate da misure adeguate; o (iii) causare un danno significativo e a			La misura richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70% (del peso) della costruzione e dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE) generati durante le operazioni, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità con la gerarchia dei rifiuti e il protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Saranno previste aree appropriate da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti generati dai cantieri."

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
		lungo termine all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27 della tassonomia)?"			
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.	Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		NO	"Non si prevede che la misura determini un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché gli operatori che eseguono miglioramenti strutturali di sicurezza alle strutture ospedaliere utilizzeranno solo: - materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC); - sostanze che non sono di grande preoccupazione, come identificate in base alla ""Lista di autorizzazione"" REACH. - misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione; - misure per ridurre le emissioni di polvere e di sostanze inquinanti durante la costruzione. La misura è conforme ai piani nazionali e regionali di riduzione dell'inquinamento esistenti. Inoltre, si prevede che la misura non porterà a un aumento significativo delle emissioni di sostante inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché: - gli operatori incaricati della costruzione dell'edificio saranno tenuti a utilizzare componenti e materiali da costruzione che non contengono amianto o sostanze estremamente preoccupanti incluse nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006;

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
					- l'area del terreno del nuovo edificio si trova all'interno di un'area già edificata e quindi, presumibilmente, priva di sostanze potenzialmente contaminanti; - saranno adottate misure per ridurre le emissioni di rumore e le emissioni di polveri e sostanze inquinanti durante i lavori di costruzione. Si garantisce inoltre che: - i componenti e i materiali da costruzione non contengono amianto o sostanze estremamente preoccupanti come individuate sulla base della lista di autorizzazione del regolamento europeo REACH; -saranno messe in atto, per quanto possibile, azioni volte all'utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale valutato in termini di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA) come certificato da dichiarazioni rilasciate da enti indipendenti credibili e riconosciuti (Ecolabel UE o altre etichette ambientali di tipo I, EPD o altre etichette ambientali di tipo III)."
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle		NO	"La nuova costruzione non sarà realizzata su aree naturali protette, come i terreni designati come Natura 2000, patrimonio mondiale dell'UNESCO e aree chiave di biodiversità (KBA), o equivalenti al di fuori dell'UE, come definito dall'UNESCO e/o dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) nelle seguenti categorie: - Categoria Ia: Riserva Naturale Integrale - Categoria Ib: Area selvaggia - Categoria II: Parco Nazionale La nuova costruzione non sarà realizzata su terreni arabili o verdi ad alto valore di biodiversità riconosciuto e terreni che servono come habitat di specie in pericolo (flora e fauna) elencate nella Lista Rossa Europea e/o nella Lista Rossa IUCN. Almeno l'80% di tutti i prodotti in legno utilizzati

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
		di interesse dell'Unione Europea?			nella nuova costruzione per le strutture e nelle ristrutturazioni, nei rivestimenti e nelle finiture saranno riciclati/riutilizzati o saranno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile come certificato da audit di certificazione di terze parti eseguiti da enti di certificazione accreditati, ad esempio gli standard FSC/PEFC o equivalenti. "

Tabella 4 Dettaglio DNSH Componente 1 – Investimento 1.2

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
1. Mitigazione del cambiamentoclimatico	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?	NO	L'attività si riferisce ai campi di intervento dell'allegato 6 del regolamento UE sull'RRF 094 con un coefficiente di cambiamento climatico dello 0%. L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti per tutto il ciclo di vita. L'implementazione di un nuovo modello organizzativo (Centri di Coordinamento Territoriale) si avvarrà di server gestiti secondo le "Linee guida sulle migliori pratiche 2019 per il codice di condotta UE sull'efficienza energetica dei centri dati (JRC)".
2. Adattamento al cambiamentoclimatico	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti diretti ed indiretti primari lungo il suo ciclo di vita. Gli strumenti di telemedicina e di assistenza integrata previsti saranno caratterizzati da un'elevata efficienza	Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
		energetica. Inoltre, lo strumento di telemedicina può essere considerato come un'attività che consente la riduzione dei rischi climatici.			
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti diretti e indiretti primari lungo il suo ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale legati alla conservazione della qualità	Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e le falde acquifere; o (ii) al buono stato ambientale delle acque marine?		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
		dell'acqua e allo stress idrico.			
4. Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	D. No, la misura richiede una valutazione DNSH sostanziale.		Si prevede che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) porti a significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del suo ciclo di vita che non siano minimizzate da	NO	"Si prevede che la misura non comporti un danno significativo a lungo termine dal punto di vista dell'economia circolare. I rifiuti prodotti dall'uso degli strumenti di telemedicina e di assistenza integrata sono raccolti e gestiti da un operatore autorizzato e trattati secondo la gerarchia dei rifiuti. I rifiuti prodotti dall'uso degli strumenti di telemedicina e di assistenza integrativa rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti RAEE, per cui si applica la responsabilità estesa del produttore, il quale, autonomamente o attraverso un consorzio, garantirà il corretto recupero dei dispositivi. In caso di acquisto di materiale AEE, si inserirà la richiesta di iscrizione del fornitore nel registro dei Produttori / distributori / manutentori al fine di garantire la corretta gestione degli eventuali rifiuti prodotti alla fine o all'inizio del ciclo in caso di sostituzione / rinnovo tecnico."

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
			misure adeguate; o (iii) causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27 della tassonomia)?"		
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale.	Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti diretti e indiretti primari lungo il suo ciclo di vita.	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse dell'Unione Europea?		

Tabella 5 Dettaglio DNSH Componente 1 – Investimento 1.3

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
1. Mitigazione del cambiamento climatico	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?	NO	La misura si riferisce anche alla costruzione di nuovi edifici e ai campi di intervento come indicato nell'allegato 6 del regolamento UE sul RRF 025ter (con un coefficiente climatico del 40%) e 092 (con un coefficiente climatico dello 0%). Il nuovo edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazioni energetiche ed emissioni di gas serra e con un fabbisogno di energia primaria di almeno il 20% inferiore al requisito per gli edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali). In questo senso, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale, all'aumento annuale dell'efficienza energetica stabilito dalla direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e permetterà il rispetto degli accordi dichiarati a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima.
2. Adattamento al cambiamento climatico	D. No, la misura richiede una valutazione DNSH sostanziale.		Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?	NO	"La misura consiste nella realizzazione di Ospedali di Comunità, che non incidono significativamente sui meccanismi che portano al cambiamento climatico. L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre l'impatto ambientale delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e della manutenzione degli edifici, lungo il ciclo di vita. Gli interventi saranno realizzati prevedendo tra i criteri minimi o premianti di scelta dell'operatore economico, l'adozione di Sistemi di Gestione ISO 14001 o Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Inoltre, sarà effettuata una specifica valutazione della vulnerabilità e del rischio climatico, relativa a inondazioni, neve, innalzamento del livello del mare, piogge, ecc. per identificare, selezionare e implementare le relative misure di adattamento, in accordo con l'UE."
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti	L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre gli impatti ambientali delle nuove costruzioni, delle	Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici,		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	ristrutturazioni e della manutenzione degli edifici, considerati nell'ottica del ciclo di vita. I progetti degli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione dovranno prevedere la raccolta delle acque piovane per l'irrigazione e/o la depurazione sanitaria, attuata con sistemi realizzati secondo le norme UNI/TS 11445 "Sistemi per la raccolta e l'utilizzo delle acque piovane per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e UNI EN 805 "Approvvigionamento idrico - Requisiti per	comprese le acque superficiali e le falde acquifere; o (ii) al buono stato ambientale delle acque marine?		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
		sistemi e componenti esterni agli edifici" o norme equivalenti. Tutti gli apparecchi idrici interessati (box doccia, miscelatore, rubinetteria, rubinetto miscelatore, wc, vasi e cassette di risciacquo, orinatoi e cassette di risciacquo, vasche da bagno) rientreranno nelle prime 2 classi di consumo d'acqua dell'EU Water Label.			
4. Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		"Si prevede che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad	NO	"La misura risponde al Green Public Procurement (GPP). La misura richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70% (del peso) della costruzione e dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE) generati durante le operazioni siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
			eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) porti a significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del suo ciclo di vita che non siano minimizzate da misure adeguate; o (iii) causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27		Saranno previste aree appropriate da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti generati dai cantieri."

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
			della tassonomia)?"		
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	D. No, la misura richiede una valutazione DNSH sostanziale.		Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	NO	"La misura non dovrebbe comportare un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché gli operatori che eseguono migliorie strutturali della sicurezza delle strutture ospedaliere useranno solo: - materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC); - sostanze che non sono di alta preoccupazione come identificate sulla base della ""Lista delle autorizzazioni""" del REACH. - misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione; - misure per ridurre le emissioni di polvere e sostanze inquinanti durante la costruzione."
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il ciclo di vita. Il programma coinvolge edifici esistenti per i quali è stata valutata l'ubicazione in aree	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	sensibili alla biodiversità (compresa la rete Natura 2000).	dell'Unione Europea?		

Tabella 6 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.1

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
1. Mitigazione del cambiamentoclimatico	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?	NO	"Le misure adottate per modernizzare gli asset tecnologici in essere presso le strutture ospedaliere non comportano un aumento significativo delle emissioni di gas serra, in quanto le nuove apparecchiature hanno una performance ambientale superiori a quelle che vanno a sostituire. La digitalizzazione dei processi clinici e assistenziali ospedalieri si avvarrà di server gestiti secondo le ""2019 Best PracticeGuidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency (JRC)"". I refrigeranti utilizzati nei sistemi di refrigerazione saranno conformi ai requisiti del regolamento UE sui gas fluorurati."
2. Adattamento al cambiamentoclimatico	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile rispetto a questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il suo ciclo di vita. L'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture	Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
		ospedaliere e la digitalizzazione dei processi clinici e assistenziali dell'ospedale saranno caratterizzati da un'elevata efficienza energetica.			
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il suo ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale legati alla conservazione della qualità dell'acqua e allo stress idrico.	Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e le falde acquifere; o (ii) al buono stato ambientale delle acque marine?		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
4. Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		"""Si prevede che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) porti a significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del suo ciclo di vita che non siano minimizzate da misure adeguate; o	NO	"Le misure adottate per ammodernare il parco tecnologico dovranno soddisfare i requisiti della direttiva europea sull'ecodesign. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono raccolti e gestiti da un operatore autorizzato e trattati secondo la gerarchia dei rifiuti secondo il D.Lgs. 118/2020. I rifiuti prodotti dall'ammodernamento del parco tecnologico rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti RAEE, pertanto si applica la responsabilità estesa del produttore che, autonomamente o tramite un consorzio, garantirà il corretto recupero dei dispositivi."

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
			(iii) causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27 della tassonomia)?"		
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'impatto previsto dell'attività sostenuta dalla misura su questo obiettivo ambientale è marginale.	Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		
6. Protezione e ripristino della	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
biodiversità e degli ecosistemi	sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	trascurabile rispetto a questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il suo ciclo di vita.	dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse dell'Unione Europea?		

Tabella 7 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.2

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
1. Mitigazione del cambiamentoclimatico	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?	NO	Le misure adottate per il miglioramento strutturale della sicurezza degli ospedali non aumentano significativamente le emissioni di gas serra, in quanto gli interventi garantiranno la massima efficienza energetica. I nuovi edifici saranno a energia quasi zero (NZEB).
2. Adattamento al cambiamentoclimatico	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	"La misura consiste in migliorie strutturali della sicurezza delle strutture ospedaliere, che non incidono significativamente sui meccanismi che portano al cambiamento climatico. L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre l'impatto ambientale delle nuove costruzioni, ristrutturazioni e	Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
		manutenzioni degli edifici, considerando il loro ciclo di vita. Gli interventi saranno realizzati prevedendo tra i criteri minimi o premianti per la scelta dell'operatore economico, l'adozione di Sistemi di Gestione ISO 14001 o Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)."			
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la	Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale legati alla conservazione della qualità dell'acqua e allo stress idrico.	Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.		e le falde acquifere; o (ii) al buono stato ambientale delle acque marine?		
4. Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		""Si prevede che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) porti a significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del	NO	"La misura risponde al GPP (Green Public Procurement). La misura richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70% (del peso) della costruzione e dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE) generati durante le operazioni siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Saranno previste aree appropriate da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti generati dai cantieri."

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
			suo ciclo di vita che non siano minimizzate da misure adeguate; o (iii) causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27 della tassonomia)?"		
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	NO	"La misura non dovrebbe comportare un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché gli operatori che eseguono migliorie strutturali della sicurezza delle strutture ospedaliere useranno solo: - materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC); - sostanze che non sono di grande preoccupazione, come identificate sulla base della ""Lista delle autorizzazioni"" del REACH; - misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione; - misure per ridurre le emissioni di polvere e sostanze inquinanti durante la costruzione.

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile non significativo su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il suo ciclo di vita. Il programma interessa edifici esistenti, per i quali è stata valutata l'ubicazione in aree sensibili alla biodiversità (compresa la rete Natura 2000).	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse dell'Unione Europea?		

Tabella 8 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.3

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
1. Mitigazione del cambiamentoclimatico	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?	NO	La misura si riferisce anche alla costruzione di nuovi edifici e ai campi di intervento come indicato nell'allegato 6 del regolamento UE sul RRF 025ter (con un coefficiente climatico del 40%) e 092 (con un coefficiente climatico dello 0%). Il nuovo edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazioni energetiche ed emissioni di gas serra e con un fabbisogno di energia primaria di almeno il 20% inferiore al requisito per gli edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali). In questo senso, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale, aumento annuale dell'efficienza energetica stabilito dalla direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e permetterà il rispetto degli accordi dichiarati a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima.
2. Adattamento al cambiamentoclimatico	D. No, la misura richiede una valutazione DNSH sostanziale.		Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?	NO	La misura consiste nella realizzazione di Ospedali di Comunità, che non incidono significativamente sui meccanismi che portano al cambiamento climatico. L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre l'impatto ambientale delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e della manutenzione degli edifici, lungo il ciclo di vita. Gli interventi saranno realizzati prevedendo tra i criteri minimi o premianti di scelta dell'operatore economico, l'adozione di Sistemi di Gestione ISO 14001 o Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Inoltre, sarà effettuata una specifica valutazione della vulnerabilità e del rischio climatico, relativa a inondazioni, neve, innalzamento del livello del mare, piogge, ecc. per identificare, selezionare e implementare le relative misure di adattamento, in accordo con l'UE.
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale,	L'utilizzo del GPP (Green Public Procurement) consentirà di ridurre gli impatti ambientali	Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto. conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e della manutenzione degli edifici, considerati nell'ottica del ciclo di vita. I progetti degli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione dovranno prevedere la raccolta delle acque piovane per l'irrigazione e/o la depurazione sanitaria, attuata con sistemi realizzati secondo le norme UNI/TS 11445 "Sistemi per la raccolta e l'utilizzo delle acque piovane per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e UNI EN 805	ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e le falde acquifere; o (ii) al buono stato ambientale delle acque marine?		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
		"Approvvigionamento idrico - Requisiti per sistemi e componenti esterni agli edifici" o norme equivalenti. Tutti gli apparecchi idrici interessati (box doccia, miscelatore, rubinetteria, rubinetto miscelatore, wc, vasi e cassette di risciacquo, orinatoi e cassette di risciacquo, vasche da bagno) rientreranno nelle prime 2 classi di consumo d'acqua dell'EU Water Label. primari diretti e indiretti.			
4. Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	D. No, la misura richiede una valutazione sostanziale del DNSH.		"Si prevede che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione,	NO	La misura risponde al Green Public Procurement (GPP). La misura richiede agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70% (del peso) della costruzione e dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
			dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) porti a significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del suo ciclo di vita che non siano minimizzate da misure adeguate; o (iii) causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente rispetto		europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE) generati durante le operazioni siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Saranno previste aree appropriate da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti generati dai cantieri.

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
			all'economia circolare (art. 27 della tassonomia)?"		
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	D. No, la misura richiede una valutazione DNSH sostanziale.		Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	NO	La misura non dovrebbe comportare un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo perché gli operatori che eseguono migliorie strutturali della sicurezza delle strutture ospedaliere useranno solo: - materiali da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC); - sostanze che non sono di alta preoccupazione come identificate sulla base della "Lista delle autorizzazioni"" del REACH. - misure per ridurre le emissioni di rumore durante la costruzione; - misure per ridurre le emissioni di polvere e sostanze inquinanti durante la costruzione.
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti lungo il ciclo di vita. Il programma coinvolge edifici esistenti per i quali è	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie,		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
	nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	stata valutata l'ubicazione in aree sensibili alla biodiversità (compresa la rete Natura 2000).	comprese quelle di interesse dell'Unione Europea?		

Tabella 9 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 2.2

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
1. Mitigazione del cambiamentoclimatico	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	"L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile ma trascurabile su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti."	Si prevede che la misura porti a significative emissioni di gas serra?		
2. Adattamento al cambiamentoclimatico	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH	La misura fornisce solo formazione e sviluppo di competenze tecnico-professionali, quindi non interagisce in modo significativo nei meccanismi di cambiamento climatico.	Si prevede che la misura porti ad un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni?		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
	nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.				
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile non significativo su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti.	Si prevede che la misura possa nuocere (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e le falde acquifere; o (ii) al buono stato ambientale delle acque marine?		
4. Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata	La misura non comporterà inefficienze significative nell'uso delle risorse né aumenterà la produzione di rifiuti.	"Si prevede che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
	conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.		dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) porti a significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi fase del suo ciclo di vita che non siano minimizzate da misure adeguate; o (iii) causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27 della tassonomia)?"		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	**Giustificazione se è stato scelto A, B o C**	**Domande**	**Si/No**	**Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO**
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.	La misura non comporta un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.	Si prevede che la misura porti a un aumento significativo delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale, relativamente agli effetti diretti ed indiretti primari della misura nel suo ciclo di vita, data la sua natura. Pertanto, la misura è considerata conforme al DNSH	L'attività sostenuta dalla misura ha un impatto prevedibile non significativo su questo obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti primari diretti e indiretti.	Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse		

Obiettiviambientali	Fase 1		Fase 2		
	La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile su quest'obiettivo, o contribuisce a sostenerlo?	Giustificazione se è stato scelto A, B o C	Domande	Si/No	Giustificazione sostanziale qualora sia stato selezionato NO
	nell'ambito dell'obiettivo in oggetto.		dell'Unione Europea?		

Allegato 4

Schede di monitoraggio

Il monitoraggio procedurale interverrà attraverso il sistema informatico Regis, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le ulteriori indicazioni che verranno fornite dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR.

Tabella 10 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Assegnazione dei codici CUP ai progetti		*30/06/2022		
DIP – predisposizione e approvazione S.A.				
INDAGINI – Affidamento				
INDAGINI – Esecuzione				
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento				
VERIFICA (ex art.26) – Esecuzione				
PFTE - Affidamento				
PFTE – Progettazione				
PFTE – Validazione e Approvazione				
Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara		*31/03/2023		
Progetto Definitivo – Affidamento				
Progetto Definitivo – Progettazione				
Progetto Definitivo – Verifica				
Conferenza dei servizi decisoria				
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI				
Appalto Integrato – Stipula contratto				
Progetto Esecutivo - Affidamento				

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Progetto Esecutivo - Progettazione				
Progetto Esecutivo - Verifica				
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione				
Assegnazione dei codici CIG		*31/03/2023		
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
Stipula dei contratti per la realizzazione		*30/09/2023		
Lavori – Consegna aree e Lavori				
Esecuzione Lavori				
Ultimazione dei lavori		*31/03/2026		

*data massima

Tabella 11 – Schema si scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Assegnazione dei codici CUP ai progetti		*30/06/2022		
DIP – predisposizione e approvazione S.A.				
INDAGINI – Affidamento				
INDAGINI – Esecuzione				
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento				
VERIFICA (ex art.26) – Esecuzione				
PFTE - Affidamento				
PFTE – Progettazione				
PFTE – Validazione e Approvazione				
Progetto Definitivo – Affidamento				
Progetto Definitivo – Progettazione				
Progetto Definitivo – Verifica				
Conferenza dei servizi decisoria				
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI				
Appalto Integrato – Stipula contratto				
Progetto Esecutivo – Affidamento				

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Progetto Esecutivo – Progettazione				
Progetto Esecutivo – Verifica				
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione				
Assegnazione dei codici CIG		*31/12/2022		
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
Stipula dei contratti per la realizzazione		*30/06/2023		
Lavori – Consegna aree e Lavori				
Esecuzione Lavori				
Ultimazione dei lavori		*31/03/2024		

*data massima

Tabella 12 – Schema do scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Assegnazione dei codici CUP ai progetti		*30/06/2022		
DIP – predisposizione e approvazione S.A.				
INDAGINI – Affidamento				
INDAGINI – Esecuzione				
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento				
VERIFICA (ex art.26) – Esecuzione				
PFTE - Affidamento				
PFTE – Progettazione				
PFTE – Validazione e Approvazione				
Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara		*31/03/2023		
Progetto Definitivo – Affidamento				
Progetto Definitivo – Progettazione				
Progetto Definitivo – Verifica				
Conferenza dei servizi decisoria				
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI				
Appalto Integrato – Stipula contratto				

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Progetto Esecutivo – Affidamento				
Progetto Esecutivo – Progettazione				
Progetto Esecutivo – Verifica				
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione				
Assegnazione dei codici CIG		*31/03/2023		
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
Stipula dei contratti per la realizzazione		*30/09/2023		
Lavori – Consegna aree e Lavori				
Esecuzione Lavori				
Ultimazione dei lavori		*31/03/2026		

*data massima

Tabella 13 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici (Consip)		*31/12/2022		
Esecuzione del contratto				
Chiusura dell'intervento				
Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di Ammissione - Livello I e II) (280)		*31/09/2025		

*data massima

Tabella 14 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)"Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
45% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva		*31/12/2024		
Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di Ammissione - Livello I e II) – 45% interventi di ristrutturazione dei percorsi PS		*31/12/2024		
100% Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva 3 500 posti letto di terapia intensiva e 4 200 posti letto di terapia semi-intensiva		*30/06/2026		

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di Ammissione - Livello I e II) – 100% interventi di ristrutturazione dei percorsi PS		*30/06/2026		

*data massima

Tabella 15 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)"

Step attuativo-procedurale	*Data inizio*	*Data fine*	*Strumento/Atto*	*Note/Criticità*
Pubblicazione delle gare d'appalto e conclusione dei contratti con i fornitori di servizi per il lancio e la realizzazione del rinnovo delle grandi attrezzature		***31/12/2022**		
Grande attrezzatura sanitaria operativa		***31/12/2024**		

*data massima

Tabella 18 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (PNRR)

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Assegnazione dei codici CUP ai progetti				
DIP – predisposizione e approvazione S.A.				
INDAGINI – Affidamento				
INDAGINI – Esecuzione				
VERIFICA (ex art.26) – Affidamento				
VERIFICA (ex art.26) – Esecuzione				
PFTE – Affidamento				
PFTE – Progettazione				
PFTE – Validazione e Approvazione				
Progetto Definitivo – Affidamento				

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Progetto Definitivo – Progettazione				
Progetto Definitivo – Verifica				
Conferenza dei servizi decisoria				
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI				
Appalto Integrato – Stipula contratto				
Progetto Esecutivo – Affidamento				
Progetto Esecutivo – Progettazione				
Progetto Esecutivo – Verifica				
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione				
Pubblicazione gara per interventi strutturali		*31/03/2023		
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
Stipula dei contratti per la realizzazione				
Lavori – Consegna aree e Lavori				
Esecuzione Lavori				
Ultimazione dei lavori		*30/06/2026		

*data massima

Tabella 169 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (PNC)

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Assegnazione dei codici CUP ai progetti				Da MOP
DIP – predisposizione e approvazione S.A.				
INDAGINI – Affidamento				Da MOP
INDAGINI – Esecuzione				
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento				
VERIFICA (ex art.26) - Esecuzione				
PFTE - Affidamento				Da MOP
PFTE - Progettazione				
PFTE – Validazione e Approvazione				
Progetto Definitivo - Affidamento				Da MOP
Progetto Definitivo - Progettazione				
Progetto Definitivo - Verifica				
Conferenza dei servizi decisoria				
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI				Da MOP
Appalto Integrato – Stipula contratto				Da MOP

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Progetto Esecutivo - Affidamento				Da MOP
Progetto Esecutivo - Progettazione				
Progetto Esecutivo - Verifica				
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione				
Pubblicazione gara per interventi strutturali		*31/03/2023		Da MOP
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace				
Stipula dei contratti per la realizzazione		*30/09/2023		Da MOP
Lavori – Avvio		*31/12/2023		Da MOP
Esecuzione Lavori				Da MOP
Ultimazione dei lavori		*30/06/2026		Da MOP

*data massima

Tabella 20 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale investimento 11.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)
(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Cutoff per digitalizzazione nativa di tutti i documenti dei FSE. I documenti devono essere nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i recenti standard FHIR.		*31/12/2024		
I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%)		*31/12/2025		
Tutte le Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico		*30/06/2026		

*data massima

Tabella 21 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale investimento 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – Reingegnerizzazione NSIS a livello locale. Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Recepimento (adozione) con atto regionale del decreto ministeriale di istituzione dei 2 nuovi flussi per assistenza riabilitativa e consultori		*31/03/2023		
Recepimento (adozione) con atto regionale del decreto ministeriale di istituzione dei 2 nuovi flussi per ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria		*31/03/2025		

*data massima

Tabella 22 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 2.2 (a) "Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Pubblicazione dei bandi regionali e del conseguente avviso da parte del Ministero della salute				
Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione dell'elenco degli assegnatari di borsa.				
Le Regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale (TARGET ITA - 900) e trasmettono la documentazione necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione		*30/06/2022		
Definizione fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio 2022/2025				
Pubblicazione dei bandi regionali e del conseguente avviso da parte del Ministero della salute				
Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione elenco vincitori.				
Le Regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale (TARGET EU - Ulteriori 900, per un totale di 1.800 borse) e trasmettono la documentazione necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione		*30/06/2023		
Definizione fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio 2023/2026				
Pubblicazione dei bandi regionali e del conseguente avviso da parte del Ministero della salute				
Concorso, pubblicazione graduatoria, predisposizione elenco vincitori.				

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Le Regioni assegnano le borse di studio per la formazione specifica in medicina generale (TARGET EU - ulteriori 900, per un totale di 2.700)e trasmettono la documentazione necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione		*30/06/2024		

*data massima

Tabella 23 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 2.2 (b) "Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere"

Step attuativo-procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità
Procedura di selezione dei provider da parte delle Regioni		*31/03/2023		
Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere - Milestone (ITA)		*30/09/2024		
Numero di dipendenti formati nel campo delle infezioni ospedaliere (52% del Target regionale)**		*31/03/2025		
Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere		*31/12/2025		
Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere (target regionale)**		*30/06/2026		

*data massima

**da riproporzionare a livello regionale

Allegato 5

Action Plan M6C2 2.2 b – **INDICAZIONI** NAZIONALI SULLA STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA IN AMBITO OSPEDALIERO

INDICAZIONI NAZIONALI SULLA STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA DEL CORSO

Ogni regione e P.A dovrà predisporre un programma di formazione che includa i seguenti elementi minimi.

In particolare, il programma sarà basato su 4 diversi moduli, indicati di seguito alle lettere A, B, C, D.

A. **Modulo di base teorico generale propedeutico ai corsi B e C riguardante le tematiche schematizzate in Tabella 1**

Questo modulo, indirizzato a tutti i professionisti iscritti al programma fornisce gli elementi base per l'inquadramento del problema e le diverse misure di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere.

Tabella 17- Tematiche minime da includere in tutti i moduli di base per gli operatori sanitari

Epidemiologia delle infezioni ospedaliere, in Italia e a livello globale sia nelle strutture per acu che nelle strutture per lungodegenti.
Il problema delle resistenze agli antimicrobici, il PNCAR e le diverse strategie per il contras all'antimicrobico-resistenza (es. antimicrobialstewardship, diagnosticstewardship)
Complessità del contrasto alle infezioni ospedaliere nelle strutture assistenziali: attori coinvolt ruoli, il CIO e i modelli di organizzazione aziendale. Individuazione e gestione degli outbreak.
Antisepsi e disinfezione, pulizia e disinfezione dei dispositivi medici, sterilizzazione, sanificazior ambientale, smaltimento dei rifiuti potenzialmente infettanti
Sorveglianza epidemiologica come metodologia alla base della prevenzione, sistemi sorveglianza, gestione statistica dei processi correlati alle infezioni (es. carte di controllo), anal e strumenti di feedback e di interpretazione dei dati. Individuazione precoce degli outbrea Screening dei microrganismi multidrug-resistant (MDR)/sentinella
Precauzioni standard: igiene delle mani, DPI, etc. Precauzioni aggiuntive da contatto, droplet e via aerea Approcci basati su care bundle
Monitoraggio e valutazione dell'igiene delle mani. I programmi di intervento sull'igiene delle ma
La sepsi e il loro contrasto
Strategie da adottare per prevenire specificatamente le infezioni ospedaliere associate a: catetere vascolare, catetere vescicale, intubazione, pratiche chirurgiche; approcci basati su ca bundle
Gestione di eventi epidemici/pandemici
Vaccinazioni dell'operatore sanitario

NB. In grassetto e sottolineati gli argomenti per gli approfondimenti pratici

Il modulo relativamente alle tematiche indicate in tabella 1 sarà erogato in modalità FAD a carattere generale, anche avvalendosi della FAD offerta dall'Istituto Superiore di Sanità alle Regioni e P.A.

B. Modulo pratico

Questa seconda parte del programma di formazione sarà svolta in presenza con approfondimenti pratici e sessioni interattive, simulazioni e formazione sul campo. Questa parte della formazione sarà presso la propria struttura di appartenenza o altra struttura identificata; i temi indicati dovranno essere svolti in funzione della propria professionalità e dell'area (medica/chirurgica/servizi) di attività, con l'obiettivo specifico di acquisire abilità pratiche rispetto alle conoscenze apprese nel corso del corso teorico (Corso A). Questa seconda parte riguarderà i temi in grassetto e sottolineati nella tabella 1. Al termine del modulo i partecipanti dovranno necessariamente essere in grado di:

I. sanificare correttamente superfici, dispositivi medici e ambienti, smaltire correttamente rifiuti potenzialmente infetti
II. applicare correttamente le precauzioni standard e quelle aggiuntive da contatto, droplet e via aerea con particolare riferimento al sapere indossare e rimuovere correttamente i DPI, al lavaggio e all'igiene delle mani, alla gestione delle procedure invasive in ambito medico e asettico
III. applicare correttamente nei diversi setting gli approcci basati sui care bundle
IV. conoscere gli strumenti per monitorare l'andamento delle ICA nei reparti e gli screening per gli organismi MDR.

C. Modulo sul programma locale di contrasto alle infezioni ospedaliere

I contenuti del corso riguarderanno:

- Programma locale di contrasto alle ICA in ambito ospedaliero e sua organizzazione
- Indicatori di struttura e di processo per la prevenzione e controllo delle infezioni
- Approfondimenti riguardanti le diverse professionalità, i diversi setting (es. area medica, chirurgica, terapia intensiva, pronto soccorso) e le principali categorie di ICA in ambito ospedaliero (es. infezioni del sito chirurgico, infezioni correlate a catetere venoso centrale o periferico, infezioni correlate a catetere vescicale, infezioni correlate a device cardiaci e protesi chirurgiche vascolari/ortopediche, polmoniti associate a intubazione, diarrea da C. difficile).

In questo modulo la regione/P.A. potrà indirizzare le tematiche anche in base a specifiche esigenze emerse nella valutazione dei bisogni formativi aziendali e regionali.

D. modulo specialistico riservato agli operatori del CC-ICA (igienisti, clinici, farmacisti, infection nurse, laboratoristi, ecc.)

Tale modulo ha l'obiettivo di migliorare le capacità dei Comitati- ICA (CC-ICA) aziendali sia in termini di competenze specifiche individuali che di organizzazione e integrazione del CC-ICA all'interno della struttura sanitaria. L'obiettivo è quello di innescare

meccanismi di formazione a cascata e rinforzare il networking regionale tra i CC-ICA (approfondimenti su aspetti operativi delle funzioni del Comitato – Sorveglianza, monitoraggio consumo soluzione idro-alcolica e del consumo di antibiotici, verifica del sistema di segnalazione, monitoraggio degli eventi sentinella, outbreakinvestigation, procedure e protocolli regionali e aziendali, programmi di screening nei confronti di patogeni responsabili di focolai epidemici di MDRO - es. CRE, MRSA, procedure di isolamento, controllo e notifica di malattie diffusive confermate o sospette, indicatori di struttura, processo ed esito per la prevenzione e controllo delle infezioni) e promuovere la conduzione di audit periodici sui dati osservati. Questo modulo potrà essere tenuto per gli interessati prima dei moduli A – B – C al fine di essere di supporto alla loro realizzazione. Infatti, gli operatori del CC-ICA durante la partecipazione ai moduli A-B-C potrebbero fungere anche da formatori, mentori e opinion leader.
